防災情報

台風第19号
関連

令和元年１０月２１日
国土交通省東北地方整備局

台風１９号による被害と対応の状況について
（１０月２１日　１７時３０分時点）

１０月１３日から東北地方を襲った台風１９号による東北地方整備局管内の被害状況と復旧の初動対応等についてお知らせします。

１．東北地方整備局の体制

令和元年１０月１２日（金）１６時３０分に「非常体制」に入りました。

２．インフラの被害状況と復旧等の見通し（東北地方全体）

＜河川＞

河川は、直轄河川で 17 箇所、補助河川で 85 箇所の越水又は溢水氾濫が判明したため、浸水した水を東北地整所管の排水ポンプ車の他、他地整からの広域支援による排水ポンプ車を加え強制排水を実施しています。また、直轄河川で堤防が被災（決壊 2 箇所、法崩れ 4 箇所）したため、ただちに緊急復旧工事に着手し、決壊した 2 箇所の仮堤防盛土が完了しました。引き続き残っている工事の早期完了に向けて鋭意進めています。

（別紙１～２参照）

＜直轄国道（無料高速を含む）＞

６路線２８箇所で土砂崩落や路面冠水等により通行止めを実施しました。このうち、４路線２６箇所は２１日までに応急復旧を完了して、全面通行止めを解除しております。残る２路線２箇所の状況については、別添資料３をご参照下さい。

本日、国道４９号災害通行止め一部解除に伴う、Ｅ４９磐越自動車道（小野ＩＣ～郡山東ＩＣ）の代替路（無料）措置区間の取り扱いについて、記者発表が行われています。（別添資料４）

３．地域支援の状況

（１）リエゾンによる地域支援活動の状況

・１０月２１日現在、３県１３市町村に２５名のリエゾンを派遣し、自治体のニーズ把握に努めています。

本日は、路面清掃車やポンプ車の配備について支援要請を受けています。引き続き被災地に寄り添った支援を行ってまいります。

（２）テック・フォース（緊急災害対策派遣隊，TEC-FORCE）の活動状況

・東北地方整備局のほか、北海道開発局、中部地方整備局及び中国地方整備局からの広域派遣を合わせて、６８班２４５名の隊員を１５市町村に派遣し、河川、道路等の被災状況調査や、他地整からの広域支援車両を含む排水ポンプ車９０台、照明車３１台、路面清掃車２５台、側溝清掃車３台、散水車２１台、土のう製造機１台などの災害対策車両を各地で稼働させるなど、復旧活動を継続して行っています。

・明日１０月２２日に岩手県久慈市長に対して、被災状況調査結果を最終報告します。（別添資料５）

（３）防災ヘリコプターによる調査（１０月２１日）

・「ほっかい」号　吉田川を調査
・「きんき」号　　福島県二本松市、岩手県宮古市等の補助砂防施設を調査

４．今後の予定

今後の主な活動予定は次の通りです。

① 防災ヘリコプター「きんき号」　福島県内の被災状況を調査
② 道路通行規制箇所の復旧作業の継続、道路清掃作業の継続
③ 強制排水作業と被災堤防の緊急復旧工事の継続（各地域、24 時間体制）
④ 河川、道路等の被災状況調査の継続

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先
広報広聴対策官　辻（つじ）　淳一（内線２１１７）
環境調整官　武藤（むとう）　徹（内線３１１４）
課長補佐　重茂（おもえ）　和志（内線２３５６）
建設専門官　松本（まつもと）　章（内線３１５３）
電話　０２２－２２５－２１７１（代表）

別添資料１

令和元年度　台風19号　災害対策用機械　派遣状況（排水ポンプ車）　10/21　14:00　現在

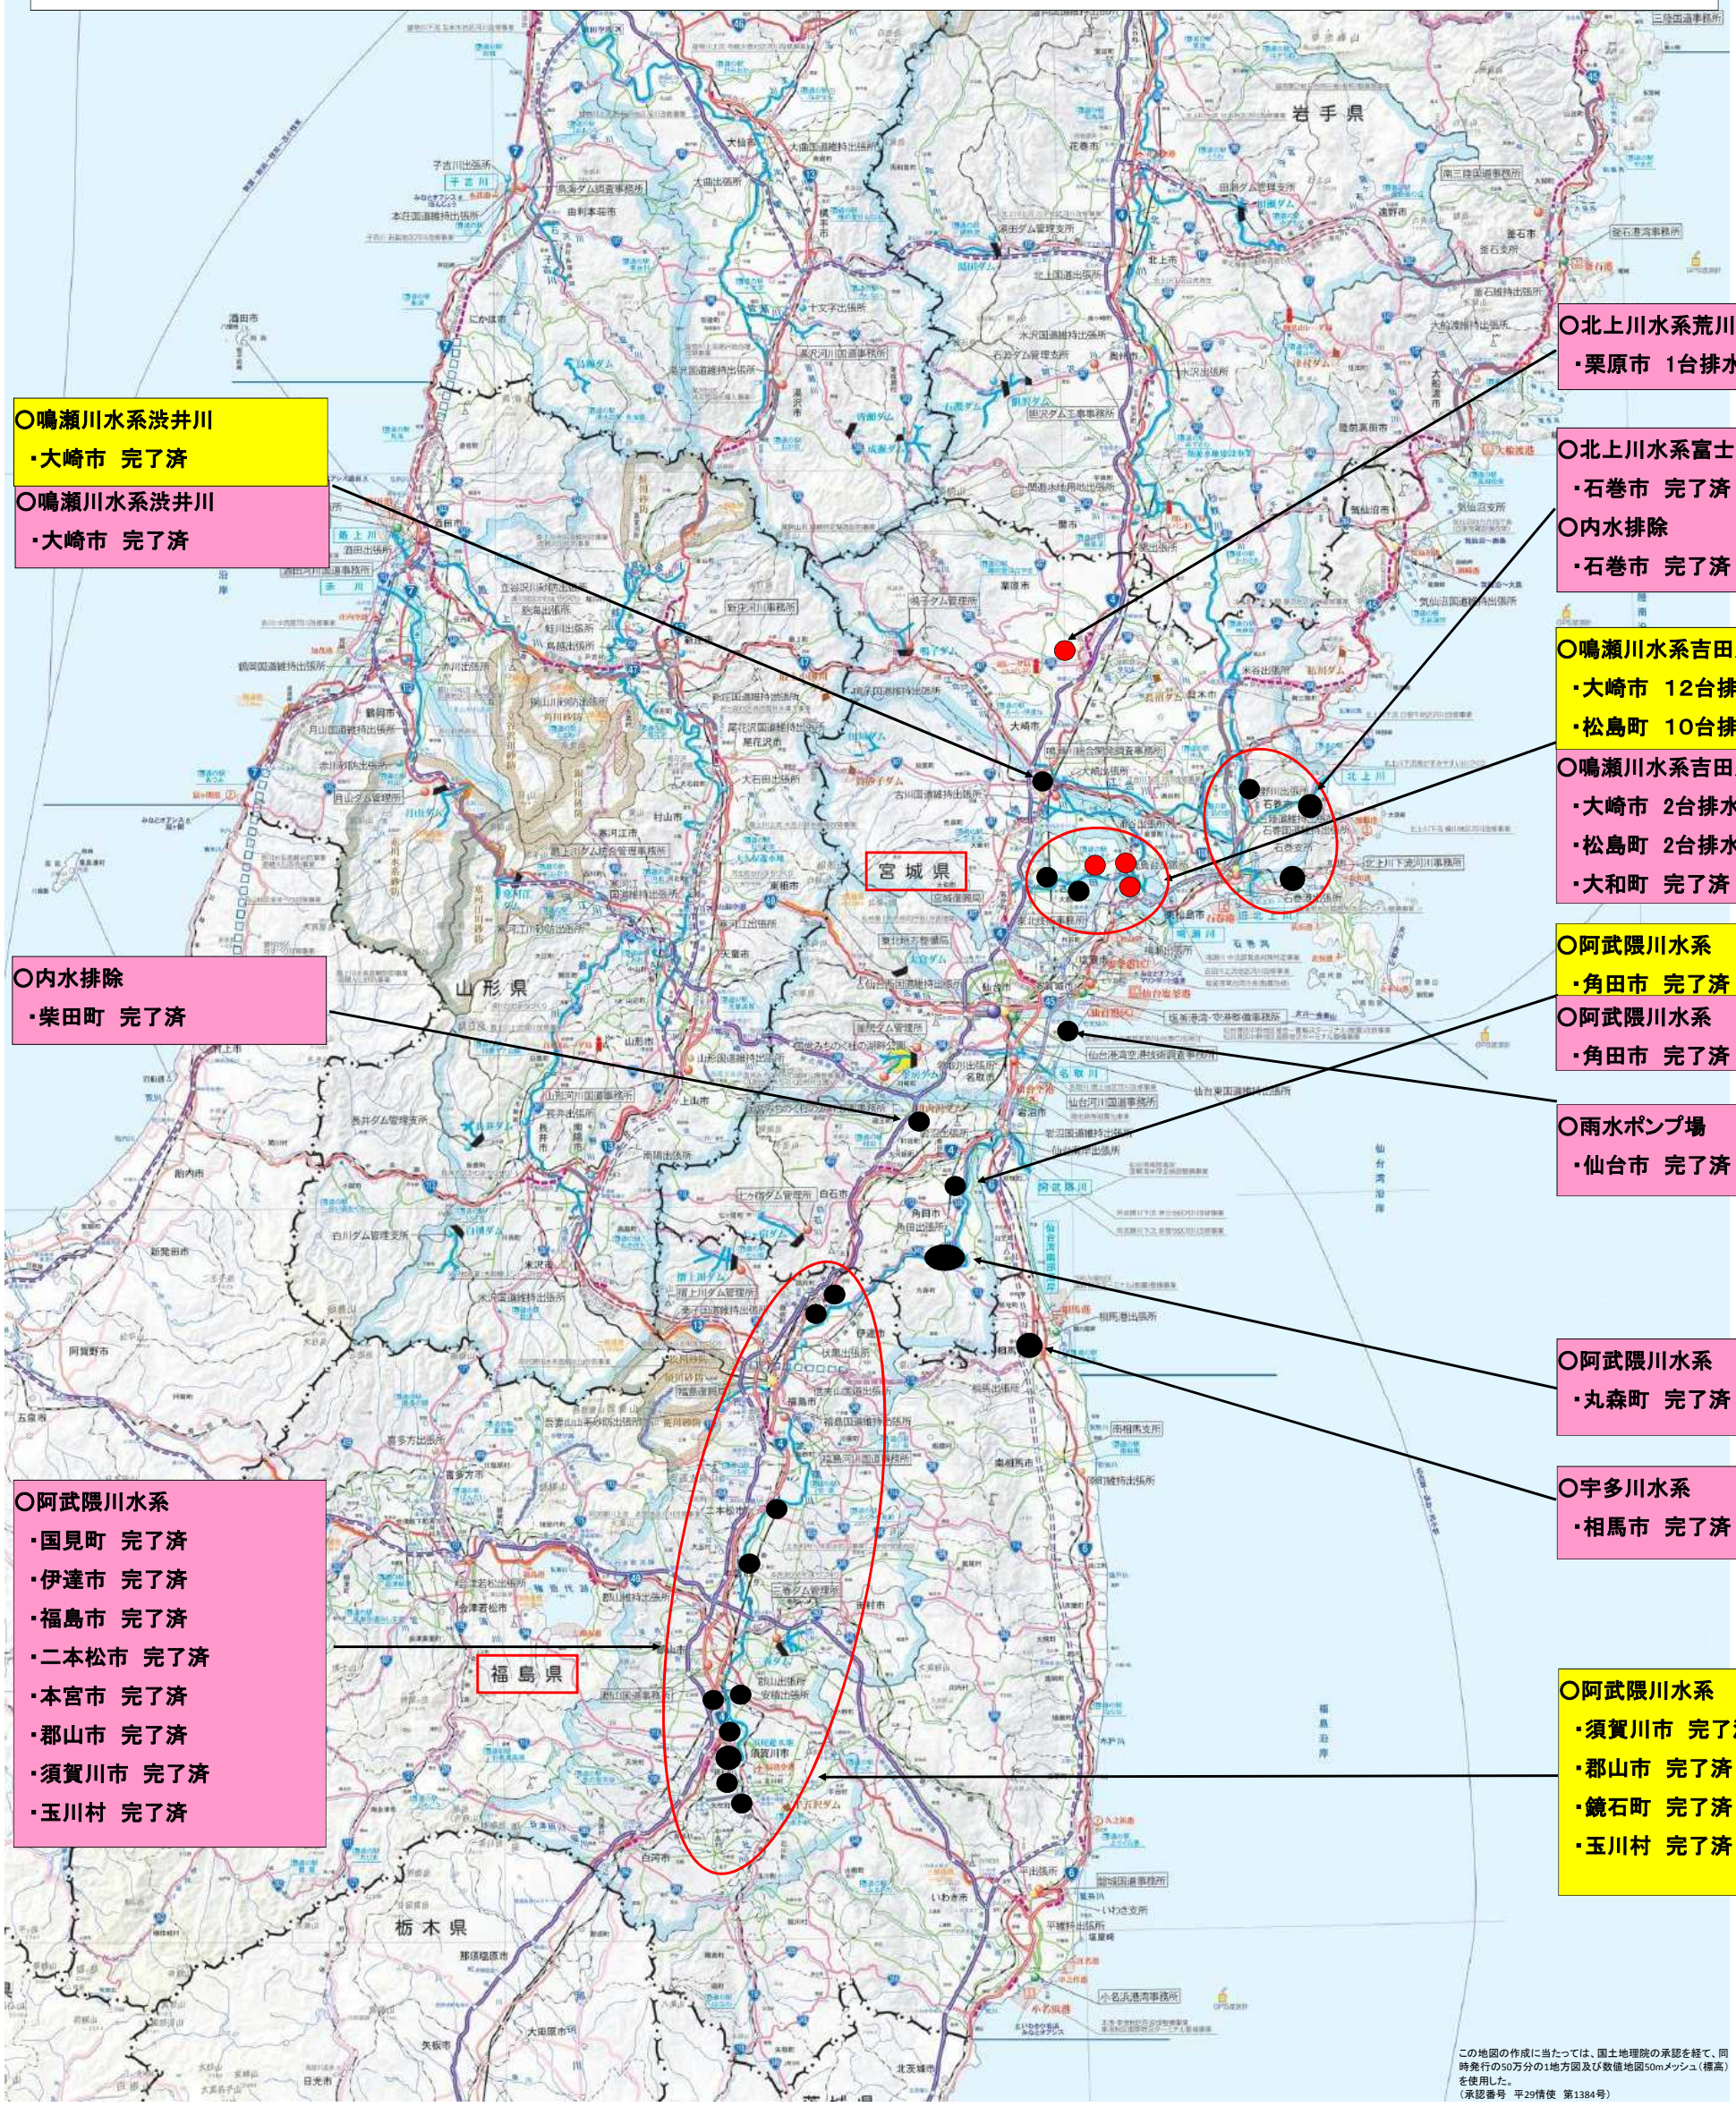

〇鳴瀬川水系渋井川
・大崎市　完了済

〇鳴瀬川水系渋井川
・大崎市　完了済

〇内水排除
・柴田町　完了済

〇阿武隈川水系
・国見町　完了済
・伊達市　完了済
・福島市　完了済
・二本松市　完了済
・本宮市　完了済
・郡山市　完了済
・須賀川市　完了済
・玉川村　完了済

〇北上川水系荒川
・栗原市　1台排水作業

〇北上川水系富士川
・石巻市　完了済

〇内水排除
・石巻市　完了済

〇鳴瀬川水系吉田川
・大崎市　12台排水作業
・松島町　10台排水作業

〇鳴瀬川水系吉田川
・大崎市　2台排水作業
・松島町　2台排水作業
・大和町　完了済

〇阿武隈川水系
・角田市　完了済

〇阿武隈川水系
・角田市　完了済

〇雨水ポンプ場
・仙台市　完了済

〇阿武隈川水系
・丸森町　完了済

〇宇多川水系
・相馬市　完了済

〇阿武隈川水系
・須賀川市　完了済
・郡山市　完了済
・鏡石町　完了済
・玉川村　完了済

この地図の作成に当たっては、国土地理院の承認を経て、同時発行の50万分の1地方図及び数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。
（承認番号　平29情使　第1384号）

21日の排水ポンプ車活動計画台数　87台

（うち、広域派遣　42台）

凡例

- 排水作業中
- 本日完了
- 完了済
- 直轄派遣車両 ※東北地方整備局所有
- 広域派遣車両 ※北海道開発局TEC-FORCE所有 中部地方整備局TEC-FORCE所有 中国地方整備局TEC-FORCE所有

別添資料２

令和元年10月12日出水（台風第19号）における緊急復旧実施箇所

2019年10月21日（月）16時00分現在

宮城県大崎市三本木廻山地先
【鳴瀬川 右岸38.4km付近】
堤防法くずれ　L=約32m
10/14　22:00着手～
10/21　16:00進捗率　75%

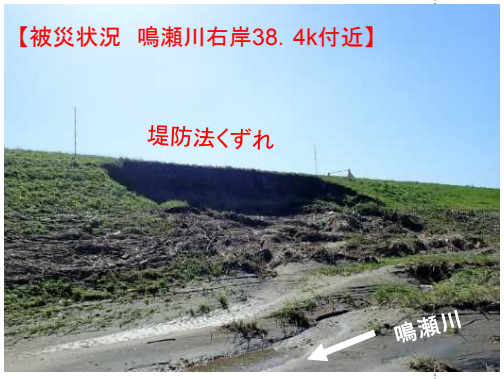

宮城県大崎市三本木蟻ケ袋地先
【鳴瀬川 右岸38.1km付近】
堤防法くずれ　L=約40m
10/14　22:00着手～
10/21　16:00進捗率　75%

宮城県大崎市鹿島台大迫川北地先
【吉田川 左岸14.8km付近】 越水
堤防法くずれ　L=約40m
10/14　22:00着手～
10/21　16:00進捗率　20%
※緊急復旧工事再開

宮城県東松島市西福田白山地先
【鳴瀬川 左岸8.4km付近】
堤防法くずれ　L=約279m
10/18　20:00着手～
10/21　16:00進捗率　10%

宮城県黒川郡大郷町粕川地先
【吉田川 左岸20.9km付近】
堤防決壊　L＝約100m
10/13 12:00着手～
10/18 仮堤防盛土完了
10/21 16:00進捗率　55%



福島県須賀川市浜尾地先
【阿武隈川 左岸98.6km付近】
堤防決壊　L＝約50m
10/14　15:00着手～
10/18　仮堤防盛土完了
10/21　16:00進捗率　44%



鳴瀬川水系吉田川　宮城県黒川郡大郷町地先（左岸20.9k）　被災～復旧状況

2019年10月21日（月）16時00分現在

【被災状況】



撮影日2019.10.13　AM9時頃

【緊急復旧内容】

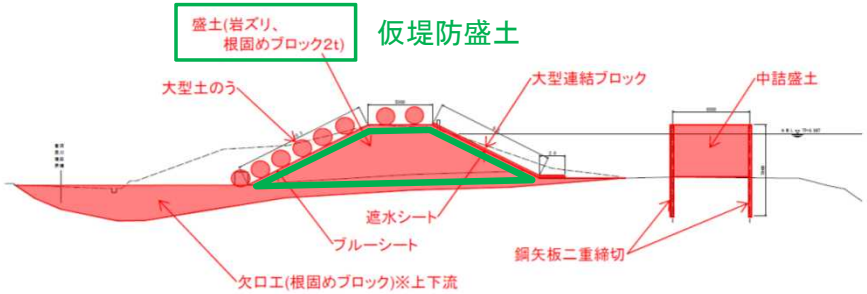

令和元年10月13日（日）12:00着手
令和元年10月18日（金）仮堤防盛土完了



施工箇所全景



鋼矢板による締切施工中

●令和元年10月21日（月）　16時現在
全体の進捗率　55%

阿武隈川水系阿武隈川　福島県須賀川市浜尾地先（左岸98.6k）　被災～復旧状況

2019年10月21日（月）16時00分現在

【被災状況】



撮影日2019.10.14　AM10時頃

【緊急復旧内容】

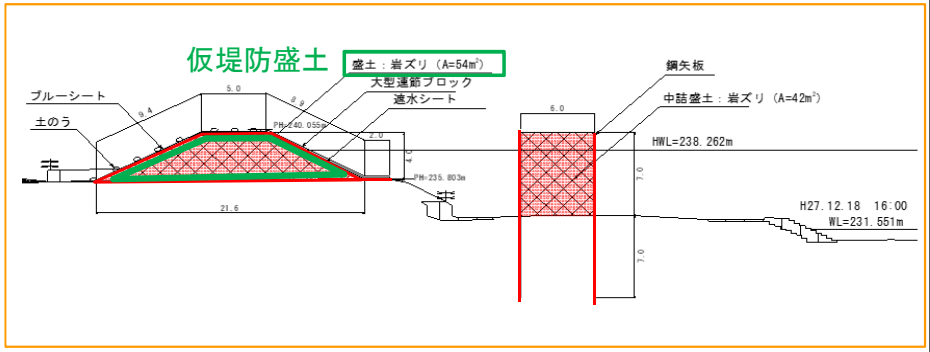

令和元年10月14日（月）15:00着手
令和元年10月18日（金）仮堤防盛土完了



施工箇所全景



護岸ブロック施工中

●令和元年10月21日（月）　16時現在
全体の進捗率　44%

全体

別添資料３

台風19号による被災箇所図（直轄道路）
被災による全止め箇所（R1.10.21 17:00現在）

全面通行止中(高速道路等)

全面通行止中(直轄国道)

県別被災箇所数 一覧（路面冠水含む） （箇所）

		福島県	宮城県	岩手県	山形県	計
高速道路等	全被災箇所	1	1	1	0	3
	全面通行止め	0	0	0	0	0
直轄国道	全被災箇所	8	5	１０	2	２５
	全面通行止め	1	1	0	0	2
計	全被災箇所	9	6	１１	2	２８
	全面通行止め	1	1	0	0	2

【国道49号】全止　10/12(土) ～
【冠水】→【橋梁下部工沈下】
　福島県郡山市田村町大善寺
解除予定：未定

【国道45号】全止　10/13(日) ～
【盛土崩落】
　宮城県石巻市相野谷～登米市津山町柳津
解除予定：10日間目途
　（河川の水位状況により変更する場合有り）

【凡例】
- 高速道路等
- 直轄国道
- ★ 全止め箇所（復旧中）
- ★ 全止め箇所（解除済み）

別添資料４

令和元年10月21日
国土交通省　東北地方整備局
東日本高速道路株式会社　東北支社

国道49号災害通行止め一部解除に伴うE49磐越自動車道（小野IC～郡山東IC）の代替路（無料）措置区間の取り扱いについて

台風19号による土砂崩れのため通行止めとなっていた国道49号（福島県石川郡平田村道の駅ひらた交差点～福島県郡山市　谷田川交差点）については、2019年10月20日（日）13時00分に通行止めが解除されましたが、国道49号大善寺橋（福島県郡山市　山中交差点～同市　蛭田交差点）の通行止めは継続中です。このため、国道49号の代替路として並行するE49磐越自動車道（磐越道）の小野インターチェンジ（IC）から郡山東IC間（約28．5km）において実施している代替路（無料）措置は引き続き実施いたします。

詳細は、別紙1、別紙2をご参照ください。

参考：代替路（無料）措置について[概要]

1. **実施期間**
   2019年10月15日（火）　20時00分から
   ※国道49号大善寺橋の通行止め解除まで継続予定
2. **対象となるご利用**
   磐越道において、以下のICが入口かつ出口となるご利用
   小野IC、郡山東 IC（田村スマートIC、船引三春ICは対象となりません）
   ※小野IC～郡山東ICを越えて通行する車両は、無料措置の対象となりません。
   小野IC～郡山東ICも含め通常の通行料金をいただきます（詳細は別紙2のとおり）。
3. **対象車種**
   全車種（125cc以下の車両については、高速道路はご利用できません。）
4. **通行方法**
   一般レーン、ETCレーンのいずれを走行しても代替路（無料）措置の対象となります。
   ※ご注意：ETCをご利用の場合、料金表示器および利用照会サービスなどにご利用履歴が表示されますが、通行料金の請求はいたしません。

【国道の状況などについての問い合わせ先】

お問い合わせ先	国土交通省　東北地方整備局　道路部　道路管理課 道路管理課長　高橋　秀典 TEL022-225-2171(代表)

【通行料金や磐越道に関する問い合わせ先】

お問い合わせ先	NEXCO東日本お客さまセンター(24時間オペレーターが対応します) 0570－024－024　または　03－5338－7524

代替路（無料）措置

別紙1

本無料措置に関連する通行止め区間のみを記載しています。

磐越道　代替路（無料措置）

対象区間
- いわき三和IC～小野IC　（約26.5km）　終了
- いわき三和IC～郡山東IC（約55.0km）　終了
- 小野IC～郡山東IC　（約28.5km）　継続

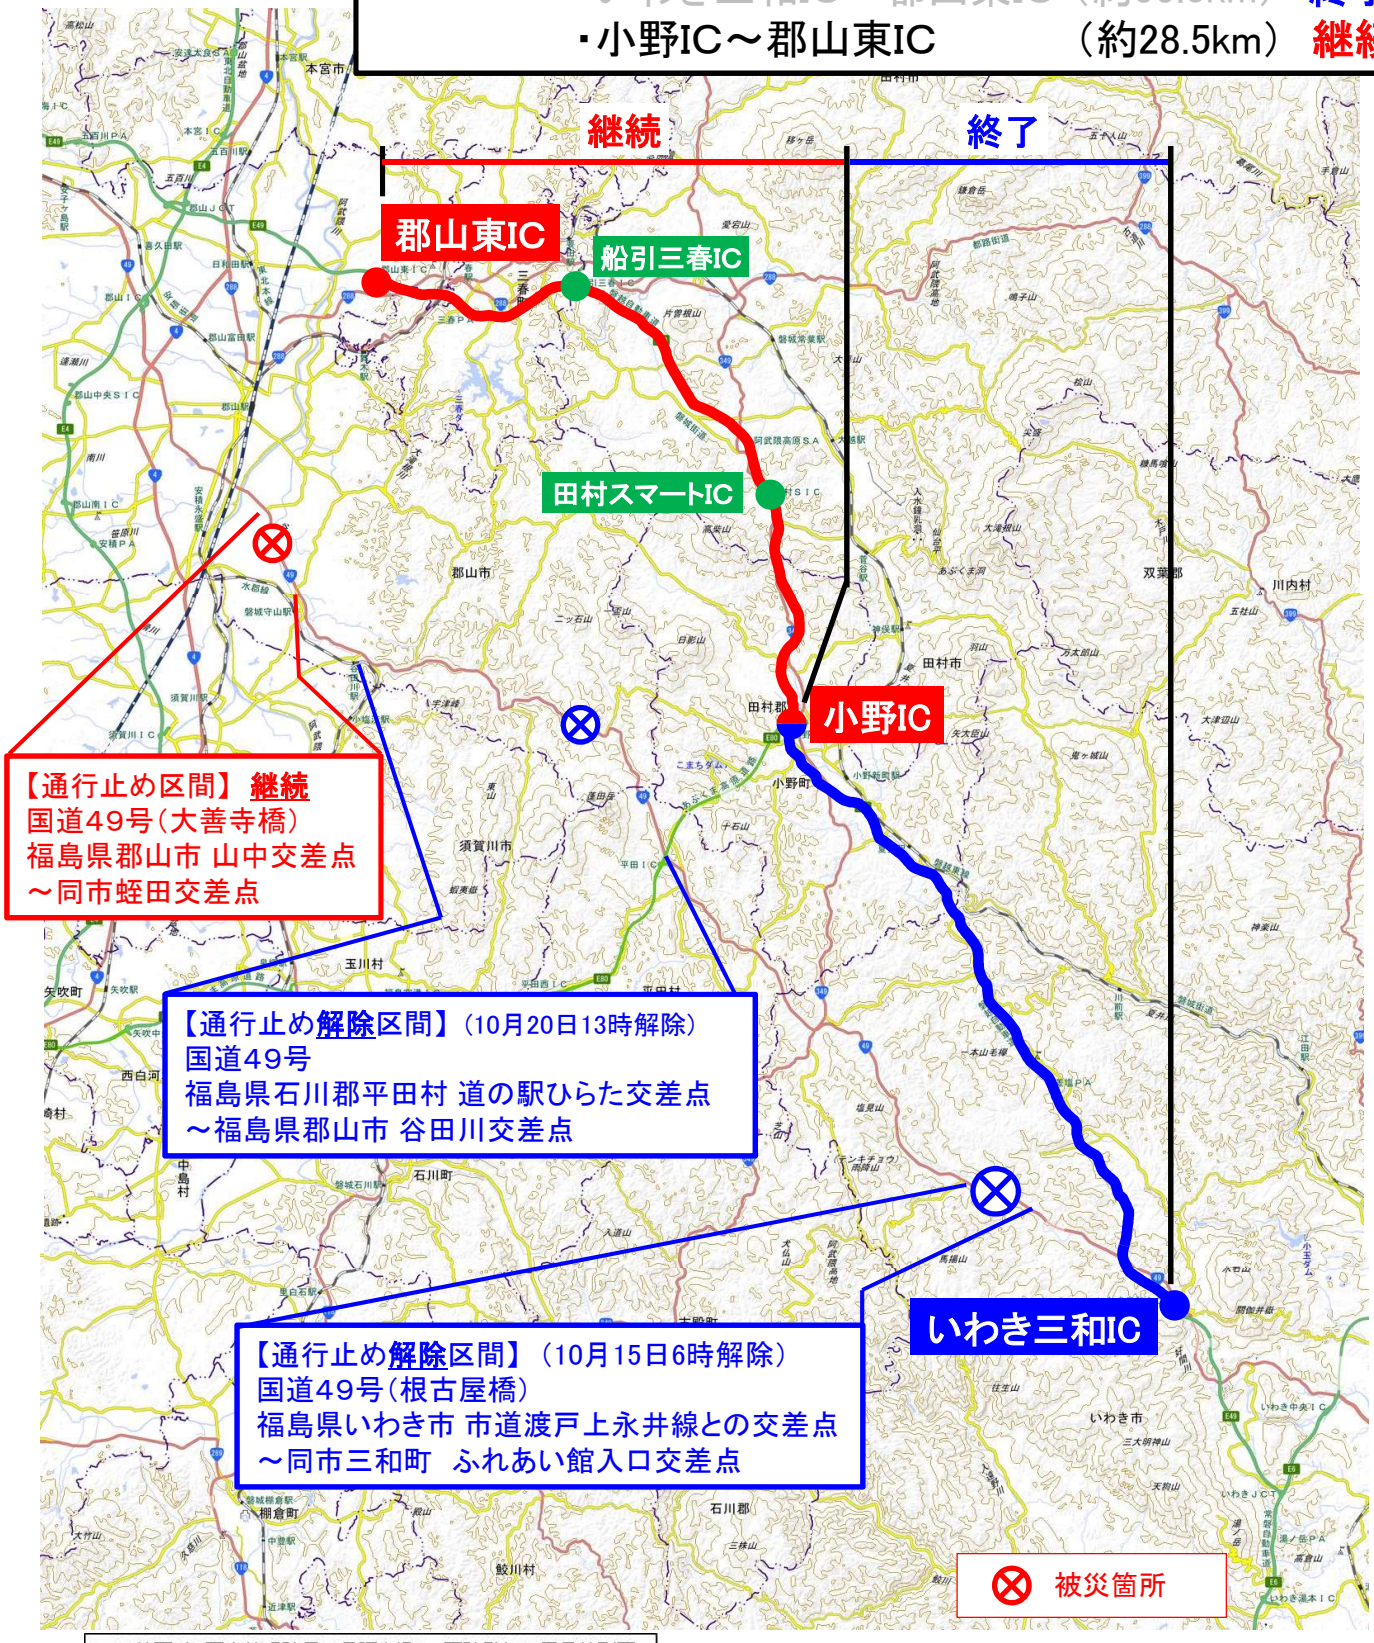

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 令1 東複、第24 号）」

別紙2

10月15日（火）20時から実施中

≪ E49 磐越道　代替路（無料）措置≫

国道49号（大善寺橋）の災害による通行止めにあたり、国道の通行止区間の迂回路として磐越道　小野IC～郡山東IC間（田村スマートICおよび船引三春ICを除く）をご利用いただくため、通行止めの期間中は通行料金を徴収しない措置を取ります。

【通行料金を徴収しない通行】

・磐越道　いわき三和IC　⇔　小野ICをご利用する車両　終了
・磐越道　いわき三和IC　⇔　郡山東ICをご利用する車両　終了
・磐越道　小野IC　⇔　郡山東ICをご利用する車両　継続

◆ETC車はETCレーン、ETC車以外は一般レーンをご利用ください。
◆ETC車以外は、入口で必ず通行券をお取りください。

代替路（無料）措置の対象となります。

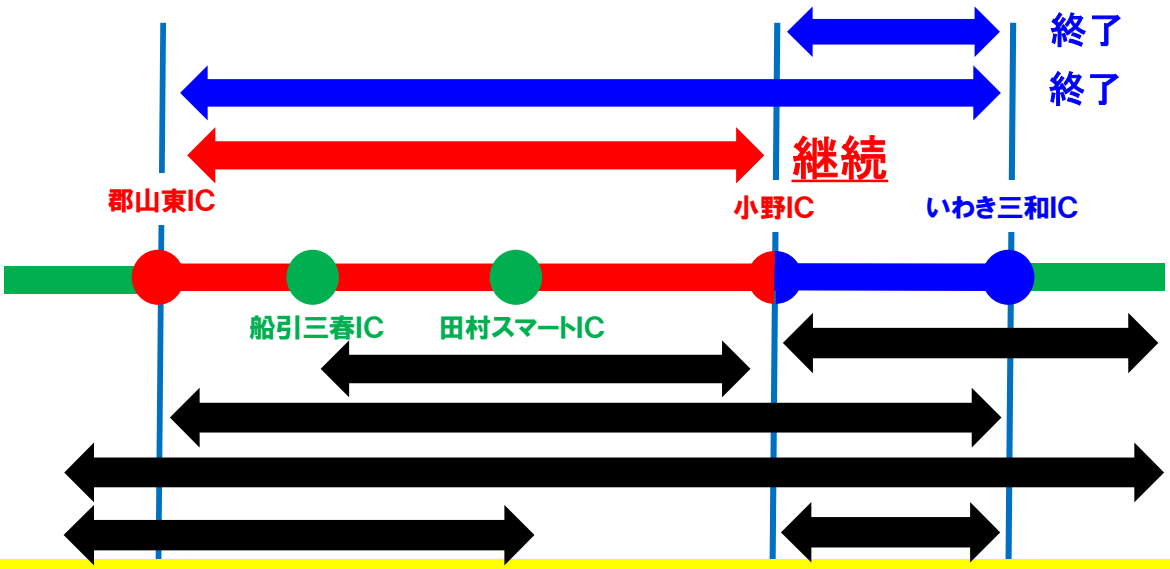

対象区間を越えたご利用は、代替路（無料）措置の対象となりません。
田村スマートICおよび船引三春ICを入口または出口とする走行は対象となりません。
全区間有料となります。

（有料となる例）
・小野IC～郡山東ICを越えてのご利用：小野IC～郡山東ICを越えたご利用のため、ご利用になった全区間分が有料となります。
・小野IC～船引三春ICまでのご利用：小野IC及び郡山東ICを流入出していないご利用のため、小野IC～船引三春ICまでの通行料金（全区間分）となります。

別添資料５

記者発表資料

台風第19号
関連

令和元年１０月２１日
東北地方整備局

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ(緊急災害対策派遣隊)が実施した被災状況調査結果を久慈市長へ最終報告します。

台風19号により甚大な被害が発生した岩手県久慈市では、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）が１０月１５日から被災状況調査を行っておりましたが、１０月２１日調査が完了する見込みとなりましたので、調査結果を１０月２２日(火)に久慈市長へ最終報告します。

自治体からの要請を受けて被災状況調査を実施した２５市町村の内、１１市町村が完了することとなりました。

【久慈市】

◯報告日時：令和元年１０月２２日(火)　９：００～
◯場　　所：久慈市役所　市長応接室
◯報 告 者：TEC-FORCE(中部地方整備局)
◯報告内容：台風19号による久慈市の被災状況調査結果
◯調査期間：令和元年１０月１５日(火)～令和元年１０月２１日(月)

※久慈市におけるTEC-FORCEによる被災状況調査は完了となります。
※取材は可能です。事前登録は必要ありません。

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動状況等公開アドレス
http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/saigai-info/top.html

〔発表記者先〕岩手県政記者クラブ、久慈報道機関
宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

【問い合わせ先】
東北地方整備局　防災対策技術分析官　森(もり)　日吉(ひよし)（内線２１２５）
震災対策調整官　大森(おおもり)　祐一(ゆういち)（内線３１１８）
住所：仙台市青葉区本町３－３－１　仙台合同庁舎Ｂ棟
電話：０２２－２２５－２１７１（代表）
