

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）

資料1

○国道13号　福島西道路（Ⅱ期）（延長6.3km）は現在、道路改良工事、橋梁工事、トンネル工事など、沿線家屋に配慮しながら全面的に工事を進めているところです。

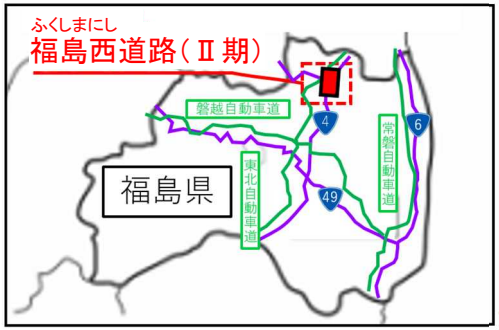

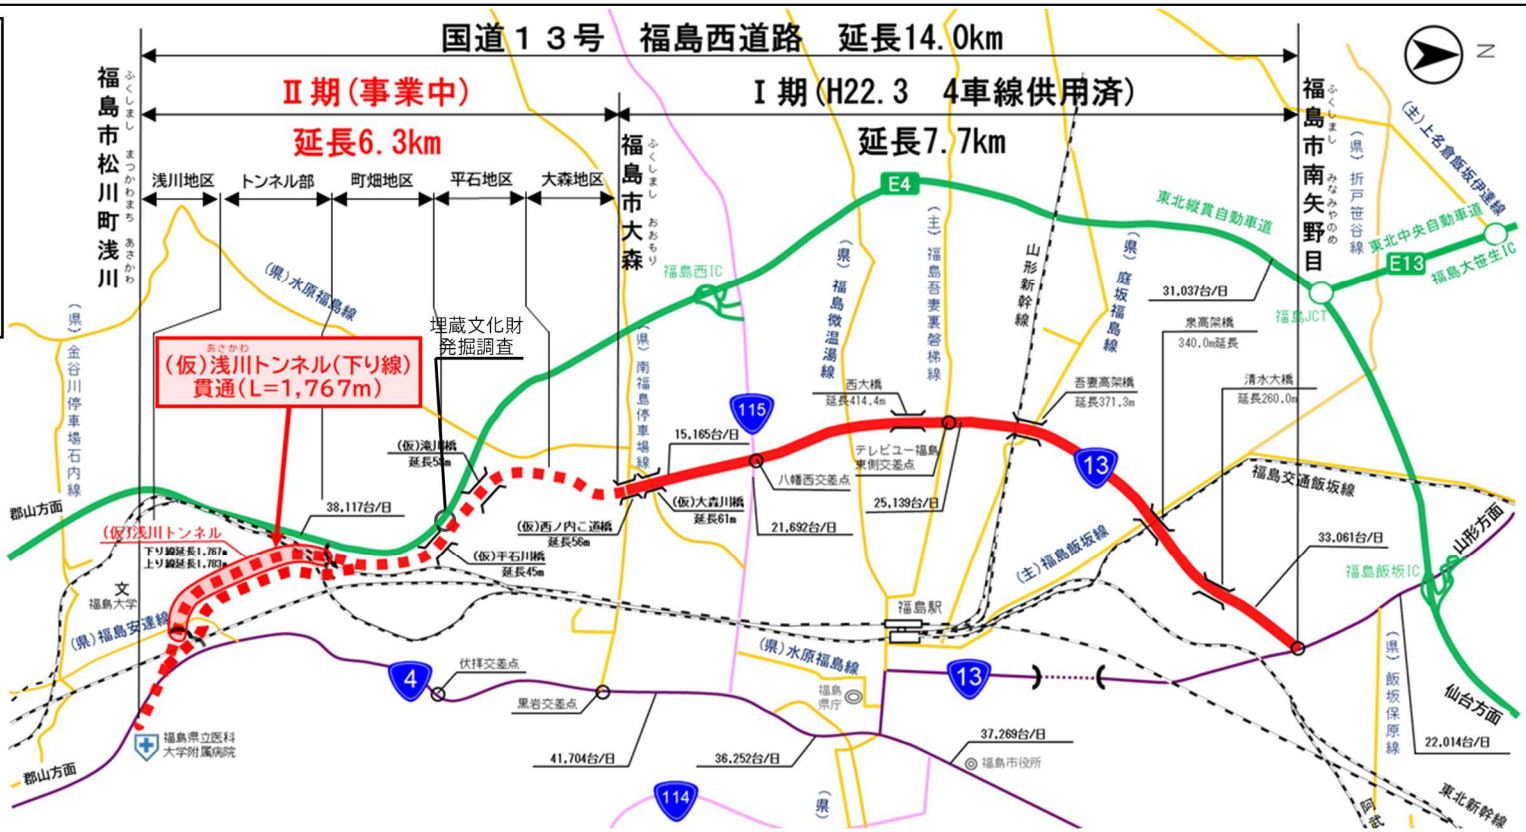

▼浅川地区の完成イメージ図



▼平石地区の完成イメージ図



▼大森地区の完成イメージ図




（仮称）浅川（あさかわ）トンネル（下り線）トンネル施工状況


資料2

○事業区間の浅川トンネルでは現在、下り線側の完成に向け、インバート工、坑門工が完了し、本線部の覆工コンクリートや防水工、上り線側のトンネルと連結する避難通路工を施工しております。
○今後は排水工等も含め、引き続き、早期完成に向けてトンネル工事を進めてまいります。

（仮）浅川トンネル側面図

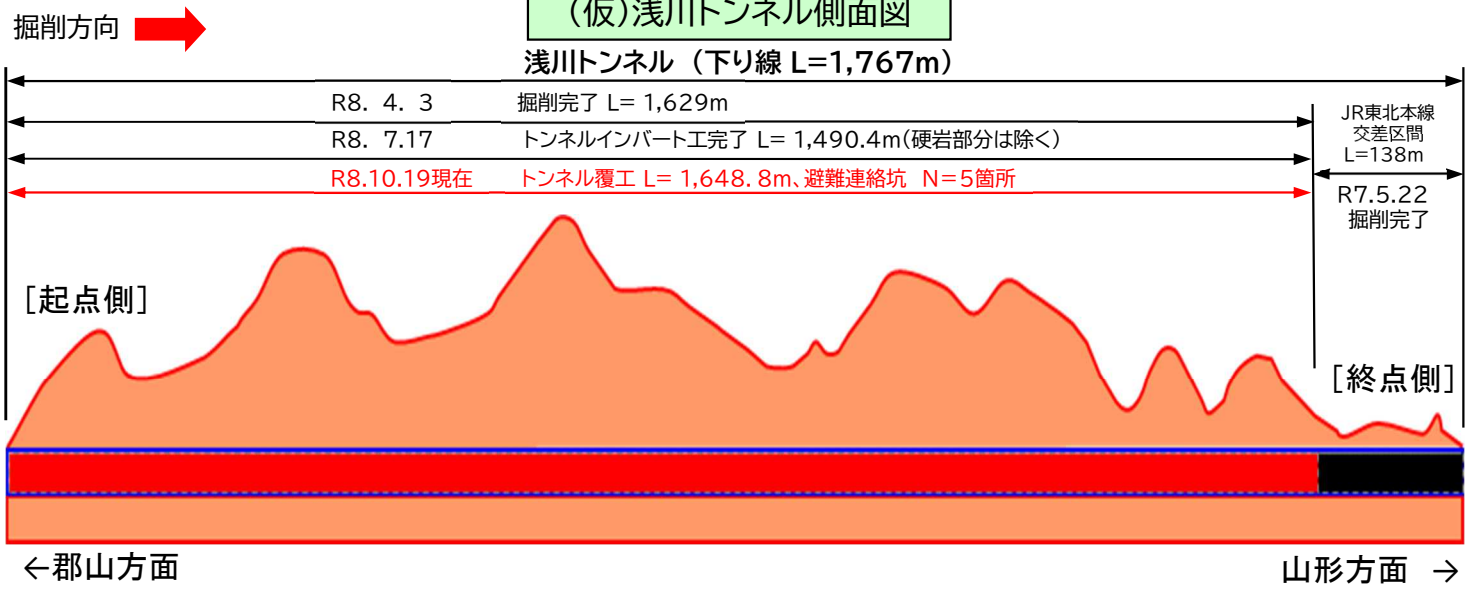

（仮）浅川トンネル標準横断図

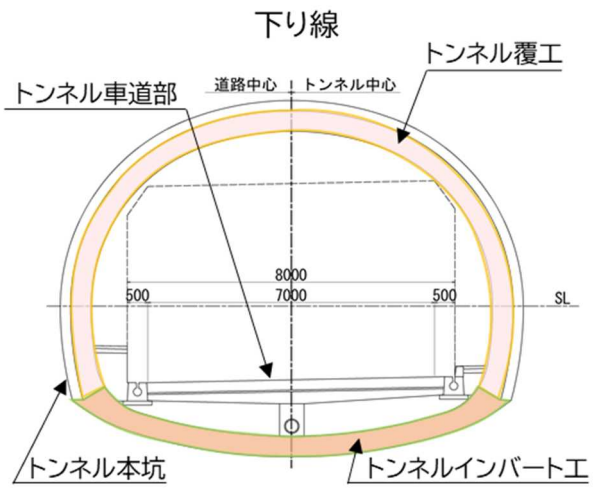

トンネル坑門工完成



覆工　1,648.8m（進捗率 99.6%）




避難連絡坑（5箇所）　施工状況



国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（浅川地区）

資料3


○事業区間の浅川地区では、10月20日に国道4号の一部区間で、下り線側の走行車線切替が完了しております。
○引き続き、国道4号上り線側の走行車線切替に向け、中央分離帯の一部区間撤去などの道路改良を施工しております。

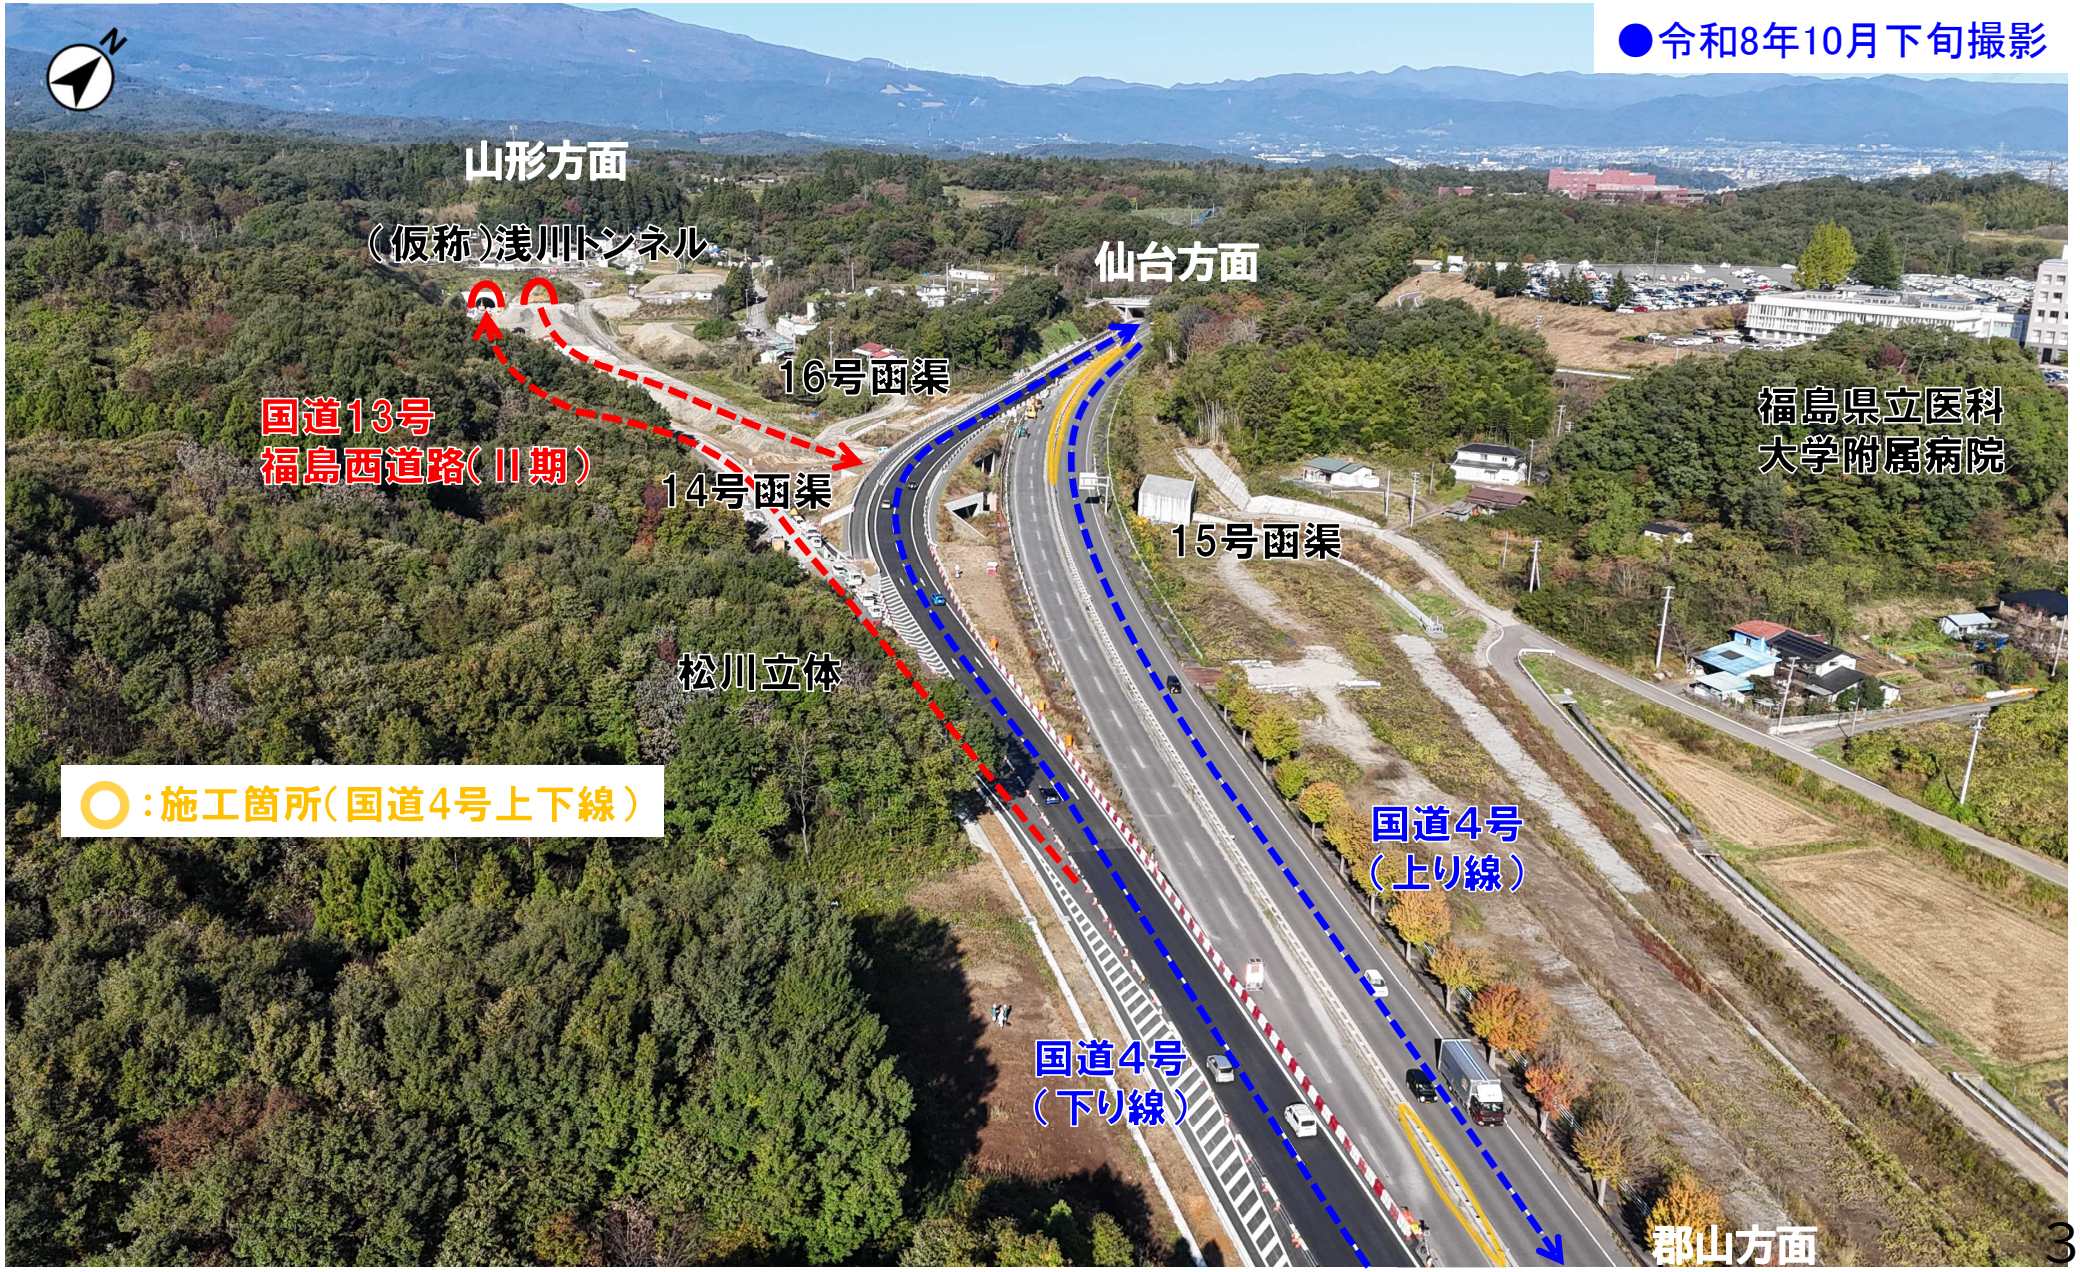

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（町畑地区）

資料4


○事業区間の町畑地区では、平田川において、国道13号下り線側の橋梁上部工架設に向け、桁製作工に着手しております。
○引き続き、橋桁の組立と架設するためのヤード造成等について工事進捗を図ります。

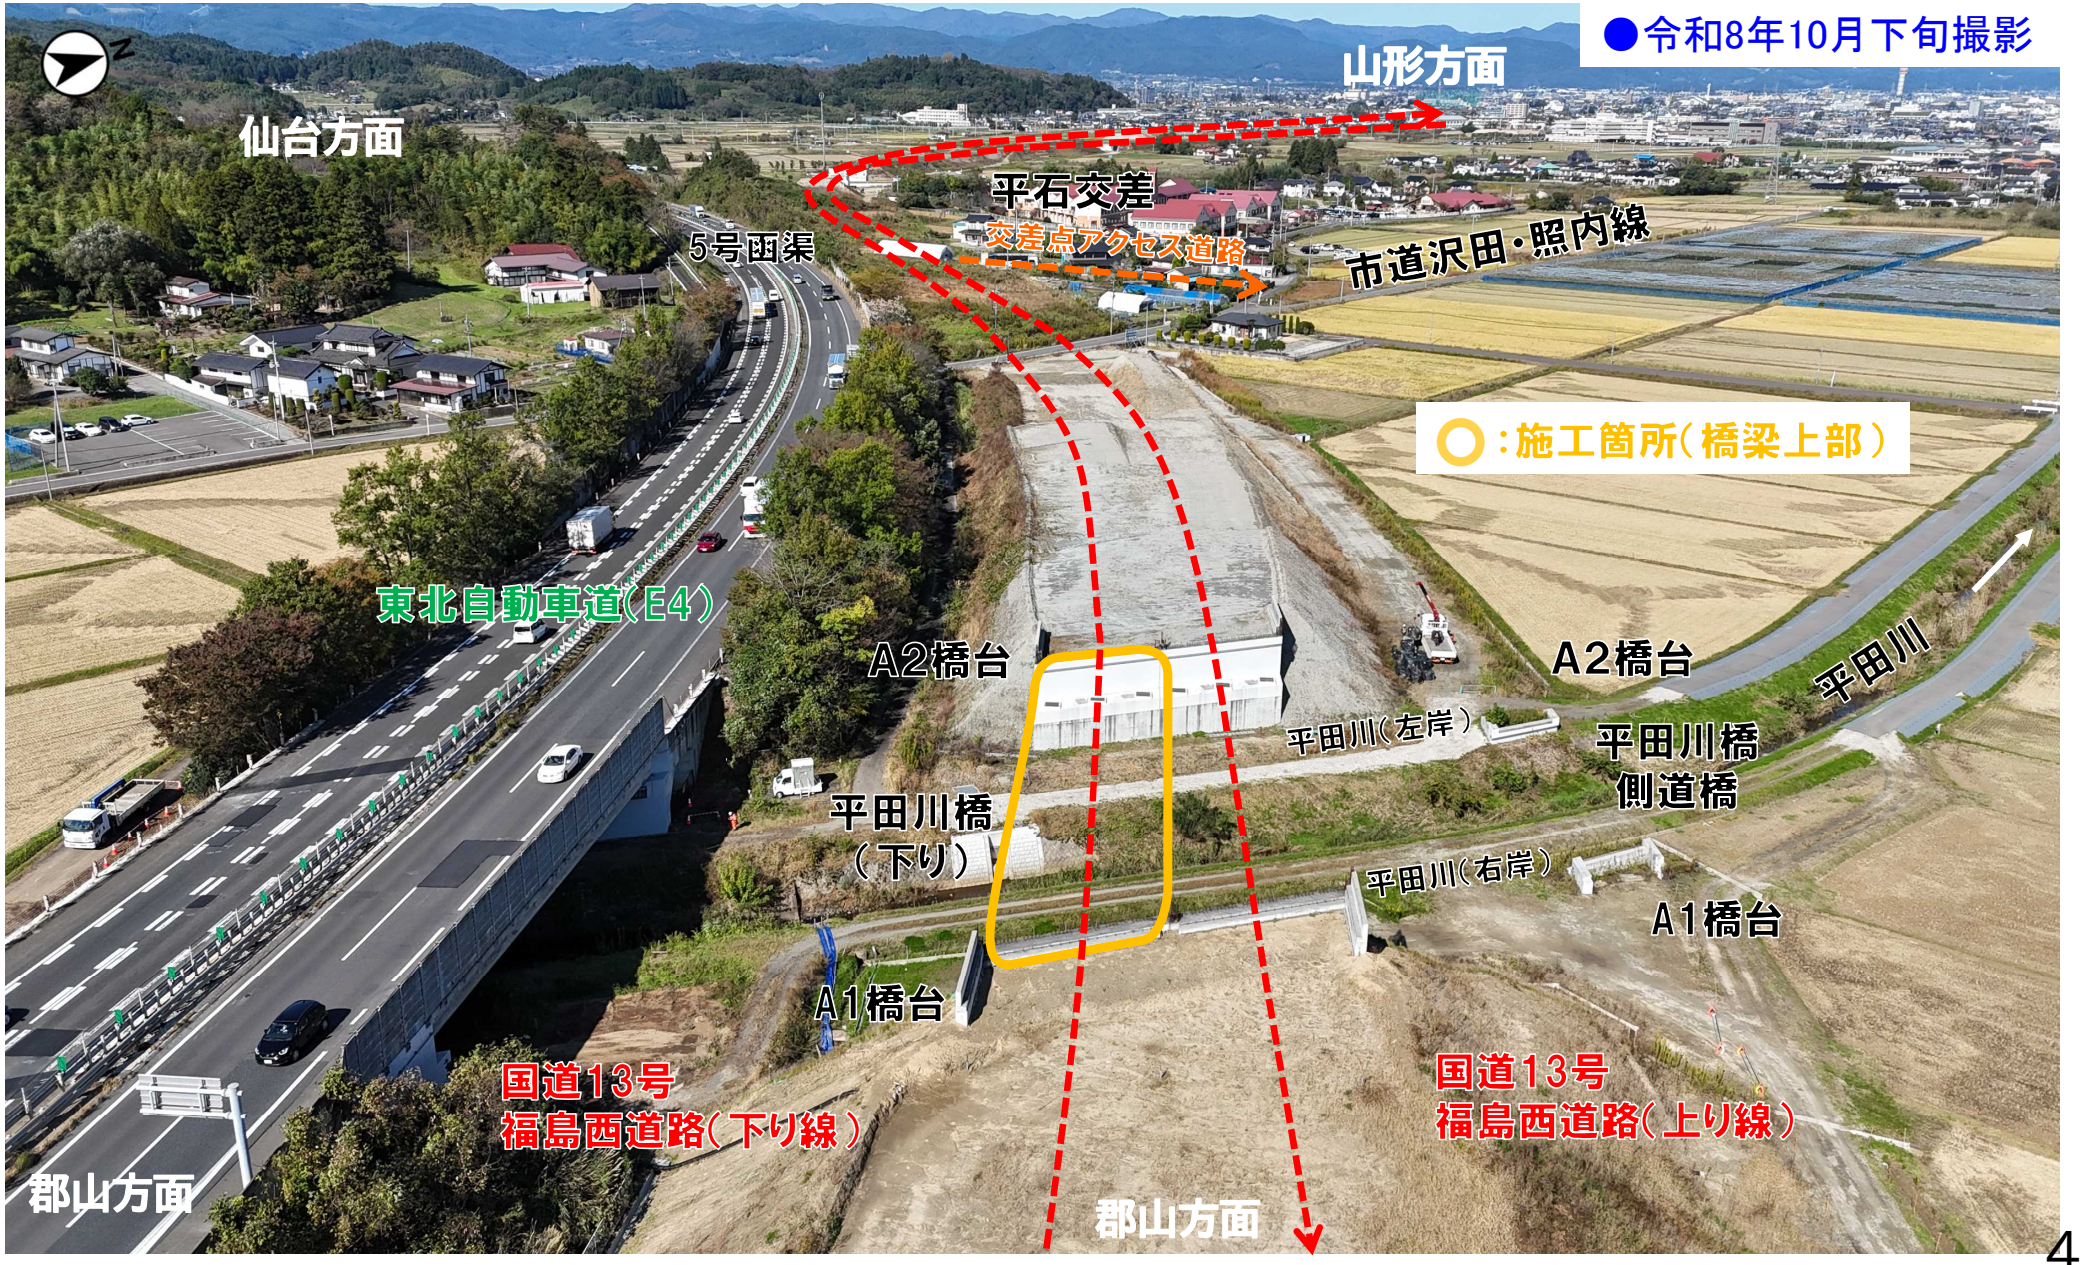

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（平石地区）

資料5


○事業区間の平石地区では、引き続き埋蔵文化財の発掘調査の進捗を図るとともに、濁川橋における国道13号下り線側の橋梁上部工工事の進捗を図ります。

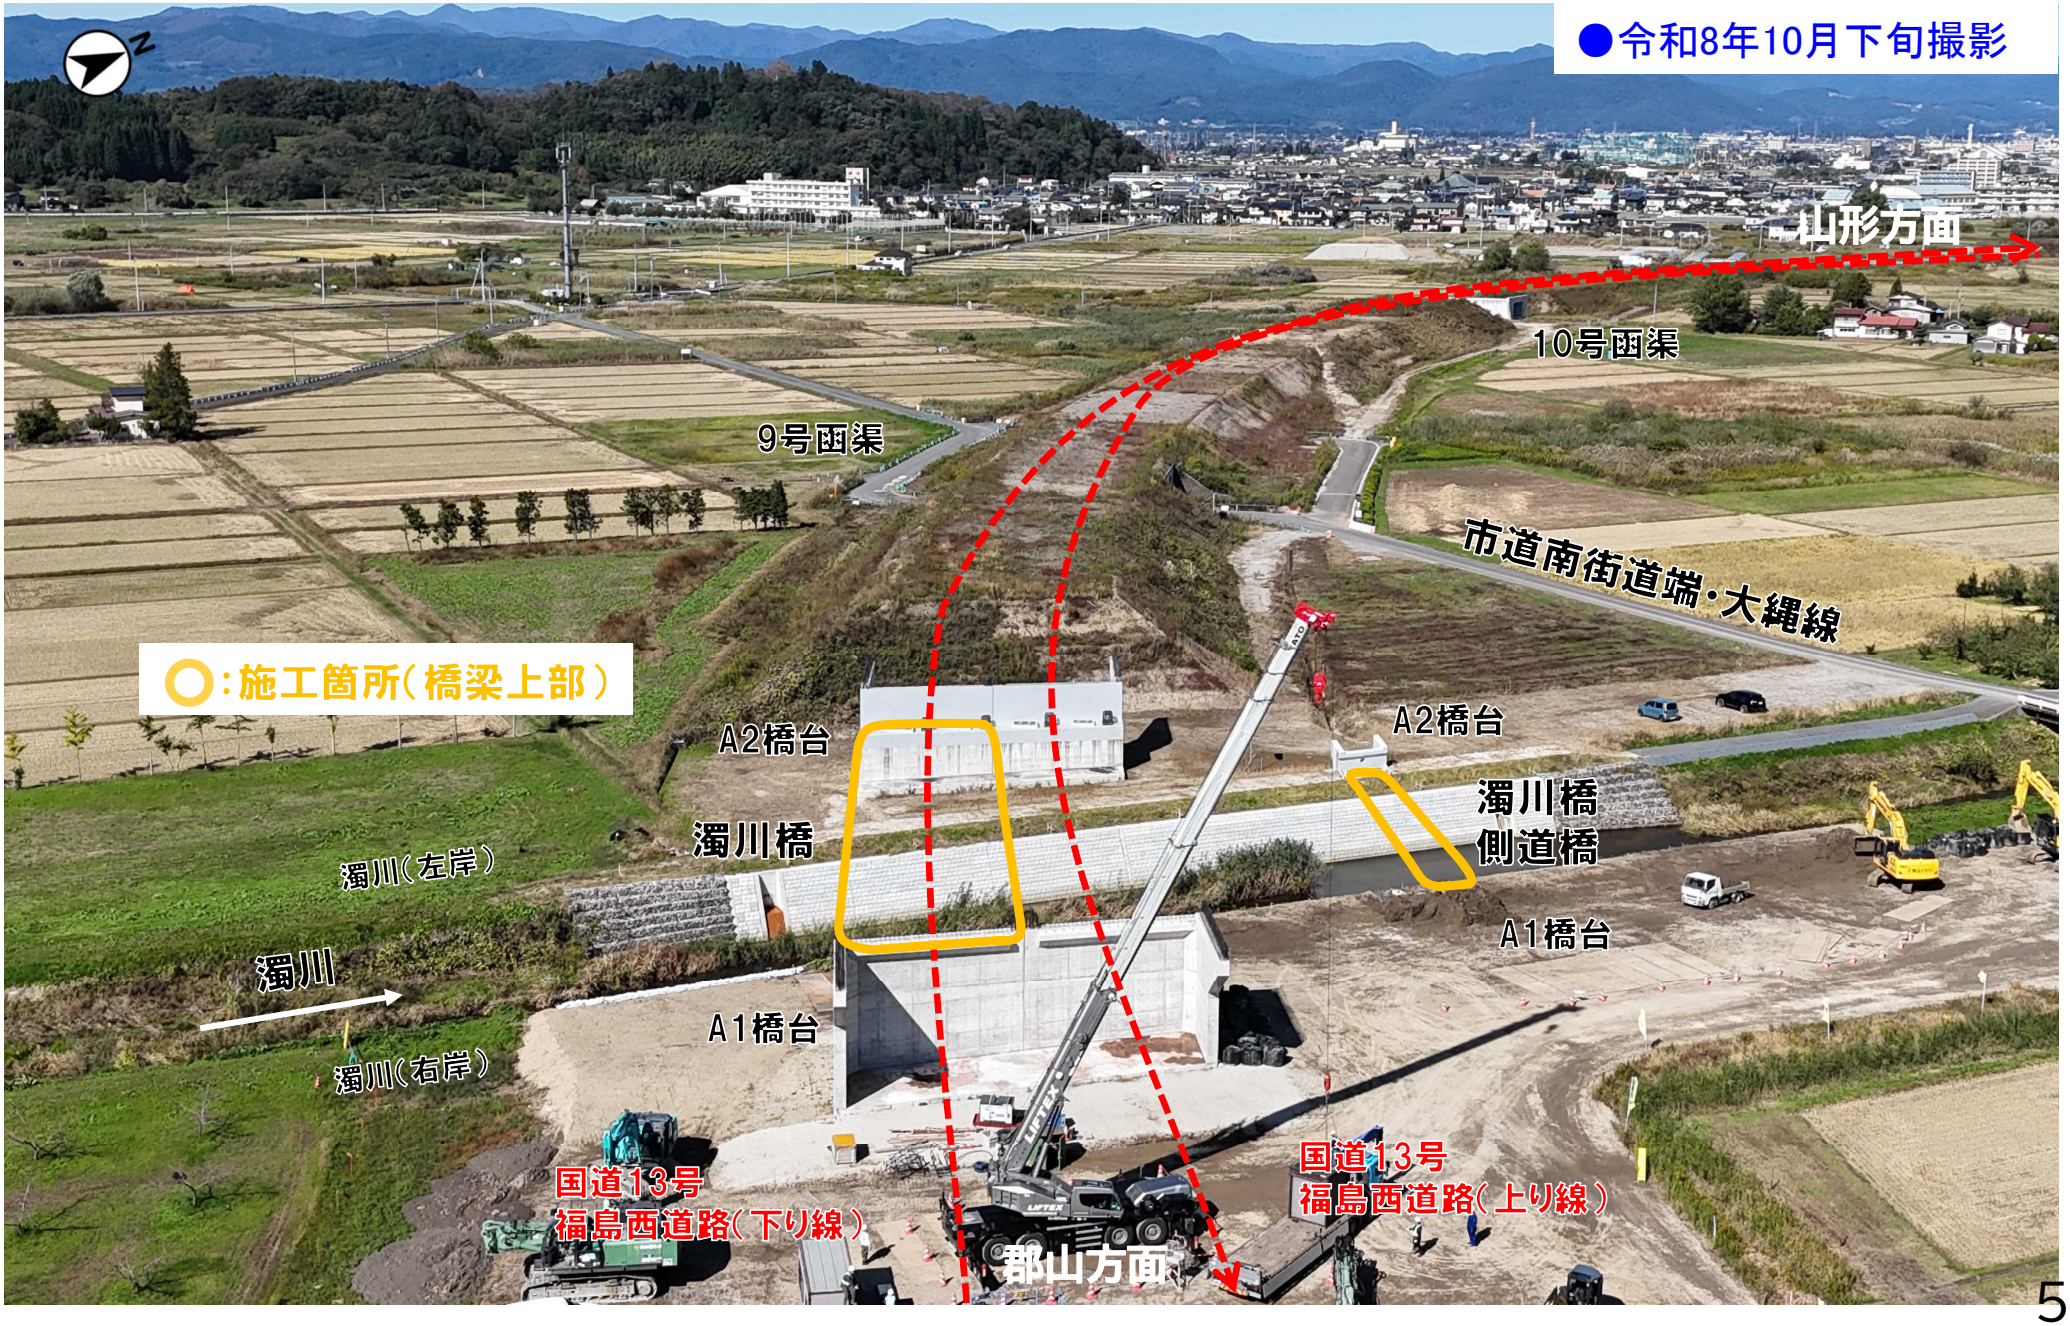

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区）

資料6

○事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っております。
○引き続き、沿線家屋に配慮しながら地盤改良工、擁壁工、11号と12号函渠の工事進捗を図ります。

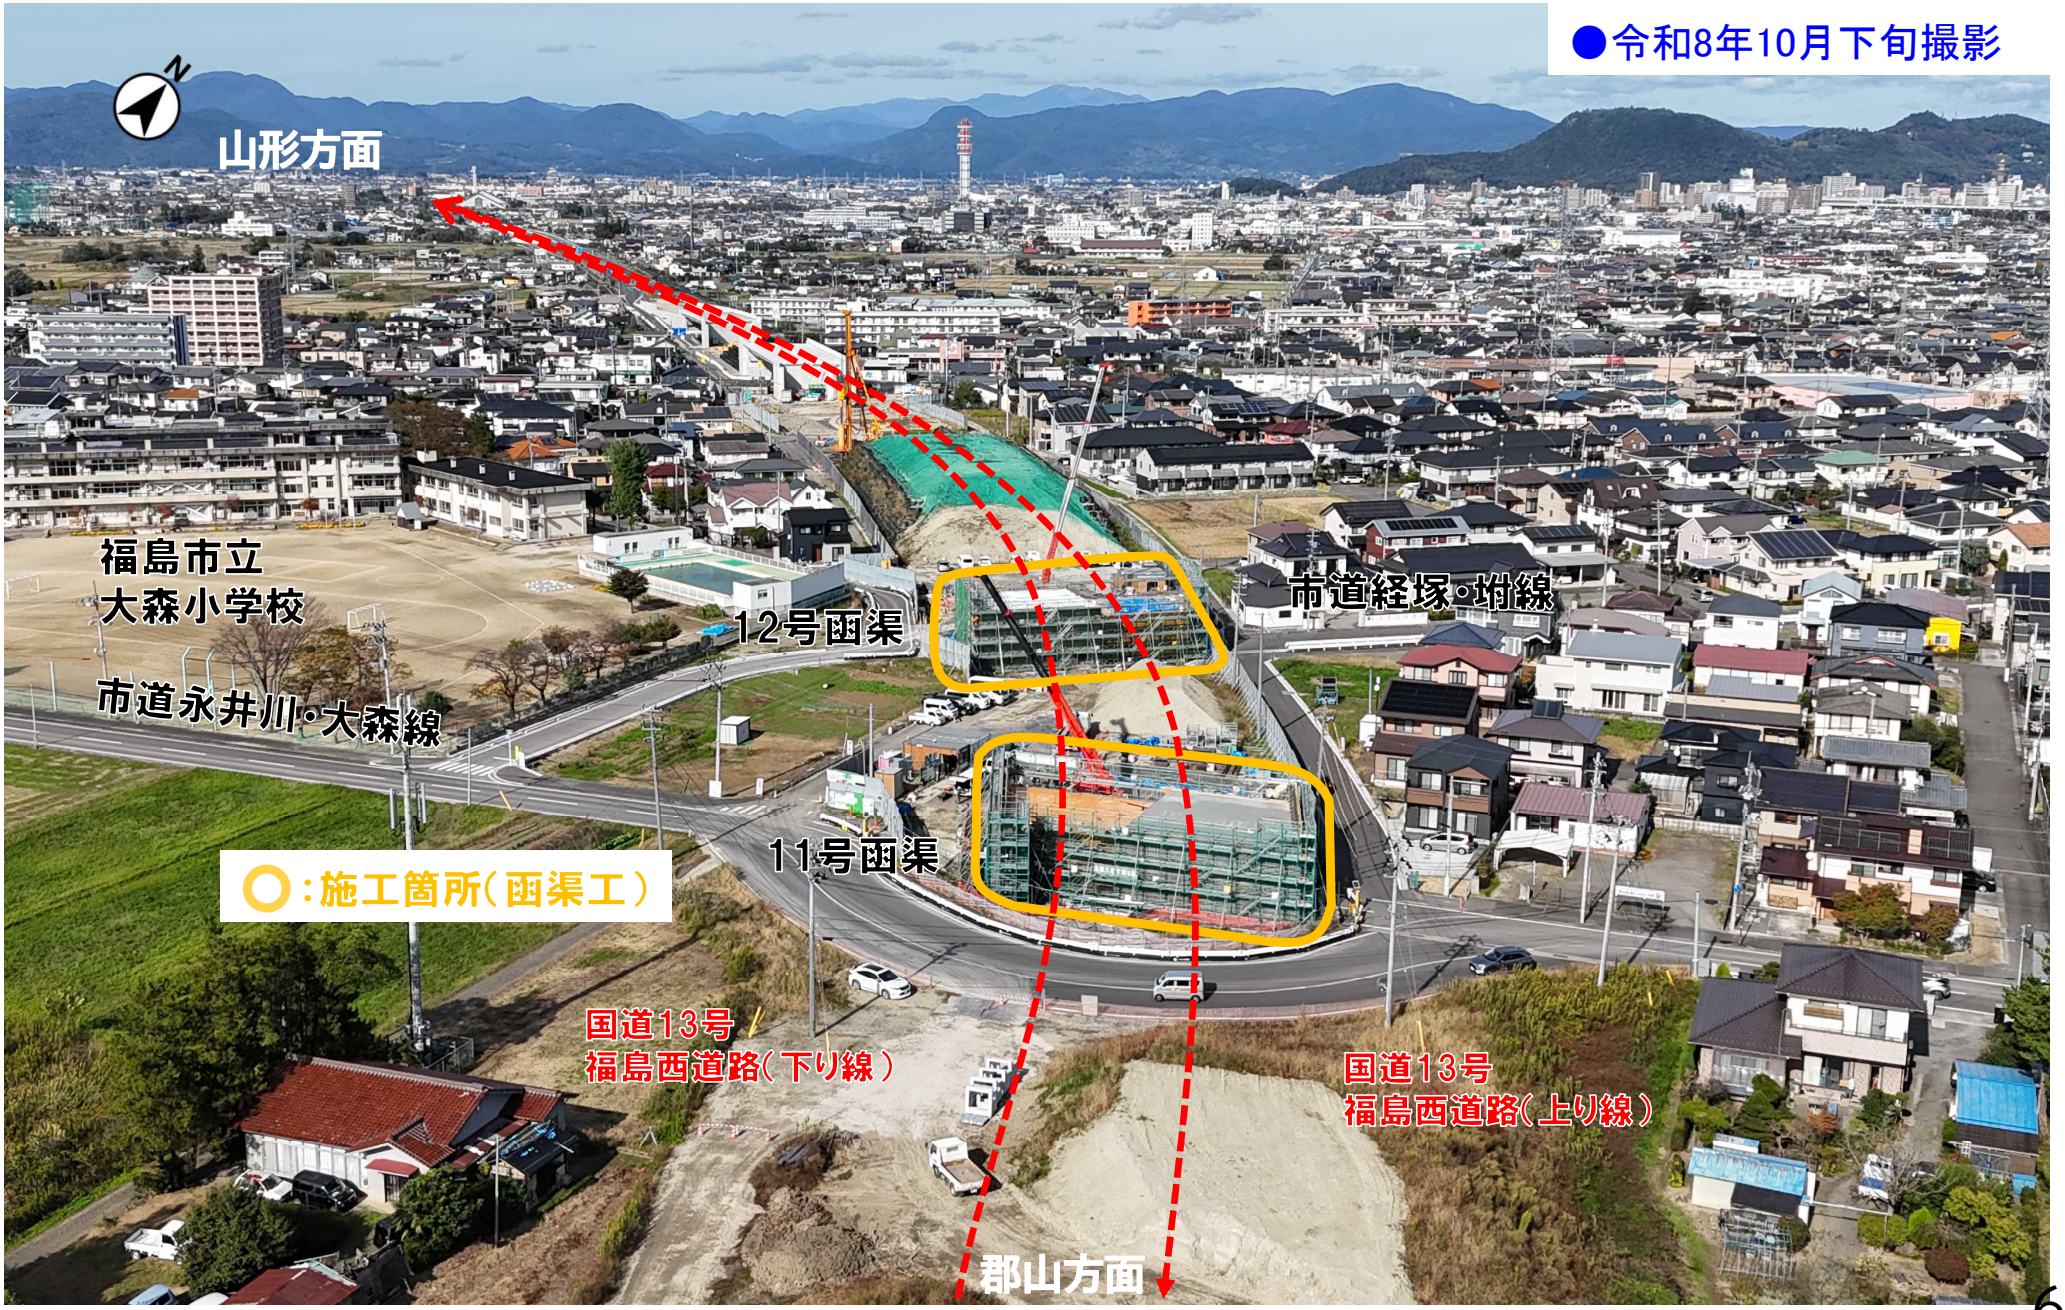

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区）

資料7

〇事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っております。
〇引き続き、沿線家屋に配慮しながら13号函渠箇所と西ノ内こ道橋間における地盤改良の工事進捗を図ります。

