がんばろう！東北　復興支援道路　発　行　日：　平成２８年９月１５日

宮古箱石道路通信　《号外》


サーモンくん　みやこちゃん

発　　行　：　宮古箱石道路安全協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
編集・監修：　国土交通省三陸国道事務所

台風１０号による災害対策の状況
～一般国道１０６号の応急復旧～

８月３０日（火）に岩手県をおそった台風１０号により国道１０６号は大きな被害を受けました。
三陸国道事務所では岩手県の要請を受け、８月３１日（水）より国道１０６号の応急復旧工事に着手しました。

宮古市花原市での復旧作業


被災状況（H28/8/31）【松尾建設　辻氏撮影】


応急復旧工法の検討（H28/8/31）


応急復旧工事着手前（H28/8/31）


被災状況調査（H28/8/31）


復旧作業（H28/9/1）


応急復旧完了（H28/9/3）

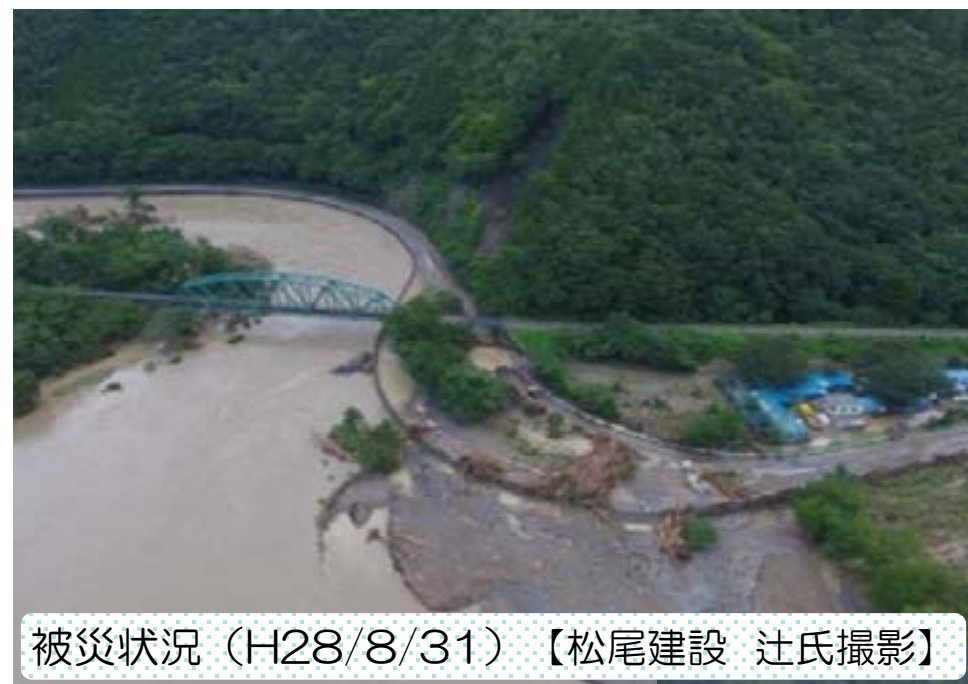
＊＊

～編集後記～

台風１０号による被害は、これまで経験したことがない未曾有の大災害となり、国道１０６号は通行止めとなりました。
庄司建設監督官と宮古箱石道路安全協議会・PPP・監督支援のメンバーは一丸となり、２４時間体制で復旧作業にあたり、９月１０日（土）１７時に通行可能となりました。
ごくろうさまでした。　（M）



宮古市蟇目での復旧作業


被災状況（H28/8/31）【松尾建設　辻氏撮影】


啓開作業（H28/9/2）

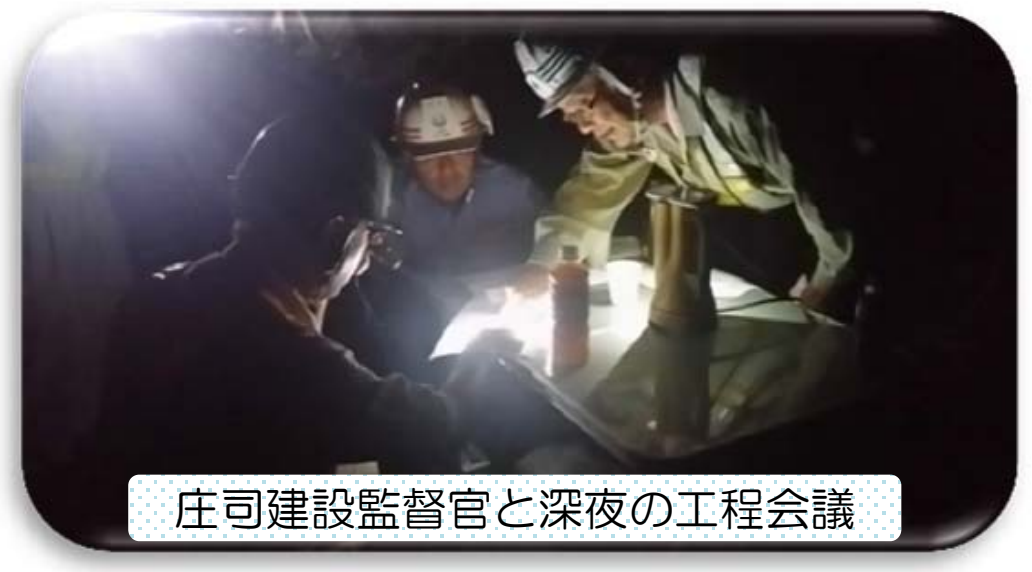

啓開作業（H28/9/2）


復旧作業（H28/9/4）【松尾建設　辻氏撮影】


応急復旧完了（H28/9/7）【松尾建設　辻氏撮影】

宮古市茂市での復旧作業


応急復旧工法の検討(H28/9/2)


庄司建設監督官と深夜の工程会議


２４時間体制での応急復旧作業


被災状況（H28/8/31）


復旧作業（H28/9/4）


応急復旧完了（H28/9/10）

宮古市川内（夏屋１号橋）での復旧作業


被災状況（H28/8/31）


復旧作業（H28/9/1）


応急復旧完了（H28/9/1）

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号

台風10号による被災状況

No.	被 災 場 所	被 災 内 容	規　模	備　　考
①	宮古市花原市	道路崩壊	L＝約　60m	平成28年9月2日19時応急復旧工事完了
②	宮古市蟇目	車道洗掘、流木	L＝約　50m	平成28年9月2日21時応急復旧工事完了{大平まで通行可（地元住民のみ）}
③	宮古市蟇目～茂市	道路崩壊、流木、土砂流入	L＝約260m	平成28年9月10日17時応急復旧工事完了
④	宮古市川内	夏屋1号橋背面流出	L＝約　15m	平成28年9月1日15時応急復旧工事完了

④宮古市川内



橋台背面流失

③宮古市蟇目～茂市



上流側車道崩壊



中央部車道崩壊



下流側車道崩壊

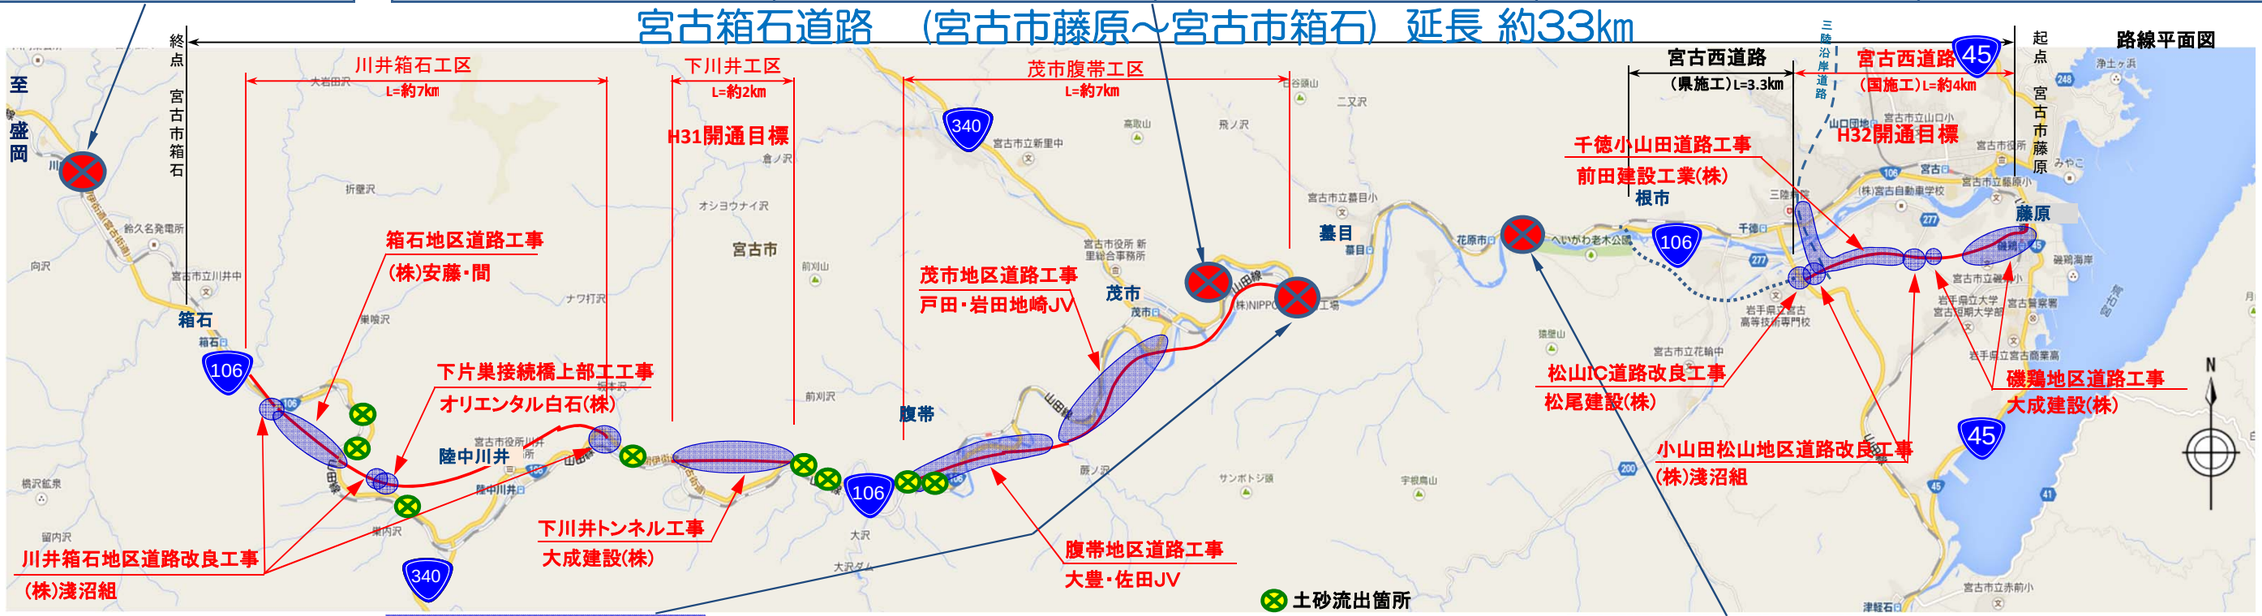


車道を塞ぐ流木、土砂



車道を塞ぐ流木

宮古箱石道路　（宮古市藤原～宮古市箱石）延長 約33km



②宮古市蟇目



車道を塞ぐ流木



車道洗掘　盛岡方面



車道洗掘　宮古方面

①宮古市花原市



上流側車道崩壊



中央部車道崩壊



下流側車道崩壊

宮古市キャラクター利用許可　水　第1091号
