橋梁の長寿命化修繕計画

［令和２年度版］

令和４年３月

国土交通省　東北地方整備局

目　　次

１．管内の道路管理概要　１頁
(1)道路管理延長
(2)管理橋梁数

２．橋梁の現状と課題　２頁
(1)現状と課題
(2)橋梁建設後の経過年数
(3)橋梁の種類

３．橋梁の維持管理の基本的な考え方　４頁
(1)基本方針
(2)定期点検・診断
(3)対策実施方針
(4)計画期間
(5)対策の優先順位

４．予防保全の取り組み　６頁
(1)予防保全とは
(2)予防保全による効果
(3)予防保全の取り組み事例

５．施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用　８頁
(1)施設の状態
(2)損傷の特徴と原因
(3)対策内容
(4)実施時期

【別添】点検・修繕・架替リスト（計画）

1. 管内の道路管理概要

（１）道路管理延長

東北地方整備局は、一般国道16路線の他、東北横断自動車道釜石秋田線、東北中央自動車道、日本海沿岸東北自動車道の延長約3,195kmを管理しています。

表－１　東北管内の直轄管理区間

路線名	区間延長
国道4号	570.5km
国道6号	158.2km
国道7号	452.6km
国道13号	361.7km
国道45号	747.1km
国道46号	93.8km
国道47号	133.4km
国道48号	53.4km
国道49号	173.3km
国道101号	23.2km
国道104号	18.3km
国道108号	40.2km
国道112号	101.7km
国道113号	52.5km
国道115号	36.0km
国道283号	33.7km
東北横断自動車道釜石秋田線	33.6km
東北中央自動車道	46.0km
日本海沿岸東北自動車道	65.8km
合計	3,195.0km

（令和３年４月１日現在）

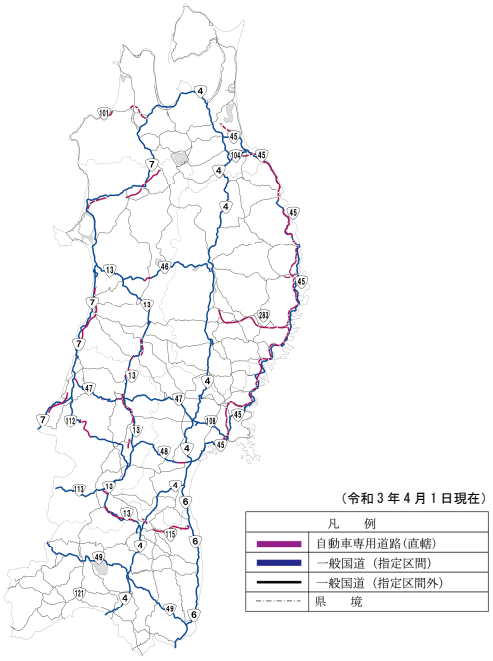

図－１　東北管内の路線図

（２）管理橋梁数

東北地方整備局は、4,380橋の橋梁を管理しています。

表－２　路線別の管理橋梁数

路線名	橋梁数
国道4号	829
国道6号	396
国道7号	488
国道13号	671
国道45号	698
国道46号	162
国道47号	187
国道48号	73
国道49号	222
国道101号	39
国道104号	10
国道108号	43
国道112号	165
国道113号	99
国道115号	71
国道283号	22
東北横断自動車道釜石秋田線	42
東北中央自動車道	68
日本海沿岸東北自動車道	95
合計	4,380

（令和３年３月末時点）

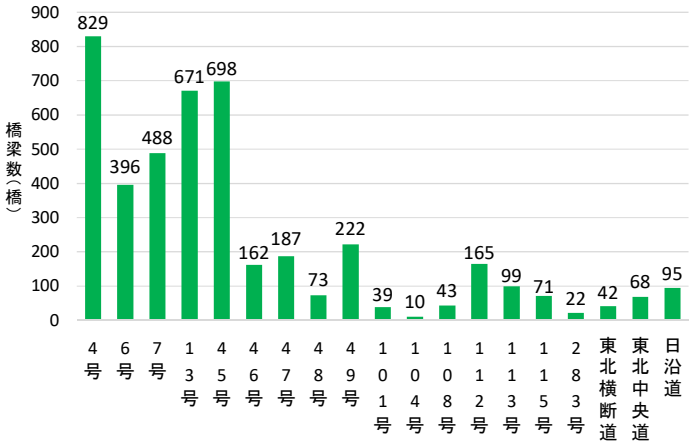

図－２　路線別の管理橋梁数

※別添リストでは、国道７号には E7、国道 13 号には E13、国道 45 号には E4A、E45 が含まれている。また、国道 101 号は E64、国道 115 号は E13、国道 283 号は E46、東北横断自動車道は E46、東北中央自動車道は E13、日本海沿岸東北自動車道は E7 としている。

2. 橋梁の現状と課題

（１）現状と課題

東北地方整備局が管理する橋梁は令和3年3月末時点で4,380橋あります。建設の推移を見ると、高度経済成長期といわれる1955年から1973年にかけて全体の約3割にあたる約1,350橋が建設され、今後、これらの橋梁の高齢化が一斉に進みます。

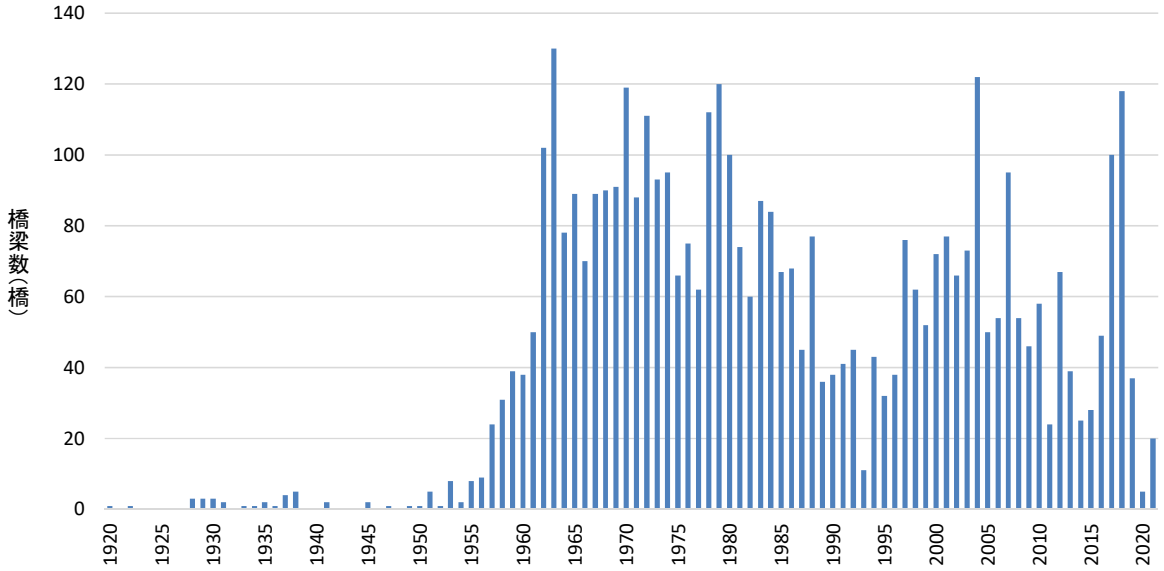

図－３　建設年度別橋梁数

（２）橋梁建設後の経過年数

建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在約28%であるのに対し、10年後には約48%、20年後には約62%となります。

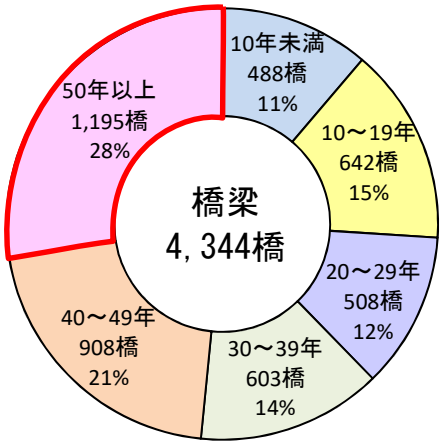

図－４　年齢別橋梁数割合

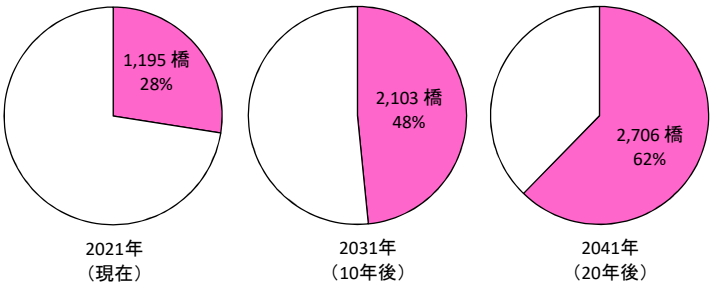

図－５　建設後 50 年を経過した橋梁の割合

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が 36 橋ある。

（３）橋梁の種類

表－３　橋梁の種類（上部工使用材料別）

管理橋梁		鋼橋		ＰＣ橋		ＲＣ橋		混合橋※		溝橋※	
橋梁数	延長（km）	橋梁数	延長（km）	橋梁数	延長（km）	橋梁数	延長（km）	橋梁数	延長（km）	橋梁数	延長（km）
4,380	211.7	1,413	136.4	1,338	51.7	275	5.7	35	11.1	1,319	6.8

（令和３年３月末時点）

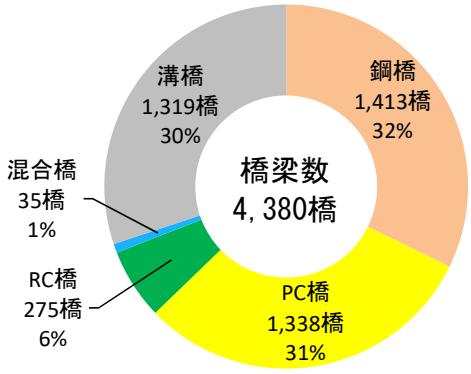

図－６　上部工使用材料別割合（橋梁数）

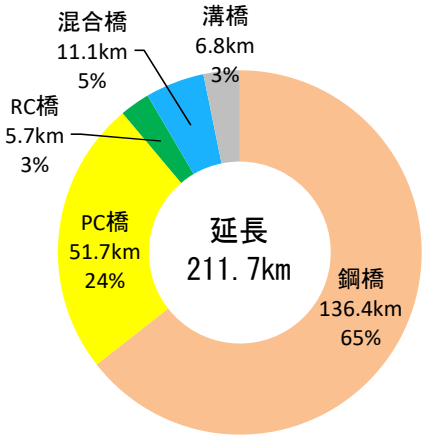

図－７　上部工使用材料別割合（延長）

※混合橋：多径間で、鋼橋＋PC 橋または鋼橋＋RC 橋の上部工構造形式が異なる橋梁のことをいう。
　　なお、PC 橋＋RC 橋の場合は、主たる上部工使用材料にて計上している。
※溝橋　：道路の下を横断する道路や水路等の空間を確保するために盛土あるいは地盤内に設けられている構造物で、橋長 2m 以上かつ土被り 1m 未満のボックスカルバートのことをいう。

3. 橋梁の維持管理の基本的な考え方

（１）基本方針

東北地方整備局で管理する橋梁について、橋梁の長寿命化修繕計画を策定します。橋梁の老朽化対策を確実に進めるため、点検から始まり、診断、措置、記録というメンテナンスサイクルを構築、推進し、適切な維持管理を実施します。

予防保全による道路メンテナンスへ早期に移行するため、定期点検等により確認された修繕が必要な施設の対策を実施し、ライフサイクルコストの低減や持続可能な維持管理を実現します。

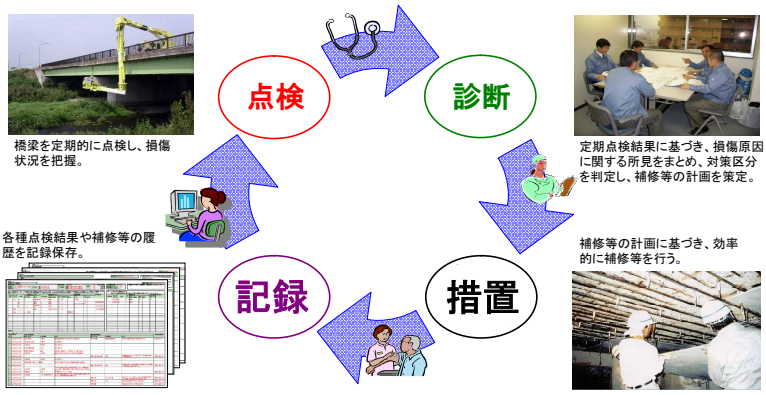

図－８　メンテナンスサイクル

（２）定期点検・診断

橋梁の定期点検は「橋梁定期点検要領（平成31年3月）」に基づき、供用開始後2年以内に初回を行い、2回目以降は5年に1回の頻度で行うことを基本とします。

定期点検では、近接目視を基本とし、診断結果については健全性を4段階で区分するとともに、判定区分に応じ適切に措置を講じます。

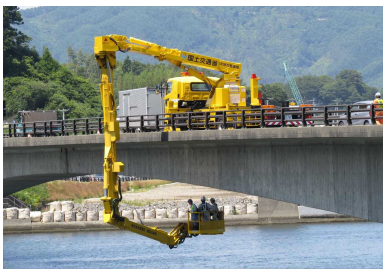

定期点検状況

健全性の診断
判定区分

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

（３）対策実施方針

定期点検結果の判定区分に応じて対策を行います。

「判定区分Ⅳ」は、緊急に措置を講じます。

「判定区分Ⅲ」は、定期点検後、次回の定期点検まで（５年程度以内）に措置を講じます。

「判定区分Ⅳ」および「判定区分Ⅲ」の対策を推進するとともに、今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえたうえで、「判定区分Ⅱ」の対策を実施します。

（４）計画期間

計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔と措置（補修等）の時期が明らかとなるよう5年計画とします。なお、新たな点検結果等を踏まえ、毎年度計画を更新します。

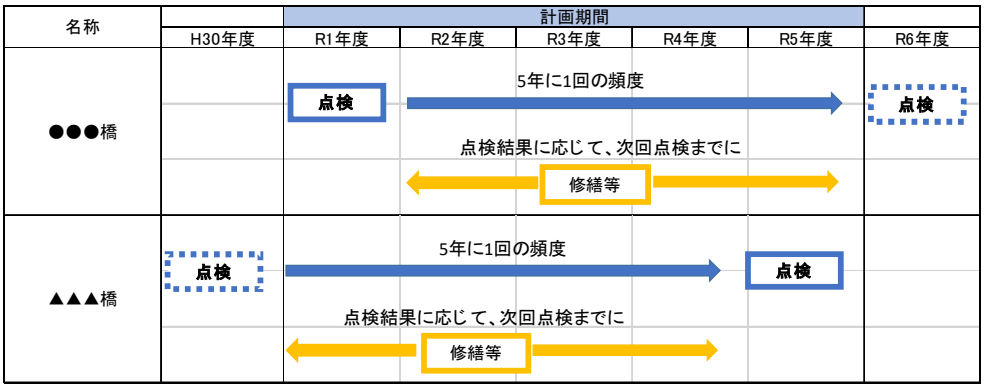

図－９　点検・修繕計画のイメージ図

（５）対策の優先順位

点検結果に基づいて、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要な措置を講じます。なお、対策の優先順位は、橋梁の損傷程度（損傷発生部位・部材、対策区分、進行度合い等）や利用者・第三者への影響度、路線の重要度（緊急輸送道路、迂回路の有無等）などを総合的に勘案して判断します。

4. 予防保全の取り組み

（１）予防保全とは

定期点検により早期に損傷を発見し、施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じることです。大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サービスの提供やライフサイクルコストの縮減等を図ります。

予防保全の取り組みは、日常管理から補修工事まで様々であり、取り組み事例の一部を次頁で紹介します。

（２）予防保全による効果

損傷が深刻化してからの大規模修繕や架替（事後保全）は、修繕費の増大だけでなく、重大事故の発生や大規模工事に伴う交通規制による渋滞や迂回など道路利用者への影響が大きくなります。

予防保全型の対策を行うことで橋梁の長寿命化が図られ、ライフサイクルコストの縮減が可能となります。さらに損傷が深刻化する前に対策しているため、工事に伴う交通規制も最小限となり、道路利用者に対する安全性と利便性の確保も図っています。

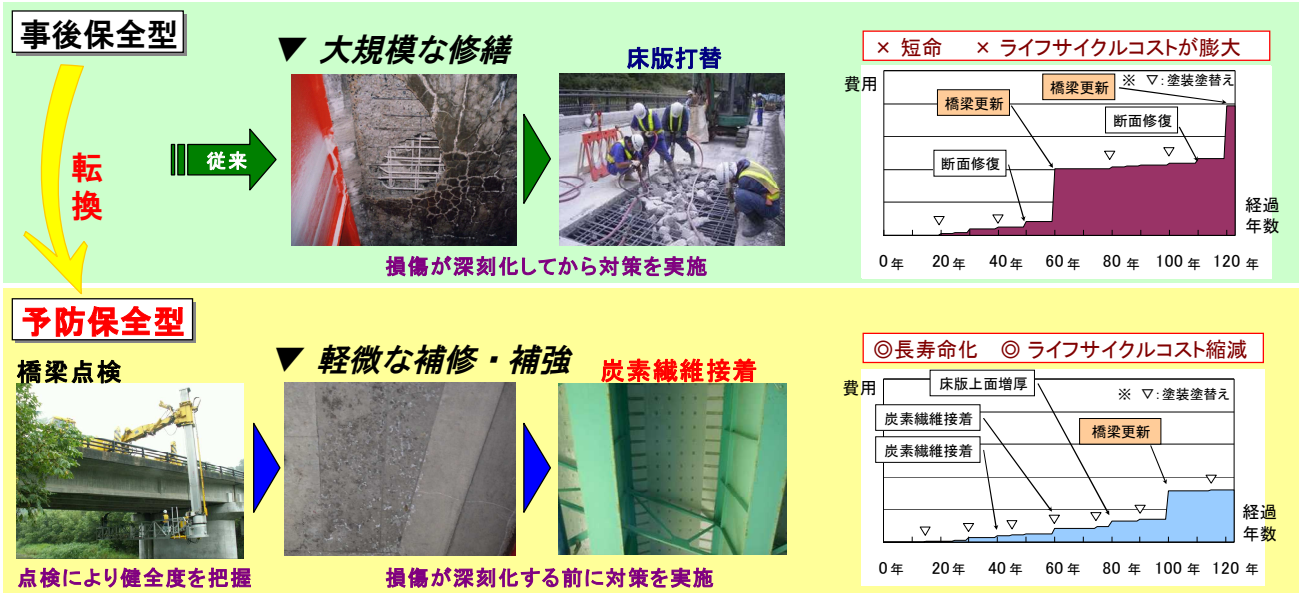

図－１０　予防保全による効果

（３）予防保全の取り組み事例

① 予防保全の対策事例【日常管理】

損傷発生原因（土砂堆積等）を日常管理で除去することで、損傷発生の予防となり、健全性の確保を図ります。損傷発生を予防する日常管理は、予防保全の取り組みの中で最も根本的な対策となります。

対策事例として、除草や排水枡の清掃、土砂撤去等があげられます。

歩道部の除草

排水枡の清掃

② 予防保全の対策事例【維持工事】

軽微な損傷に対して、簡易な維持工事で対応可能な対策を実施することで、健全性の確保を図ります。損傷の深刻化や他部材への損傷の拡大を予防するため、維持工事の範囲内で対策を実施します。

対策事例として、舗装のひびわれ補修（シール材注入）や簡易止水構造の設置、橋座清掃、桁端洗浄等があげられます。

舗装のひびわれ補修
（シール材注入）

漏水部への
簡易止水構造の設置

橋座の清掃

③ 予防保全の対策事例【補修工事】

損傷が深刻化する前に補修工事を実施することで、重大事故の発生等を予防します。維持工事では対応できない損傷に対して対策を実施します。

対策事例として、断面修復工や橋面防水工があげられます。

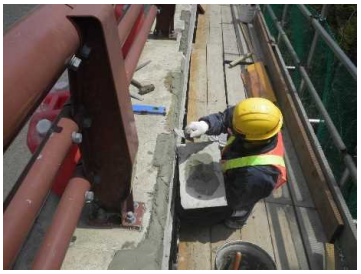

断面修復工

橋面防水工

5. 施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用

（１）施設の状態

東北地方整備局が管理する橋梁4,380橋のうち、令和元年度から令和2年度までに1,678橋の定期点検を実施し、その結果は、判定区分Ⅰが549橋、判定区分Ⅱが981橋、判定区分Ⅲが148橋、判定区分Ⅳが0橋となっています。

表－４　令和元年度～令和２年度までの定期点検結果

（単位：橋）

管理施設数	うち点検対象施設数※	R1-R2点検実施数	R1-R2 判定区分			
			Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
4,380	4,051	1,678	549	981	148	0

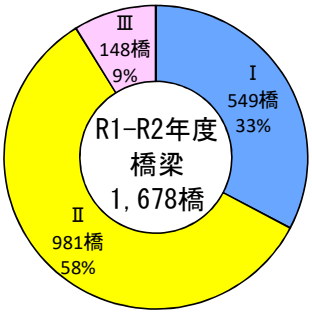

図－１１　判定区分割合

判定区分

区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

（２）損傷の特徴と原因

高度経済成長期に架設された橋梁を中心に、コンクリートの剥離・鉄筋露出、鋼桁の腐食、床版のひびわれ等の損傷が生じ始めています。

東北管内では、日本海沿岸部の飛来塩分や積雪寒冷地特有の凍害、凍結抑制剤の散布の影響による腐食等の損傷が多く発生しています。

東北管内と全国の点検結果（R1-R2）を比較すると、判定区分Ⅱ以上の損傷割合は東北が全国より高くなっています。東北は全国でも特に厳しい環境条件にあると考えられます。

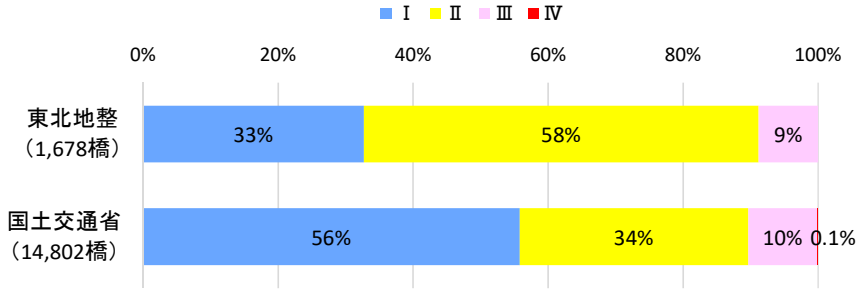

図－１２　地域別判定区分割合（R1-R2）

※令和３年３月末時点での施設数のうち、供用後５年以内などを除いた施設数の合計

（３）対策内容

対策方法は、点検結果に基づいて損傷の状況を十分に把握し選定するとともに、その範囲・規模については、対策の目的を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。

■橋梁定期点検における損傷及び対策事例

主桁

【損傷状況①】
断面欠損

【対策事例①】
主桁補修

床版

【損傷状況②】
ひびわれ（格子状）

【対策事例②】
部分打替＋炭素繊維シート貼付

下部工

【損傷状況③】
竪壁の剥離・鉄筋露出、うき

【対策事例③】
断面修復工

支承

【損傷状況④】
本体の機能障害、移動

【対策事例④】
支承補修

伸縮
装置

【損傷状況⑤】
舗装ひびわれ

【対策事例⑤】
舗装補修

排水管

【損傷状況⑥】
腐食、欠損

【対策事例⑥】
部材交換

（４）実施時期

橋梁の長寿命化修繕計画の推進を図るには、予防保全の考え方によるインフラメンテナンスの実施を基本として、施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じることが重要となってきます。

実施時期は、点検結果及び維持補修の効率化等を踏まえ、表のとおりとします。

表－５　定期点検計画　（単位：橋）

点検計画					
R1	R2	R3	R4	R5	合計
921	931	923	898	700	4,373

表－６　修繕計画　（単位：橋）

修繕計画					
R1	R2	R3	R4	R5	合計
239	179	89	136	168	811

※点検計画及び修繕計画については、令和3年3月末時点における予定であり、今後、予算措置状況、施設の新設・撤去・廃止・管理移管等により変更する場合がある。
※修繕計画について、措置が複数年度にわたる場合は各年度に計上している。（架替等は除く）

長寿命化修繕計画　【別添】

点検・修繕・架替リスト（計画）

[令和3年3月末時点]

令和4年3月

東 北 地 方 整 備 局

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1	青岩大橋	国道4号	1970	51	139.9	8.2	鋼橋		青森	十和田	青森県	三戸町	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□	□				当て板補強
2	三戸橋	国道4号	1972	49	70.1	10.8	鋼橋		青森	十和田	青森県	三戸町	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					当て板補強
3	境ノ沢跨道橋	国道4号	1972	49	15.0	8.2	PC		青森	十和田	青森県	三戸町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4	後藤橋	国道4号	1962	59	18.6	9.1	RC		青森	十和田	青森県	十和田市	H28	Ⅲ						○					□	□		断面修復
5	中野橋	国道4号	1978	43	36.6	9.5	PC		青森	十和田	青森県	七戸町	H26	Ⅱ	防護柵補修	R1	Ⅲ	○									□	断面修復
6	坪橋	国道4号	1971	50	94.0	9.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	七戸町	H26	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅱ	○						□				床版補修
7	一の渡橋（上）	国道4号	1934	87	18.7	5.1	RC		青森	十和田	青森県	東北町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
8	一の渡橋（下）	国道4号	1967	54	19.1	3.7	PC		青森	十和田	青森県	東北町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
9	枇杷野橋	国道4号	1964	57	15.6	8.7	PC		青森	十和田	青森県	野辺地町	H28	Ⅱ						○								
10	野辺地跨線橋	国道4号	1966	55	23.4	8.5	鋼橋		青森	十和田	青森県	野辺地町	H28	Ⅰ						○								
11	馬渕橋	国道4号	1978	43	283.1	10.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	三戸町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□	□			床版補修
12	南部大橋	国道4号	1978	43	251.8	10.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	南部町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
13	五戸新橋	国道4号	1980	41	56.8	11.9	鋼橋		青森	十和田	青森県	五戸町	H28	Ⅱ						○								
14	下長下跨道橋	国道4号	1980	41	17.1	13.2	PC		青森	十和田	青森県	五戸町	H29	Ⅱ							○							
15	あかさか跨道橋	国道4号	1980	41	18.1	12.8	PC		青森	十和田	青森県	五戸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
16	高清水橋	国道4号	1985	36	66.0	14.0	PC		青森	十和田	青森県	十和田市	H29	Ⅱ							○							
17	相坂橋（相坂大橋）	国道4号	1997	24	177.5	11.3	鋼橋		青森	十和田	青森県	十和田市	H30	Ⅱ								○						
18	大光寺橋	国道4号	1998	23	28.9	14.5	鋼橋		青森	十和田	青森県	十和田市	H30	Ⅰ								○						
19	畑刈川橋	国道4号	1998	23	20.3	14.5	PC		青森	十和田	青森県	十和田市	H30	Ⅰ								○						
20	毛無森橋	国道4号	1980	41	12.5	13.0	PC		青森	十和田	青森県	五戸町	H30	Ⅱ								○						
21	上新井田橋	国道4号	1980	41	12.5	9.2	PC		青森	十和田	青森県	五戸町	H30	Ⅱ								○						
22	上沖田面溝橋	国道4号	1963	58	3.3	12.3	RC		青森	十和田	青森県	南部町	H30	Ⅰ								○						
23	野崎橋	国道4号	1987	34	12.5	20.0	PC		青森	十和田	青森県	十和田市	H30	Ⅲ								○					□	断面修復
24	相坂ご道橋	国道4号	1998	23	11.7	14.5	PC		青森	十和田	青森県	十和田市	H30	Ⅰ								○						
25	堀差橋	国道4号	1959	62	22.8	7.1	PC		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅱ							○							
26	清水川大橋	国道4号	1964	57	66.7	8.0	混合橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅲ							○				□	□		床版補修
27	沼館跨線橋	国道4号	1965	56	17.1	9.4	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	支承補修
28	小湊橋	国道4号	1963	58	66.6	7.8	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				床版補修
29	山口跨線橋	国道4号	1965	56	25.2	8.7	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅲ						○				□	□			支承取替
30	新野内橋（上）	国道4号	1974	47	81.8	12.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○						□	□			断面修復
31	新野内橋（下）	国道4号	2000	21	81.8	12.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
32	青森東跨線橋（上）	国道4号	1974	47	27.8	12.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○			□	□	□	□	断面修復
33	青森東跨線橋（下）	国道4号	1981	40	27.8	12.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○			□	□	□	□	当て板補強
34	堤橋	国道4号	1984	37	64.2	31.8	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
35	新城大橋（上）	国道7号	1971	50	86.0	12.8	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅲ						○				□				床版補修
36	新城大橋（下）	国道7号	2000	21	86.0	13.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
37	青森高架橋（上）	国道7号	1972	49	993.8	12.8	混合橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○		□	□	□	□	□	床版補修
38	古川跨線橋（上）	国道7号	1993	28	68.5	14.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
39	古川跨線橋（下）	国道7号	1993	28	68.5	14.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
40	浅虫跨線橋	国道4号	1976	45	20.2	11.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
41	新根井川橋	国道4号	1975	46	38.3	11.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
42	貴船川橋（下）	国道4号	1976	45	20.6	11.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
43	貴船川橋（上）	国道4号	2001	20	20.6	11.5	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H30	Ⅱ								○						
44	丸沢橋（下）	国道7号	1980	41	29.0	22.3	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○				□			支承補修
45	丸沢橋（上）	国道7号	1980	41	29.0	18.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○				□			床版補修

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性H26-30		年度	健全性R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
46	第２丸山跨道橋	国道7号	1978	43	15.7	9.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
47	三内跨道橋（上）	国道7号	1980	41	25.1	12.7	PC		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
48	三内跨道橋（下）	国道7号	1980	41	25.1	16.1	PC		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
49	造道橋（上）	国道4号	1982	39	24.0	17.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								
50	造道橋（下）	国道4号	1982	39	24.0	17.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
51	新城高架橋	国道7号	1983	38	229.7	12.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
52	白樺橋	国道7号	1983	38	70.0	12.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ						○								
53	鶴ケ坂１号橋	国道7号	1985	36	184.3	12.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
54	鶴ケ坂２号橋	国道7号	1986	35	142.0	12.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
55	鶴ケ坂３号橋	国道7号	1986	35	164.9	12.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅲ							○			□				床版補修
56	大袋川橋	国道7号	1985	36	24.5	17.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅰ							○							
57	妙見橋（下）	国道7号	1989	32	54.0	14.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
58	妙見橋（上）	国道7号	1996	25	60.3	16.3	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅰ							○							
59	横内川橋（下）	国道7号	1989	32	44.0	10.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
60	横内川橋（上）	国道7号	1996	25	49.2	16.3	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
61	駒込川橋（下）	国道7号	1989	32	82.0	10.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
62	赤川橋（下）	国道7号	2002	19	51.5	13.3	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H30	Ⅰ								○						
63	山田ご道橋（上）	国道7号	2002	19	29.0	11.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H30	Ⅰ								○						
64	口広橋	国道4号	1963	58	9.2	8.7	RC		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅰ							○							
65	梨ノ木橋	国道4号	1966	55	12.6	8.8	PC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
66	浜子橋	国道4号	1938	83	9.5	8.0	RC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										断面修復
67	藤沢溝橋	国道4号	1956	65	7.0	11.3	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
68	明神橋	国道4号	1938	83	11.4	7.9	RC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○						□				断面修復
69	媒川橋	国道4号	1967	54	13.5	24.6	PC		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅲ	電気防食	R1	Ⅲ	○										断面修復
70	浅虫橋	国道4号	1967	54	13.6	24.6	PC		青森	青森	青森県	青森市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○							□			電気防食
71	沖館高架側道橋	国道7号	1975	46	320.5	5.5	混合橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅲ						○			□	□	□	□	□	支承取替
72	古川跨道橋（上）	国道7号	1992	29	18.3	14.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
73	古川跨道橋（下）	国道7号	1992	29	18.3	14.5	PC		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
74	日暮橋	国道7号	1964	57	20.0	9.8	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅰ						○								
75	相乗橋	国道7号	1964	57	19.4	9.8	RC		青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅱ						○								
76	湯ノ沢橋	国道7号	1996	25	29.2	14.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H29	Ⅰ							○							
77	追分橋	国道7号	1974	47	86.0	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
78	船岡橋	国道7号	1971	50	48.0	9.3	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○								
79	碇ケ関陸橋	国道7号	1968	53	100.8	8.2	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅲ		R2	Ⅲ		○						□	□	□		塗替塗装
80	蔵館跨線橋	国道7号	1964	57	21.0	9.7	鋼橋		青森	弘前	青森県	大鰐町	H29	Ⅲ							○					□	□	塗替塗装
81	土渕川橋	国道7号	1972	49	60.5	7.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
82	新堅田橋	国道7号	1975	46	35.7	27.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅰ						○								
83	堅田２号橋（上）	国道7号	1978	43	36.1	7.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								
84	堅田１号橋（下）	国道7号	1978	43	35.5	7.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅰ						○								
85	撫牛子高架橋（上）	国道7号	1990	31	162.2	10.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
86	撫牛子高架橋（下）	国道7号	1975	46	147.7	8.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○					□				支承補修
87	平川橋（下）	国道7号	1973	48	246.0	9.6	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
88	平川橋（上）	国道7号	1983	38	246.0	10.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
89	腰巻川橋	国道7号	1975	46	15.6	24.1	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								
90	堀越橋（下）	国道7号	1977	44	63.0	12.8	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
91	番所橋	国道7号	1978	43	73.0	11.8	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	当て板補強
92	第１長峰橋	国道7号	1978	43	11.0	9.6	PC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅰ								○						
93	藤崎跨線橋（上）	国道7号	2003	18	13.9	13.0	PC		青森	弘前	青森県	藤崎町	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
94	弘前大橋（上）	国道7号	1980	41	214.5	10.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅱ								○						
95	弘前小橋（上）	国道7号	1980	41	15.7	10.9	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅱ								○						
96	鷹匠橋（上）	国道7号	1979	42	33.8	10.3	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								
97	高田高架橋（下）	国道7号	1988	33	330.0	8.9	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								
98	高田高架橋（上）	国道7号	1989	32	330.0	8.9	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								
99	神田高架橋	国道7号	1990	31	120.0	18.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
100	福島橋	国道7号	1989	32	61.5	17.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	大鰐町	H29	Ⅰ							○							
101	大石橋	国道7号	1963	58	6.4	9.6	PC		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅱ								○			□			断面修復
102	釜石橋	国道7号	1963	58	5.4	9.8	PC		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅱ								○			□			洗掘対策
103	相沢川橋	国道7号	1964	57	7.3	11.5	PC		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅰ								○						
104	第２長峰橋	国道7号	1978	43	4.2	11.8	RC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅰ								○						
105	長峰無名橋	国道7号	1978	43	3.9	12.7	RC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅰ								○						
106	第３長峰橋	国道7号	1978	43	18.7	9.1	PC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H28	Ⅱ						○								
107	六羽川橋	国道7号	1969	52	7.7	25.9	RC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅰ								○						
108	第２小金崎橋	国道7号	1963	58	5.2	9.3	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅱ								○						
109	弘前跨線橋	国道7号	1977	44	12.7	21.9	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
110	新浪岡橋	国道7号	1991	30	104.1	11.3	鋼橋		青森	弘前	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
111	新杉沢橋	国道7号	1994	27	68.4	13.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
112	常浪大橋	国道7号	1996	25	85.4	13.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
113	前田野目ご道橋	E64	1999	22	22.5	10.9	PC		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
114	前田野目川橋	E64	1999	22	22.0	10.9	PC		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
115	隈無ご道橋	E64	2000	21	19.6	10.9	PC		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
116	羽野木沢ご道橋	E64	2000	21	19.9	10.9	PC		青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
117	新井田大橋（下）	国道45号	1988	33	105.8	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
118	新井田大橋（上）	国道45号	1970	51	105.6	9.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
119	塩町第１高架橋	国道45号	1971	50	71.7	7.5	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
120	塩町第２高架橋	国道45号	1971	50	86.3	7.5	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
121	塩町第３高架橋	国道45号	1973	48	72.0	7.5	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
122	塩町第４高架橋	国道45号	1972	49	87.5	7.5	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
123	城下跨道橋（上）	国道45号	1972	49	35.5	7.9	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□					床版補修
124	城下跨道橋（下）	国道45号	1978	43	35.5	8.2	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					当て板補強
125	馬渕大橋（馬淵大橋）（上）	国道45号	1972	49	371.0	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅲ							○		□	□	□			塗替塗装
126	馬渕大橋（馬淵大橋）（下）	国道45号	1978	43	371.0	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅱ							○			□	□			断面修復
127	尻引橋	国道45号	1941	80	34.9	6.5	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
128	幸運橋	国道45号	1953	68	220.0	5.9	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
129	下田跨線橋	国道45号	1965	56	15.3	7.5	PC		青森	八戸	青森県	おいらせ町	H29	Ⅱ							○							
130	長苗代跨線橋	国道104号	1962	59	23.0	8.6	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
131	大橋	国道104号	1997	24	241.6	13.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅱ							○							
132	八木田ご線橋	国道104号	1964	57	27.0	7.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	南部町	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□		□	□	支承取替
133	石堂跨道橋（上）	国道45号	1978	43	52.5	8.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					当て板補強
134	石堂跨道橋（下）	国道45号	1978	43	52.5	8.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					当て板補強
135	市川跨線橋	国道45号	1984	37	166.4	11.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
136	坂牛川橋	国道104号	1986	35	25.3	10.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H28	Ⅲ						○			□					当て板補強
137	櫛引橋	国道104号	1988	33	165.2	13.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
138	大渡橋	国道45号	1969	52	11.4	8.0	PC		青森	八戸	青森県	階上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
139	新井田跨道橋	国道45号	1970	51	8.4	24.5	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
140	類家跨道橋（上）	国道45号	1970	51	13.5	10.0	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
141	類家跨道橋（下）	国道45号	1988	33	13.5	11.0	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
142	犬落瀬溝橋	国道45号	1962	59	11.0	11.4	PC		青森	八戸	青森県	六戸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
143	上田面木橋	国道104号	1965	56	3.5	6.2	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
144	河原木ご道橋（上）	国道45号	1994	27	113.0	8.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅰ							○							
145	河原木ご道橋（下）	国道45号	1999	22	113.0	8.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅰ							○							
146	一の渡橋側道橋（下）	国道4号	1978	43	19.1	1.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
147	枇杷野橋側道橋（上）	国道4号	1978	43	15.7	1.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	野辺地町	H28	Ⅱ						○								
148	枇杷野橋側道橋（下）	国道4号	1980	41	15.7	1.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	野辺地町	H28	Ⅱ						○								
149	小湊橋側道橋（下）	国道4号	1984	37	65.0	1.8	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□				当て板補強
150	小湊側道橋（上）	国道4号	1977	44	66.2	1.6	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□	□				伸縮装置補修
151	山口跨線橋側道橋（下）	国道4号	1984	37	44.5	1.8	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ						○								
152	山口跨線橋側道橋（上）	国道4号	1984	37	44.5	1.8	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ						○								
153	清水川第１号橋（下）	国道4号	1978	43	15.5	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅱ							○							
154	清水川第３号橋（上）	国道4号	1983	38	18.2	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅱ							○							
155	沼館跨線橋側道橋（上）	国道4号	1983	38	30.3	1.4	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	床版防水
156	沼館跨線橋側道橋（下）	国道4号	1992	29	30.0	1.5	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
157	口広橋側道橋（下）	国道4号	1980	41	19.5	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅰ							○							
158	口広橋側道橋（上）	国道4号	1980	41	19.5	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅰ							○							
159	浜子橋側道橋（下）	国道4号	1980	41	12.7	1.8	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
160	浜子橋側道橋（上）	国道4号	1978	43	9.5	1.4	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
161	明神橋側道橋（下）	国道4号	1988	33	17.6	1.4	PC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
162	沖館川歩道橋	国道7号	1975	46	54.7	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
163	西滝川歩道橋	国道7号	1974	47	43.4	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
164	撫牛子高架橋側歩道橋	国道7号	1973	48	25.0	1.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
165	第１長峰橋側歩道橋	国道7号	1991	30	11.7	1.8	PC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅱ								○						
166	大石橋側道橋	国道7号	2003	18	15.0	2.0	PC		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅰ								○						
167	第３長峰橋側歩道橋	国道7号	1991	30	20.4	1.8	PC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H28	Ⅱ						○								
168	第２小金崎橋側歩道橋	国道7号	1965	56	5.2	2.4	RC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅰ								○						
169	尻引橋側道橋（上）	国道45号	1984	37	35.2	1.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
170	尻引橋側道橋（下）	国道45号	1979	42	34.9	1.9	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
171	下田跨線橋側道橋（下）	国道45号	1983	38	30.6	2.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	おいらせ町	H29	Ⅱ							○							
172	長苗代跨線側道橋（上）	国道104号	1985	36	27.2	2.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
173	大渡側道橋（下）	国道45号	1978	43	11.4	2.0	鋼橋		青森	八戸	青森県	階上町	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
174	第１小金崎橋	国道7号	1963	58	2.1	9.9	RC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅱ								○						
175	悪虫跨道橋	国道104号	1971	50	4.8	9.1	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
176	陸橋	国道104号	1962	59	4.8	9.1	RC		青森	八戸	青森県	八戸市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
177	幸運橋側道橋	国道45号	1969	52	220.0	1.7	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				当て板補強
178	ほたて大橋	国道4号	2007	14	410.0	13.0	PC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
179	大開ご道橋（上）	E45	2006	15	54.6	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H28	Ⅱ						○								
180	七戸ご線橋	国道4号	2007	14	21.3	14.4	PC		青森	十和田	青森県	七戸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
181	七戸川橋	国道4号	2007	14	63.9	18.0	鋼橋		青森	十和田	青森県	七戸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
182	野里ご道橋（上）	E64	2003	18	23.9	12.7	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
183	松野木川橋	E64	2003	18	49.5	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
184	米田ご道橋	E64	2005	16	24.7	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
185	天神川橋	E64	2006	15	24.1	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
186	一野坪ご線橋	E64	2005	16	26.7	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
187	太刀打ご道橋	E64	2006	15	55.5	10.4	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
188	青森高架橋（下）	国道7号	2006	15	993.8	12.0	混合橋		青森	青森	青森県	青森市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
189	松館高架橋	E45	2001	20	514.0	10.2	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H30	Ⅱ								○						
190	蟹沢橋	E45	2001	20	35.5	11.9	PC		青森	八戸	青森県	八戸市	H30	Ⅱ								○						
191	第一浅水橋	国道4号	1962	59	13.2	7.5	RC		青森	十和田	青森県	五戸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
192	土場川溝橋	国道4号	1964	57	8.5	15.1	RC		青森	十和田	青森県	野辺地町	H29	Ⅰ								○						
193	角橋	国道4号	1966	55	12.5	7.6	PC		青森	青森	青森県	平内町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
194	釜石橋側道橋（上）	国道7号	1963	58	5.4	4.2	RC		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅰ								○						
195	第２長峰橋側道橋（下）	国道7号	1978	43	6.6	1.1	PC		青森	弘前	青森県	大鰐町	H30	Ⅰ								○						
196	第１小金崎側道橋（上）	国道7号	1963	58	2.1	2.5	RC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅰ								○						
197	大開ご道橋（下）	E45	2007	14	51.6	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H28	Ⅱ						○								
198	大林川橋	国道4号	2010	11	50.6	14.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	七戸町	H29	Ⅰ							○							
199	土場川溝橋側道橋	国道4号	2010	11	16.2	2.0	PC		青森	十和田	青森県	野辺地町	H29	Ⅰ							○							
200	蔵館跨線橋側道橋	国道7号	2010	11	40.0	2.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	大鰐町	H29	Ⅱ							○							
201	清水川大橋側道橋	国道4号	2012	9	68.9	2.0	鋼橋		青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅰ							○							
202	弘前大橋（下）	国道7号	2011	10	214.5	11.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	平川市	H30	Ⅱ								○						
203	弘前小橋（下）	国道7号	2011	10	15.6	11.5	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅰ								○						
204	鷹匠橋（下）	国道7号	2010	11	33.8	11.2	鋼橋		青森	弘前	青森県	弘前市	H30	Ⅰ								○						
205	堀越橋（上）	国道7号	2009	12	63.1	10.5	PC		青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅰ						○								
206	駒込川橋（上）	国道7号	2007	14	112.6	12.3	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
207	赤川橋（上）	国道7号	2007	14	50.0	13.3	鋼橋		青森	青森	青森県	青森市	H30	Ⅰ								○						
208	藤崎跨線橋（下）	国道7号	2003	18	13.9	13.0	PC		青森	弘前	青森県	藤崎町	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
209	柳沢ご道橋	E4A	2011	10	25.9	10.3	PC		青森	十和田	青森県	六戸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
210	小松ヶ丘大橋	E4A	2011	10	167.0	11.5	鋼橋		青森	十和田	青森県	六戸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
211	姉沼川大橋	E4A	2012	9	333.0	12.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	六戸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
212	大沢橋（上）	E4A	2012	9	97.0	9.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
213	大沢橋（下）	E4A	2012	9	83.5	9.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
214	長苗代跨線側道橋（下）	国道104号	2005	16	27.8	2.2	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
215	山田ご道橋（下）	国道7号	2009	12	29.0	10.0	PC		青森	青森	青森県	青森市	H30	Ⅰ								○						
216	野里跨道橋（下）	E64	2003	18	23.9	10.8	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H30	Ⅱ								○						
217	田面木跨道橋	E45	2013	8	46.0	10.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
218	笹原大橋	E45	2013	8	250.0	10.3	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
219	新井田川橋	E45	2008	13	142.0	9.5	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
220	八戸ＪＣＴＤランプ橋	E45	2014	7	109.5	5.1	鋼橋		青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
221	明土ボックス	国道4号	1980	41	6.0	16.5	–	○	青森	十和田	青森県	南部町	H29	Ⅱ								○						
222	毛無森ボックス	国道4号	1998	23	2.9	18.0	–	○	青森	十和田	青森県	五戸町	H29	Ⅰ								○						
223	扇田ボックス	国道4号	1998	23	2.0	17.0	–	○	青森	十和田	青森県	五戸町	H29	Ⅰ								○						
224	蟹沢ボックス	国道4号	1998	23	2.4	9.5	–	○	青森	十和田	青森県	五戸町	H28	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
225	今熊ボックス	国道4号	1998	23	3.5	17.0	–	○	青森	十和田	青森県	六戸町	H29	Ⅰ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
226	高清水ボックス	国道4号	1998	23	5.0	16.0	－	○	青森	十和田	青森県	十和田市	H29	Ⅰ							○							
227	高清水ボックス	国道4号	1984	37	7.0	22.0	－	○	青森	十和田	青森県	十和田市	H29	Ⅰ							○							
228	千曳跨道橋（ボックス）	国道4号	2000	21	3.4	14.3	－	○	青森	十和田	青森県	東北町	H29	Ⅰ							○							
229	家ノ下タボックス	国道4号	2000	21	3.5	34.0	－	○	青森	十和田	青森県	東北町	H29	Ⅰ							○							
230	八ノ木谷地ボックス	国道4号	1984	37	2.2	15.0	－	○	青森	十和田	青森県	野辺地町	H29	Ⅰ							○							
231	犬落瀬ボックス	E4A	2012	9	10.2	34.0	－	○	青森	十和田	青森県	六戸町	H29	Ⅰ							○							
232	堀切沢ボックス	E4A	2012	9	4.6	28.5	－	○	青森	十和田	青森県	六戸町	H29	Ⅰ							○							
233	堀切沢ボックス	E4A	2012	9	8.0	29.0	－	○	青森	十和田	青森県	六戸町	H29	Ⅰ							○							
234	古橋ボックス	E4A	2012	9	4.6	26.5	－	○	青森	十和田	青森県	六戸町	H29	Ⅰ							○							
235	左ェ門次郎ボックス	国道4号	1963	58	3.0	11.3	－	○	青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
236	薬師道添ボックス	国道4号	1978	43	3.5	11.6	－	○	青森	青森	青森県	平内町	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
237	小沢ボックス	国道4号	1978	43	2.9	12.9	－	○	青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅲ							○					□	□	ひびわれ補修
238	中野家ノ下ボックス	国道4号	1978	43	2.9	13.2	－	○	青森	青森	青森県	平内町	H29	Ⅰ							○							
239	山辺３ボックス	国道4号	1984	37	3.0	30.8	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅲ						○					□	□		ひびわれ補修
240	久栗坂ボックス	国道4号	1984	37	7.5	27.3	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅰ							○							
241	山辺７ボックス	国道4号	1984	37	4.6	25.4	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅰ							○							
242	浜田３ボックス	国道4号	1984	37	4.8	30.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
243	浜田４ボックス	国道4号	1984	37	2.9	33.4	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
244	浜田５ボックス	国道4号	1984	37	2.9	28.4	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H29	Ⅱ							○							
245	浜田６ボックス	国道4号	1984	37	5.8	12.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
246	山王林ボックス	国道4号	1984	37	3.0	30.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
247	大林ボックス	国道4号	1984	37	3.0	33.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
248	清水流ボックス	国道4号	1984	37	2.9	27.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
249	池上ボックス	国道4号	1984	37	3.0	27.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
250	弥生田ボックス	国道4号	1984	37	3.5	32.9	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
251	長島ボックス	国道4号	1984	37	3.2	36.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
252	山本ボックス	国道7号	1988	33	3.5	22.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
253	土筆山１ボックス	国道7号	1988	33	3.5	20.3	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
254	平岡ボックス	国道7号	1983	38	9.5	28.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
255	山田７ボックス	国道7号	1975	46	5.1	31.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
256	山田８ボックス	国道7号	1975	46	3.0	33.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅲ		R2	Ⅰ		○						□			ひびわれ補修
257	山田９ボックス	国道7号	1975	46	4.0	47.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
258	福田ボックス	国道7号	1975	46	3.5	36.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
259	沢部３ボックス	国道7号	1983	38	6.0	45.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
260	三内ボックス	国道7号	1983	38	7.5	38.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
261	丸山ボックス	国道7号	1983	38	7.5	31.7	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅲ		R2	Ⅲ		○						□			ひびわれ補修
262	稲森ボックス	国道7号	1983	38	2.3	28.5	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
263	常磐２ボックス	国道7号	1983	38	6.9	20.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
264	今井ボックス	国道7号	1983	38	2.3	31.2	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
265	藤戸ボックス	国道7号	1983	38	2.3	16.0	－	○	青森	青森	青森県	青森市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
266	西碇ヶ関山ボックス	国道7号	1980	41	4.3	12.0	－	○	青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
267	湯ノ沢ボックス	国道7号	1980	41	2.4	9.9	－	○	青森	弘前	青森県	大鰐町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
268	竹原橋（ボックス）	国道7号	1980	41	3.5	22.2	－	○	青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
269	竹内橋（ボックス）	国道7号	1980	41	4.6	35.0	－	○	青森	弘前	青森県	平川市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
270	柳田橋（ボックス）	国道7号	1980	41	5.6	28.7	－	○	青森	弘前	青森県	弘前市	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
271	梨ノ木ボックス	国道7号	1997	24	3.0	26.6	－	○	青森	弘前	青森県	藤崎町	H28	Ⅰ						○								
272	岩崎ボックス	国道7号	1997	24	3.9	15.5	－	○	青森	弘前	青森県	藤崎町	H28	Ⅱ						○								
273	前田ボックス	国道7号	1997	24	6.7	50.0	－	○	青森	弘前	青森県	藤崎町	H28	Ⅱ						○								
274	常磐１ボックス	国道7号	1985	36	6.0	42.0	－	○	青森	弘前	青森県	藤崎町	H28	Ⅱ						○								
275	平野ボックス	国道7号	1994	27	4.6	30.0	－	○	青森	弘前	青森県	青森市	H28	Ⅱ						○								
276	徳才子ボックス	国道7号	2004	17	5.6	33.6	－	○	青森	弘前	青森県	青森市	H28	Ⅲ						○				□				ひびわれ補修
277	大釈迦ボックス	E64	2004	17	4.6	34.0	－	○	青森	弘前	青森県	青森市	H28	Ⅰ						○								
278	吉野田ボックス	E64	2002	19	8.0	27.0	－	○	青森	弘前	青森県	青森市	H28	Ⅰ						○								
279	隠川ボックス	E64	2004	17	4.6	16.1	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
280	持子沢ボックス	E64	2002	19	9.0	22.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
281	志多ボックス	E64	2004	17	6.0	26.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
282	原子ボックス	E64	2002	19	8.3	35.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
283	俵元１ボックス	E64	2002	19	8.0	26.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
284	俵元２ボックス	E64	2002	19	8.0	26.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
285	田子ノ浦ボックス	E64	2004	17	6.0	25.6	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
286	福山ボックス	E64	2002	19	8.6	27.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
287	里山１ボックス	E64	2007	14	10.8	27.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
288	野里１ボックス	E64	2007	14	8.5	23.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
289	野里２ボックス	E64	2007	14	7.3	16.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
290	富草ボックス	E64	2004	17	5.3	16.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
291	里山２ボックス	E64	2007	14	10.3	16.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅰ						○								
292	稲村ボックス	E64	2011	10	5.3	15.0	－	○	青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
293	横沢跨道橋（ボックス）	国道45号	1970	51	5.0	10.5	－	○	青森	八戸	青森県	階上町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
294	明戸ボックス	国道45号	1982	39	2.5	48.2	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
295	日渡ボックス	国道45号	1982	39	2.6	26.9	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
296	簀子渡ボックス	国道45号	1982	39	5.0	25.0	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
297	川原木ボックス	国道45号	1997	24	12.3	25.0	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
298	瓢ボックス	国道45号	1982	39	2.4	14.0	－	○	青森	八戸	青森県	おいらせ町	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
299	五人役ボックス	国道45号	1982	39	2.4	16.5	－	○	青森	八戸	青森県	六戸町	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
300	鳥喰谷地ボックス	国道45号	1982	39	2.4	32.3	－	○	青森	八戸	青森県	六戸町	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
301	下谷地ボックス	E45	2011	10	6.0	24.6	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
302	花生ボックス	E45	2005	16	5.0	25.3	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
303	大開ボックス	E45	2005	16	6.4	26.4	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
304	美保野１ボックス	E45	2007	14	7.0	14.0	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
305	美保野２ボックス	E45	2007	14	5.0	13.5	－	○	青森	八戸	青森県	八戸市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
306	倉前東ボックス	E45	2007	14	5.2	16.0	－	○	青森	八戸	青森県	階上町	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
307	柳川こ道橋	E64	2007	14	37.0	11.6	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
308	望橋	E64	2013	8	97.9	14.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
309	奥津軽大橋	E64	2013	8	496.0	11.3	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H28	Ⅱ						○								
310	つがる跨線橋	E64	2013	8	139.0	10.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	五所川原市	H29	Ⅱ							○							
311	野辺地跨線橋側道橋	国道4号	2014	7	40.0	2.0	鋼橋		青森	十和田	青森県	野辺地町	H28	Ⅰ						○								
312	鳴沢こ線橋	E64	2016	5	108.0	10.5	鋼橋		青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅱ							○							
313	南浮田こ道橋	E64	2016	5	48.6	12.0	鋼橋		青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅱ							○							
314	兼草ボックス	E64	2013	8	9.7	29.2	－	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							
315	早田１ボックス	E64	2014	7	5.5	16.6	－	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
316	早田２ボックス	E64	2014	7	7.9	16.0	–	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							
317	金沢街道ノ沢ボックス	E64	2014	7	4.0	16.7	–	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							
318	早田４ボックス	E64	2014	7	5.5	37.3	–	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							
319	ランプボックス	E64	2014	7	9.0	17.2	–	○	青森	弘前	青森県	鰺ヶ沢町	H29	Ⅰ							○							
320	角橋側歩道橋	国道4号	2012	9	15.0	2.8	PC		青森	青森	青森県	平内町				R1	Ⅰ	○										
321	砂土路川橋（上）	E4A	2015	6	39.3	11.2	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
322	砂土路川橋（下）	E4A	2015	6	39.3	11.2	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
323	手長橋（上）	E4A	2018	3	43.5	7.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
324	手長橋（下）	E4A	2018	3	43.5	7.7	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
325	手長Ｂランプ橋	E4A	2018	3	49.5	6.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅱ		○									
326	手長Ｄランプ橋	E4A	2018	3	47.0	6.4	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
327	新七戸川橋	E4A	2015	6	69.3	12.6	鋼橋		青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
328	洞内橋	国道4号	2018	3	23.0	14.3	鋼橋		青森	十和田	青森県	十和田市				R2	Ⅰ		○									
329	上北天間林道路３号ボックス	E4A	2014	7	7.1	28.4	–	○	青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
330	上北天間林道路５号ボックス	E4A	2015	6	5.7	20.8	–	○	青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
331	上北天間林道路７号ボックス	E4A	2014	7	5.9	21.6	–	○	青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
332	上北天間林道路９号ボックス	E4A	2014	7	5.7	20.4	–	○	青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
333	上北天間林道路１０号ボックス	E4A	2017	4	7.7	35.6	–	○	青森	十和田	青森県	東北町				R2	Ⅰ		○									
334	上北天間林道路１４号ボックス	E4A	2016	5	7.5	19.4	–	○	青森	十和田	青森県	七戸町				R2	Ⅰ		○									
335	上長下跨道橋	国道4号	不明	–	30.8	3.3	鋼橋		青森	五戸町	青森県	五戸町				R2	Ⅱ		○									
336	好地ご道橋	国道4号	1974	47	12.0	22.1	PC		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
337	山吹川橋	国道4号	1988	33	11.1	19.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
338	高田橋	国道4号	1973	48	11.4	22.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	矢巾町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
339	加賀野跨道橋	国道4号	1969	52	9.6	17.9	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
340	芦名橋	国道4号	1962	59	9.4	8.5	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅲ	床版補修	R2	Ⅱ		○									
341	戈津橋	国道4号	1930	91	6.0	9.4	RC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H29	Ⅲ	断面修復						○							
342	南大橋	国道4号	1966	55	230.8	18.2	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
343	東大橋	国道4号	1968	53	76.0	22.0	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□					伸縮装置補修
344	北山跨線橋	国道4号	1969	52	42.7	22.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
345	北大橋	国道4号	1967	54	68.0	18.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○								
346	茨島跨線橋（上）	国道4号	2001	20	238.5	10.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
347	茨島跨線橋（下）	国道4号	2000	21	226.5	10.5	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
348	滝名川橋（上）	国道4号	1980	41	63.8	9.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H28	Ⅱ						○								
349	滝名川橋（下）	国道4号	1986	35	63.8	9.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H28	Ⅲ						○			□	□				支承取替
350	三枚橋	国道4号	1997	24	42.6	20.0	PC		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H29	Ⅰ							○							
351	五内川橋（上）	国道4号	1980	41	48.8	9.5	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H30	Ⅱ								○						
352	五内川橋（下）	国道4号	1989	32	48.8	9.5	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	紫波町	H30	Ⅰ								○						
353	滝沢橋	国道4号	1971	50	27.1	19.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅱ						○								
354	石鳥谷南ご線橋（上）	国道4号	1973	48	121.4	10.0	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅲ								○		□				床版補修
355	石鳥谷北ご線橋（上）	国道4号	1974	47	32.0	10.2	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅰ	支承補修					○								
356	葛丸川橋（上）	国道4号	1974	47	47.6	10.2	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅲ	断面修復							○		□				床版補修
357	耳取橋	国道4号	1957	64	16.7	19.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅱ						○								
358	船田橋	国道4号	1983	38	61.9	16.1	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
359	松島橋	国道4号	1975	46	40.0	9.2	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	滝沢市	H30	Ⅲ								○			□			床版補修
360	滝沢跨道橋（下）	国道4号	1992	29	20.2	16.5	PC		岩手	盛岡	岩手県	滝沢市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
361	見前橋	国道4号	1959	62	20.5	8.7	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
362	川口跨線橋	国道4号	1985	36	32.9	9.7	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ	ひびわれ補修					○								
363	川口南大橋	国道4号	1984	37	64.1	17.1	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○								□	ひびわれ補修
364	川口北大橋	国道4号	1984	37	57.5	13.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅰ						○									
365	丹藤橋	国道4号	1957	64	41.1	7.7	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H29	Ⅲ							○		□						支承補修
366	新田橋	国道4号	1957	64	14.8	8.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
367	河原橋	国道4号	1957	64	15.0	8.2	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○								
368	新末代橋	国道4号	1970	51	40.0	10.8	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
369	沼宮内跨線橋	国道4号	1973	48	40.0	11.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H29	Ⅱ							○							
370	新民部田橋	国道4号	1974	47	23.7	11.3	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□					床版補修
371	田頭橋	国道4号	1930	91	10.2	8.1	RC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H30	Ⅱ							○							架替
372	水堀橋	国道4号	1964	57	13.0	8.3	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○				□				洗掘対策
373	門沢橋	国道4号	1929	92	4.5	10.8	RC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○								
374	御堂橋	国道4号	1928	93	9.0	8.5	RC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅲ						○			□					床版補修
375	中山跨線橋（南）	国道4号	1966	55	10.4	8.8	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
376	中山跨線橋（北）	国道4号	1959	62	12.4	8.8	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅱ		R2	Ⅲ		○							□		表面保護
377	西田子ご線橋	国道4号	1963	58	17.2	7.7	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅱ							○					□		表面保護
378	田子橋	国道4号	1952	69	7.0	9.9	RC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅲ						○			□					床版補修
379	小繋ご線橋	国道4号	1965	56	143.1	8.2	混合橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H27	Ⅱ	床版防水	R1	Ⅲ	○								□		断面修復
380	笹目子橋	国道4号	1983	38	30.8	13.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	当て板補強
381	笹目子溝橋	国道4号	1985	36	17.7	13.5	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅰ						○								
382	新滝見橋	国道4号	1984	37	70.0	13.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
383	道地橋	国道4号	1964	57	16.0	10.2	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
384	子守橋	国道4号	1979	42	70.1	12.5	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H30	Ⅱ								○	□					伸縮装置補修
385	小井田橋	国道4号	1964	57	16.9	9.2	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅱ							○							
386	鳥越ご線橋	国道4号	1964	57	49.2	9.3	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅱ							○							
387	馬仙大橋	国道4号	1979	42	252.0	11.0	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H30	Ⅱ	床版補修							○						
388	福岡跨線橋	国道4号	1980	41	31.3	12.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
389	日金橋	国道4号	1976	45	210.0	10.3	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H30	Ⅰ								○						
390	沢内橋	国道4号	1979	42	24.0	17.4	PC		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
391	十文字橋	国道4号	1978	43	90.0	11.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H30	Ⅱ	床版補修							○						
392	金田一大橋	国道4号	1983	38	126.0	14.3	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
393	平糠川橋	国道4号	1998	23	17.0	11.8	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
394	姉滝大橋	国道4号	2002	19	146.0	14.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H29	Ⅱ							○							
395	中堰橋	国道4号	1978	43	24.2	9.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ							○							
396	真柴ご線橋	国道4号	1978	43	75.8	10.3	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	一関市	H30	Ⅲ								○	□	□				床版補修
397	柳沢高架橋	国道4号	1978	43	156.6	10.3	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	一関市	H30	Ⅱ								○		□	□			床版補修
398	一関大橋	国道4号	1976	45	252.2	10.1	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	一関市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					床版補修
399	大平橋（ご道橋）	国道4号	1974	47	12.5	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□				断面修復
400	笹谷橋	国道4号	1974	47	21.7	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H30	Ⅱ								○						
401	徳沢橋（下）	国道4号	1977	44	23.3	8.3	PC		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H29	Ⅲ							○		□	□				支承補修
402	白鳥橋	国道4号	1950	71	40.0	8.6	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
403	前沢南跨線橋	国道4号	1971	50	148.5	11.4	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					床版補修
404	岩堰橋	国道4号	1972	49	40.3	12.8	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
405	前沢北跨線橋	国道4号	1972	49	40.8	13.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
406	丑沢橋	国道4号	1972	49	18.7	12.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅲ	床版防水						○						□	当て板補強
407	寺領橋	国道4号	1972	49	4.4	17.7	RC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
408	明後沢橋	国道4号	1962	59	18.8	9.3	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
409	松ノ木沢橋	国道4号	1959	62	20.1	8.3	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
410	新折居橋	国道4号	1959	62	13.5	9.1	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○							
411	大深沢橋	国道4号	1957	64	9.0	8.3	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅲ							○						□	塗替塗装
412	堤尻橋	国道4号	1963	58	7.3	12.6	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ							○							
413	志田美沢橋	国道4号	1954	67	5.3	9.5	RC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ							○							
414	水沢南跨線橋	国道4号	1969	52	88.6	10.0	混合橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ						○								
415	片子沢橋	国道4号	1967	54	14.6	11.2	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅲ	伸縮装置補修	R1	Ⅱ	○										
416	溝橋	国道4号	1967	54	4.5	13.0	RC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ						○								
417	乙女川橋	国道4号	1967	54	15.0	12.0	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
418	香原川橋	国道4号	1967	54	11.5	19.3	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
419	二枚橋川橋	国道4号	1979	42	7.0	13.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□					断面修復
420	金ヶ崎跨線橋	国道4号	1979	42	21.9	12.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ						○								
421	佐倉河跨道橋	国道4号	1979	42	19.6	9.0	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
422	北堰橋（下）	国道4号	1979	42	22.4	5.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅰ							○							
423	北堰橋（上）	国道4号	1979	42	23.5	8.7	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ							○							
424	金ヶ崎大橋	国道4号	1976	45	334.5	10.5	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□	□	□		床版補修
425	下庄溝橋	国道4号	1979	42	13.2	10.8	PC		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
426	新開橋	国道4号	1978	43	9.5	31.1	RC		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
427	餅田橋	国道4号	1979	42	50.0	10.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H30	Ⅱ							○							
428	餅田跨道橋	国道4号	1978	43	11.7	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
429	渋川橋	国道4号	1959	62	13.5	8.1	PC		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H29	Ⅱ							○							
430	大松沢跨道橋	国道4号	1973	48	11.4	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
431	小関沢橋	国道4号	1973	48	6.3	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H30	Ⅰ							○							
432	大関沢橋	国道4号	1973	48	11.4	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
433	平林跨道橋	国道4号	1973	48	9.4	9.0	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
434	笊渕橋	国道4号	1973	48	26.6	19.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
435	和賀大橋	国道4号	1969	52	515.0	20.1	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ							○							
436	黒沢尻跨線橋	国道4号	1971	50	11.4	16.0	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ	床版補修	R2	Ⅰ		○									
437	黒沢川橋	国道4号	1985	36	19.9	20.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅰ	○										
438	飯豊橋	国道4号	1955	66	33.0	7.8	RC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ							○							架替
439	祇園橋	国道4号	1985	36	63.0	11.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H28	Ⅱ						○								
440	平泉南ご線橋	国道4号	1986	35	105.5	10.5	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H29	Ⅱ						○								
441	新太田川橋	国道4号	1987	34	110.0	10.5	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H29	Ⅲ	支承補修						○							
442	銀河大橋（花巻北大橋）	国道4号	2002	19	532.0	11.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H29	Ⅲ	当て板補強						○			□				亀裂補修
443	西大橋	国道46号	1990	31	442.1	10.5	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H29	Ⅱ							○							
444	取染橋	国道46号	1995	26	21.8	11.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅰ							○							
445	赤渕ご線橋	国道46号	1960	61	25.6	6.3	RC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									□	断面修復
446	安栖橋	国道46号	2002	19	30.5	14.5	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
447	新竜川橋	国道46号	1972	49	35.1	8.2	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅰ	断面修復						○							
448	大平橋	国道46号	1972	49	51.3	9.2	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□	□				部材交換
449	下荒沢橋	国道46号	1972	49	30.2	9.1	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□					塗替塗装
450	下竜川橋	国道46号	1972	49	101.0	8.7	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅲ	床版補修						○							

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
451	上竜川橋	国道46号	1972	49	70.0	8.2	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
452	下鹿倉橋	国道46号	1972	49	73.0	8.2	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
453	下晩鳥橋	国道46号	1973	48	65.0	8.2	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅲ	床版補修					○								
454	竜川陸橋	国道46号	1973	48	34.5	6.4	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□					伸縮装置取替
455	片桟橋	国道46号	1973	48	20.0	4.1	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅰ	ひびわれ補修							○						
456	竜川第２陸橋	国道46号	1973	48	83.0	8.2	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅲ	支承補修					○								
457	黒沢川橋	国道46号	1978	43	22.5	20.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅱ						○								
458	新葛根田橋	国道46号	1981	40	190.0	13.3	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅱ								○						
459	春木場ご線橋	国道46号	1981	40	37.5	13.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H27	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
460	仁沢瀬橋	国道46号	1991	30	21.2	25.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	滝沢市	H29	Ⅰ							○							
461	明神下橋	国道46号	2001	20	100.7	14.5	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
462	舟原橋	国道46号	2001	20	48.5	14.5	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
463	板橋	国道46号	1957	64	4.4	8.4	RC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○								
464	七ッ森橋	国道46号	1958	63	6.3	8.5	RC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅱ							○							
465	雫石ご線橋	国道46号	1979	42	12.5	16.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
466	和野川溝橋	国道46号	1982	39	11.5	15.8	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅰ	断面修復							○						
467	和野川側道橋	国道46号	1982	39	11.5	2.8	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅰ								○						
468	山津田橋	国道46号	1961	60	3.6	10.8	RC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
469	竜川溝橋	国道46号	1973	48	14.0	11.4	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
470	芦名橋側道橋（上）	国道4号	1962	59	15.1	1.5	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
471	芦名橋側道橋（下）	国道4号	1962	59	15.0	2.0	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
472	戈津橋側道橋（上）	国道4号	1956	65	8.8	0.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H29	Ⅰ							○							
473	戈津橋側道橋（下）	国道4号	1985	36	8.8	1.7	RC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H29	Ⅰ							○							
474	川口跨線橋側歩道橋（上）	国道4号	1985	36	32.9	2.3	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ	断面修復					○								
475	丹藤橋側歩道橋（下）	国道4号	1979	42	45.0	1.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H29	Ⅲ							○					□	□	支承補修
476	丹藤橋側歩道橋（上）	国道4号	1985	36	45.0	2.0	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H29	Ⅰ							○							
477	新田橋々側歩道橋（下）	国道4号	1980	41	25.6	2.0	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
478	河原橋々側歩道橋（下）	国道4号	1981	40	22.8	1.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅰ						○								
479	田頭橋々側歩道橋（下）	国道4号	1977	44	13.0	1.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H30	Ⅱ								○						架替
480	田頭橋々側歩道橋（上）	国道4号	2008	13	13.0	1.9	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H30	Ⅰ								○						架替
481	水堀橋側歩道橋（下）	国道4号	1987	34	13.3	1.4	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅰ						○								
482	水堀橋側歩道橋（上）	国道4号	1987	34	12.6	1.4	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○				□				洗掘対策
483	門沢橋々側歩道橋（下）	国道4号	1987	34	7.6	1.4	RC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅱ						○								
484	御堂橋々側歩道橋（上）	国道4号	1984	37	16.9	1.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅰ						○								
485	御堂橋々側歩道橋（下）	国道4号	2002	19	10.2	1.9	PC		岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅰ						○								
486	中山跨線橋側歩道橋（下）	国道4号	1982	39	48.0	1.4	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
487	田子橋々側歩道橋（上）	国道4号	1958	63	7.0	1.4	PC		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H28	Ⅰ						○								
488	小井田橋々側歩道橋（下）	国道4号	1977	44	16.9	2.0	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅱ							○							
489	小井田橋々側歩道橋（上）	国道4号	2010	11	19.6	1.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅱ							○							
490	鳥越ご線橋側歩道橋（下）	国道4号	1983	38	65.5	1.8	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅰ							○							
491	白鳥橋側歩道橋（上）	国道4号	1967	54	40.0	5.8	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅲ	断面修復					○								
492	明後沢橋側歩道橋（下）	国道4号	1973	48	18.9	1.9	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
493	明後沢橋側歩道橋（上）	国道4号	1982	39	22.2	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
494	松の木沢橋側歩道橋（下）	国道4号	1973	48	20.0	1.8	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○								□	床版取替
495	松の木沢橋側歩道橋（上）	国道4号	1982	39	22.5	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
496	新折居橋側歩道橋（下）	国道4号	1982	39	13.5	1.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○							
497	新折居橋側歩道橋（上）	国道4号	1982	39	13.5	1.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○							
498	大深沢橋側歩道橋（下）	国道4号	1986	35	9.0	1.9	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○							
499	大深沢橋側歩道橋（上）	国道4号	1986	35	9.0	1.4	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ							○							
500	堤尻橋側歩道橋（上）	国道4号	1986	35	9.2	1.1	RC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅲ							○						□	洗掘対策
501	志田美沢橋側歩道橋（下）	国道4号	1986	35	5.3	1.2	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○							
502	志田美沢橋側歩道橋（上）	国道4号	1983	38	6.1	1.8	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅱ							○							
503	水沢南橋側歩道橋（下）	国道4号	1988	33	133.3	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ						○								
504	水沢南橋側歩道橋（上）	国道4号	1983	38	93.9	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ						○								
505	片子沢橋側歩道橋（下）	国道4号	1986	35	18.4	1.4	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
506	片子沢橋側歩道橋（上）	国道4号	1984	37	18.4	1.4	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
507	乙女川橋歩道橋（下）	国道4号	1985	36	15.0	2.7	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ						○								
508	乙女川橋歩道橋（上）	国道4号	1985	36	15.0	2.7	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
509	中堰橋々側歩道橋（下）	国道4号	1978	43	24.2	3.0	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ							○							
510	渋川橋々側歩道橋（下）	国道4号	1977	44	18.0	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H29	Ⅱ							○							架替
511	渋川橋々側歩道橋（上）	国道4号	1982	39	18.0	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H29	Ⅲ							○							架替
512	黒沢尻橋側歩道橋（下）	国道4号	1984	37	22.5	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
513	黒沢尻橋側歩道橋（上）	国道4号	1984	37	25.0	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
514	飯豊橋々側歩道橋（下）	国道4号	1977	44	37.5	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ							○							架替
515	飯豊橋々側歩道橋（上）	国道4号	1982	39	37.5	2.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	北上市	H29	Ⅱ							○							架替
516	赤渕橋側歩道橋	国道46号	1983	38	32.0	2.0	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
517	七ッ森橋側歩道橋（下）	国道46号	2000	21	10.0	2.0	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅰ							○							
518	下山井大橋	国道4号	2002	19	160.0	14.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	二戸市	H28	Ⅱ						○								
519	滝沢跨道橋（上）	国道4号	1992	29	17.6	18.0	PC		岩手	盛岡	岩手県	滝沢市	H29	Ⅱ							○							
520	見前橋拡幅橋（下）	国道4号	1974	47	20.5	5.1	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
521	見前橋拡幅橋（上）	国道4号	1974	47	20.5	7.0	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
522	徳沢橋（上）	国道4号	1977	44	23.3	18.0	PC		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H29	Ⅲ							○		□	□				支承補修
523	十文字跨道橋	国道4号	1995	26	36.0	8.8	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
524	小遣橋	国道4号	2001	20	31.7	9.2	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
525	富堂跨道橋	国道4号	2001	20	19.0	13.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ							○							
526	沢田ご道橋	国道4号	1997	24	14.5	16.5	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H29	Ⅱ							○							
527	仙人跨道橋	国道4号	1997	24	40.0	8.8	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ						○								
528	似内跨道橋	国道4号	1999	22	24.4	11.8	PC		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H29	Ⅱ							○							
529	花巻東跨線橋	国道4号	2001	20	55.5	15.2	PC		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H27	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□						断面修復
530	平林跨道橋側道橋（下）	国道4号	2003	18	9.4	2.0	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
531	平林跨道橋側道橋（上）	国道4号	2003	18	9.4	2.0	PC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
532	板橋側歩道橋（上）	国道46号	1983	38	7.1	1.3	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅱ						○								
533	板橋側歩道橋（下）	国道46号	1983	38	5.0	1.4	PC		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○								
534	七ッ森橋側歩道橋（上）	国道46号	1984	37	10.5	2.0	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H29	Ⅰ							○							
535	新衣川橋	国道4号	2006	15	146.6	12.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									□	塗替塗装
536	平泉北ご線橋	国道4号	2008	13	117.0	12.0	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	平泉町	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
537	花巻南ご線橋	国道4号	2008	13	24.5	12.4	PC		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
538	花巻南大橋（銀河南大橋）	国道4号	2008	13	499.0	12.2	鋼橋		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
539	新稲荷橋	国道4号	2007	14	75.0	13.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
540	有田橋	国道4号	1988	33	5.5	12.0	RC		岩手	水沢	岩手県	北上市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
541	境橋	国道4号	1957	64	8.1	8.7	PC		岩手	水沢	岩手県	花巻市	H30	Ⅱ							○						
542	長渡ご道橋	国道4号	2001	20	18.7	13.4	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H30	Ⅱ							○						
543	新竜川橋側道橋（下）	国道46号	2007	14	36.9	1.6	鋼橋		岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H30	Ⅰ							○						
544	堤尻橋側歩道橋（下）	国道4号	1977	44	9.2	1.1	PC		岩手	水沢	岩手県	奥州市	H30	Ⅰ							○						
545	野中橋	国道4号	2010	11	48.6	13.5	鋼橋		岩手	二戸	岩手県	一戸町	H29	Ⅰ						○							
546	石鳥谷南ご線橋（下）	国道4号	2012	9	135.0	9.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅰ							○						
547	石鳥谷北ご線橋（下）	国道4号	2012	9	32.0	9.3	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅰ						○							
548	猿ヶ石川橋	E46	2009	12	222.6	8.3	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
549	毒沢橋	E46	2009	12	23.8	9.5	PC		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅲ		R1	Ⅰ	○					□				ひびわれ補修
550	滝川橋	E46	2009	12	36.6	9.5	PC		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○									
551	倉沢橋	E46	2009	12	122.0	8.3	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
552	田瀬橋	E46	2010	11	396.0	8.3	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
553	明神橋	E46	2008	13	76.0	8.3	RC		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
554	白土川橋	E46	2009	12	200.6	8.3	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	花巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
555	深沢橋	E46	2011	10	62.0	8.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
556	猿ヶ石橋	E46	2011	10	25.9	9.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
557	小友川橋	E46	2011	10	270.0	8.3	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
558	葛丸川橋（下）	国道4号	2010	11	47.6	8.7	鋼橋		岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H30	Ⅱ							○						
559	萩荘ボックス	国道4号	1979	42	7.2	25.8	–	○	岩手	水沢	岩手県	一関市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
560	下中田第１ボックス	国道4号	1979	42	4.6	21.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	一関市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
561	下中田第２ボックス	国道4号	1979	42	4.5	19.3	–	○	岩手	水沢	岩手県	一関市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
562	中町第１ボックス	国道4号	1976	45	4.0	20.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	一関市	H28	Ⅰ						○							
563	寺前第１ボックス	国道4号	1975	46	5.0	18.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	一関市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
564	南塔ケ崎第１ボックス	国道4号	1972	49	2.1	14.5	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅲ		○								□ ひびわれ補修
565	立石第１ボックス	国道4号	1972	49	3.6	3.6	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
566	古城ボックス	国道4号	1972	49	7.6	17.5	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
567	神明ボックス	国道4号	2005	16	8.0	42.9	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ						○							
568	宝龍田ボックス	国道4号	2005	16	7.0	16.7	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
569	慶徳ボックス	国道4号	1970	51	4.0	17.6	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
570	東袖ノ目１ボックス	国道4号	2001	20	7.0	17.6	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
571	東袖ノ目２ボックス	国道4号	2001	20	9.0	35.7	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
572	百目木第１ボックス	国道4号	2005	16	5.2	36.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
573	竈堂ボックス	国道4号	1959	62	5.3	40.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
574	白坂井第１ボックス	国道4号	2005	16	5.4	47.4	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
575	大曾根ボックス	国道4号	2001	20	6.0	32.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
576	竈神ボックス	国道4号	2001	20	6.0	20.7	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
577	窯神ボックス	国道4号	2001	20	4.5	21.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	奥州市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
578	下庄第１ボックス	国道4号	1981	40	4.0	30.4	–	○	岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
579	下庄第２ボックス	国道4号	1981	40	4.3	27.5	–	○	岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
580	下庄第３ボックス	国道4号	1981	40	4.3	26.5	–	○	岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
581	南野中ボックス	国道4号	1962	59	4.0	29.7	–	○	岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H28	Ⅰ						○							
582	餅田ボックス	国道4号	1962	59	4.0	31.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	金ケ崎町	H28	Ⅰ						○							
583	有田町ボックス	国道4号	1968	53	4.2	21.4	–	○	岩手	水沢	岩手県	北上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
584	柳原５丁目ボックス	国道4号	1968	53	3.0	41.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	北上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
585	南城ボックス	国道4号	1968	53	5.0	13.0	–	○	岩手	水沢	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
586	高木第２６地割ボックス	国道4号	1964	57	5.5	28.0	－	○	岩手	水沢	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
587	高木４ボックス	国道4号	1970	51	7.5	30.6	－	○	岩手	水沢	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
588	下似内１ボックス	国道4号	1970	51	21.2	38.5	－	○	岩手	水沢	岩手県	花巻市	H28	Ⅱ						○							
589	下似内２ボックス	国道4号	1970	51	8.5	37.5	－	○	岩手	水沢	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
590	中寺林第３地割ボックス	国道4号	1976	45	3.0	22.5	－	○	岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							
591	中寺林第８地割ボックス	国道4号	1976	45	5.0	23.4	－	○	岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅱ						○							
592	中寺林第５地割ボックス	国道4号	1976	45	3.0	24.5	－	○	岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							
593	好地第５地割ボックス	国道4号	1976	45	3.0	22.6	－	○	岩手	盛岡	岩手県	花巻市	H28	Ⅱ						○							
594	東仙北ボックス	国道4号	1976	45	6.0	21.5	－	○	岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅰ						○							
595	加賀野第１ボックス	国道4号	1968	53	3.1	20.0	－	○	岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅲ	断面修復					○							
596	加賀野第２ボックス	国道4号	1968	53	8.4	19.2	－	○	岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅰ						○							
597	愛宕町ボックス	国道4号	1968	53	3.5	19.5	－	○	岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
598	砂込ボックス	国道4号	1962	59	3.0	8.8	－	○	岩手	盛岡	岩手県	滝沢市	H28	Ⅰ						○							
599	五日市ボックス	国道4号	1974	47	2.0	15.5	－	○	岩手	二戸	岩手県	岩手町	H28	Ⅲ	断面修復					○							
600	藤島ＢＯＸ	国道4号	1963	58	5.1	14.6	－	○	岩手	二戸	岩手県	二戸市	H28	Ⅰ						○							
601	小井田ボックス	国道4号	1982	39	4.0	29.3	－	○	岩手	二戸	岩手県	二戸市	H28	Ⅱ						○							
602	米沢地下道	国道4号	1981	40	3.0	14.5	－	○	岩手	二戸	岩手県	二戸市	H28	Ⅰ						○							
603	前潟ボックス	国道46号	1992	29	5.0	47.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅰ						○							
604	蔵戸ボックス	国道46号	1994	27	6.0	30.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
605	蔵戸ボックス	国道46号	1992	29	4.0	29.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅰ						○							
606	蔵戸前ボックス	国道46号	1992	29	5.0	41.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
607	宮台ボックス	国道46号	1992	29	6.0	42.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
608	太田地下道	国道46号	1992	29	3.0	43.4	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
609	向中野地下道	国道46号	1992	29	3.1	18.4	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
610	久保筋ボックス	国道46号	1999	22	6.1	27.9	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
611	稲荷前第１地下道	国道46号	1979	42	3.0	10.9	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
612	稲荷前第２地下道	国道46号	1979	42	3.0	19.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
613	稲荷前第３地下道	国道46号	1979	42	3.0	10.6	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○							
614	日向地下道	国道46号	1991	30	2.4	32.5	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	滝沢市	H28	Ⅱ						○							
615	塩ヶ森ボックス	国道46号	1969	52	4.0	19.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
616	谷地ボックス	国道46号	1979	42	4.0	33.3	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅱ						○							
617	高前田ボックス	国道46号	1979	42	3.0	19.4	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅱ						○							
618	上河原ボックス	国道46号	1982	39	4.5	19.5	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
619	曽利ボックス	国道46号	1982	39	3.5	20.3	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
620	中野ボックス	国道46号	1982	39	5.0	31.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅱ						○							
621	上野中野ボックス	国道46号	1973	48	7.0	11.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
622	安栖野ボックス	国道46号	1972	49	4.0	17.5	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
623	明神下ボックス	国道46号	1972	49	5.0	18.0	－	○	岩手	盛岡西	岩手県	雫石町	H28	Ⅰ						○							
624	安俵ボックス	E46	2012	9	9.0	28.6	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							
625	安俵６区ボックス	E46	2012	9	7.9	14.6	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
626	落合ボックス	E46	2012	9	10.3	33.2	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							
627	毒沢１ボックス	E46	2012	9	8.5	19.1	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							
628	毒沢１区ボックス	E46	2012	9	6.5	25.5	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
629	毒沢３区ボックス	E46	2012	9	6.0	27.9	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
630	毒沢２ボックス	E46	2012	9	10.0	17.7	－	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
631	毒沢４区ボックス	E46	2012	9	5.7	14.8	–	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
632	毒沢３ボックス	E46	2012	9	8.8	38.5	–	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ						○								
633	大内田第１ボックス	E46	2012	9	5.0	14.6	–	○	岩手	花巻	岩手県	花巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
634	大内田第２ボックス	E46	2012	9	10.6	45.5	–	○	岩手	花巻	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
635	大内田ボックス	E46	2012	9	8.5	26.4	–	○	岩手	花巻	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ						○								
636	札押ボックス	E46	2012	9	17.0	25.6	–	○	岩手	花巻	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ						○								
637	四ツならいボックス	E46	2012	9	5.0	30.9	–	○	岩手	花巻	岩手県	奥州市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
638	姫神橋	国道4号	2015	6	43.4	12.5	PC		岩手	盛岡	岩手県	盛岡市	H28	Ⅱ						○								
639	家老沢橋（下）	E46	2011	10	36.5	20.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H28	Ⅱ						○								
640	中沢川橋	E46	2015	6	141.0	12.7	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H28	Ⅱ						○								
641	鳴沢川橋	E46	2015	6	99.0	12.7	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H28	Ⅱ						○								
642	日影橋	E46	2015	6	22.0	14.4	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市	H28	Ⅰ						○								
643	巣子橋	国道4号	2015	6	12.3	28.8	PC		岩手	盛岡	岩手県	滝沢市	H28	Ⅰ						○								
644	高屋敷堰橋	国道46号	1977	44	7.7	37.1	PC		岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市	H30	Ⅰ							○							
645	Uターン路ボックス	E46	2017	4	5.0	15.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
646	平野原ボックス	E46	2017	4	4.6	20.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
647	平倉2ボックス	E46	2014	7	4.0	20.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
648	平倉1ボックス	E46	2014	7	5.1	21.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
649	来内ボックス	E46	2017	4	4.6	34.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
650	九重沢ボックス	E46	2014	7	4.6	20.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
651	鍋倉ボックス	E46	2017	4	4.6	20.0	–	○	岩手	花巻	岩手県	遠野市				R1	Ⅰ	○										
652	都南中央跨線橋	国道46号	1977	44	413.4	10.0	混合橋		岩手	盛岡西	岩手県	盛岡市				R2	Ⅱ		○								□	床版補修
653	家老沢橋（上）	E46	2011	10	36.5	20.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市								○								
654	新九重沢橋	E46	2018	3	44.0	13.5	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅰ		○									
655	梨ノ木沢橋	E46	2018	3	89.0	13.0	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅱ		○									
656	来内川橋	E46	2017	4	44.0	13.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅰ		○									
657	新来内橋	E46	2016	5	38.0	13.5	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅰ		○									
658	長洞橋	E46	2018	3	96.0	12.0	PC		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅰ		○									
659	平野原橋	E46	2018	3	64.0	19.7	鋼橋		岩手	花巻	岩手県	遠野市				R2	Ⅰ		○									
660	市道中谷地3号線ボックス	国道46号	2013	8	42.9	33.0	RC	○	岩手	花巻	岩手県	盛岡市				R2	Ⅰ		○									
661	大沢橋	国道45号	1969	52	13.5	8.1	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
662	八木沢川橋	国道45号	1990	31	14.1	23.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
663	小成１号橋	国道45号	1970	51	7.2	8.2	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
664	小成２号橋	国道45号	1970	51	8.0	8.2	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
665	小成３号橋	国道45号	1970	51	7.3	8.7	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
666	境橋	国道45号	1970	51	8.4	8.7	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
667	小牛内橋	国道45号	1962	59	8.4	6.3	RC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	断面修復
668	宮古大橋（上）	国道45号	1974	47	308.3	8.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
669	宮古大橋（下）	国道45号	1974	47	296.3	8.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
670	四十八坂橋	国道45号	1968	53	26.1	7.3	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H28	Ⅰ						○								
671	船越跨線橋	国道45号	1970	51	28.6	8.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	山田町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
672	織笠大橋	国道45号	1969	52	280.0	8.0	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□				支承補修
673	織笠高架橋	E45	1995	26	675.0	10.0	PC		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ							○							
674	細浦跨道橋	E45	1990	31	17.6	12.0	PC		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ							○							
675	山田高架橋	E45	2000	21	470.7	10.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	山田町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
676	新田橋	国道45号	1964	57	105.0	6.0	RC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H29	Ⅱ							○							
677	関谷高架橋	E45	1998	23	609.0	10.4	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	山田町	H28	Ⅲ						○			□	□				部材交換
678	茂師橋	国道45号	2002	19	115.0	12.4	PC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H30	Ⅱ								○						
679	小成橋	国道45号	2000	21	23.0	13.9	PC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H30	Ⅰ								○						
680	波子舞橋	国道45号	1972	49	27.1	8.3	PC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
681	岩沢橋	国道45号	1971	50	60.0	8.3	PC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□				支承取替
682	小本大橋	国道45号	1970	51	220.5	8.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H29	Ⅲ							○					□		床版補修
683	清水野橋	国道45号	1963	58	40.0	6.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H29	Ⅲ							○					□		床版補修
684	大牛内橋	国道45号	1963	58	60.0	7.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H28	Ⅰ						○								
685	樫内橋	国道45号	1970	51	160.0	8.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅲ	床版補修	R2	Ⅱ		○									
686	田老橋	国道45号	1971	50	62.9	8.4	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅱ						○								
687	大平橋	国道45号	1970	51	33.0	8.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
688	乙部橋	国道45号	1981	40	38.9	11.8	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅱ	支承補修							○						
689	真崎大橋	国道45号	1971	50	150.0	8.0	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅱ	伸縮装置取替	R2	Ⅰ		○									
690	摂待橋	国道45号	1962	59	59.3	6.8	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅲ	伸縮装置取替					○						□	□		伸縮装置取替
691	摂待南桟道橋	国道45号	1979	42	81.1	3.6	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
692	摂待北桟道橋	国道45号	1979	42	108.2	3.6	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅲ	断面修復					○						□	□		断面修復
693	大芦上橋	国道45号	1965	56	5.5	6.5	RC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
694	尾肝要橋	国道45号	1959	62	7.4	7.3	RC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
695	深渡小橋	国道45号	1959	62	7.8	7.4	RC		三陸	久慈	岩手県	普代村	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
696	北ノ股橋	国道45号	1970	51	13.5	7.5	PC		三陸	久慈	岩手県	普代村	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
697	米田橋	国道45号	1970	51	13.5	8.2	PC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
698	旭橋	国道45号	1968	53	13.5	7.3	PC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
699	宇部１号橋	国道45号	1955	66	10.5	7.3	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
700	宇部２号橋	国道45号	1957	64	2.9	9.7	RC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
701	町中２の橋	国道45号	1965	56	5.3	6.3	RC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
702	町中１の橋	国道45号	1966	55	10.5	7.2	RC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
703	小屋畑川橋（上長内橋）	国道45号	1967	54	5.5	7.0	RC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
704	大浜橋	国道45号	1972	49	10.4	7.5	PC		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
705	有家大橋	国道45号	1969	52	139.9	7.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H29	Ⅱ							○							
706	和座川橋	国道45号	1972	49	40.8	7.3	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H30	Ⅰ	床版取替							○						
707	新川尻橋	国道45号	1972	49	34.3	7.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H28	Ⅱ						○								
708	安家大橋	国道45号	1972	49	156.0	7.7	PC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
709	銭神橋	国道45号	1961	60	44.0	5.6	RC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	断面修復
710	轟橋	国道45号	1968	53	22.8	8.0	PC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
711	弥生沢橋	国道45号	1963	58	40.0	10.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H26	Ⅲ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
712	槙木沢橋	国道45号	1965	56	240.0	5.9	混合橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H28	Ⅰ						○								
713	一の渡橋	国道45号	1958	63	28.0	10.0	RC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
714	二の渡橋	国道45号	1968	53	26.5	8.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
715	才の神橋	国道45号	1962	59	18.0	6.5	RC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H29	Ⅲ							○					□		洗掘対策
716	寺田橋	国道45号	1962	59	18.0	6.0	RC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H29	Ⅰ							○							
717	巣合下橋	国道45号	1968	53	18.0	8.2	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H30	Ⅱ	床版取替							○						
718	落合１号橋	国道45号	1969	52	24.8	8.2	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H30	Ⅲ	床版補修							○						
719	落合２号橋	国道45号	1969	52	18.5	7.7	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H30	Ⅲ								○					□	当て板補強
720	落合３号橋	国道45号	1972	49	27.1	8.2	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
721	思惟大橋	国道45号	1984	37	315.0	12.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H29	Ⅱ							○							
722	思惟橋	国道45号	1984	37	88.0	13.8	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H28	Ⅰ						○								
723	普代１号橋	国道45号	1972	49	23.0	7.7	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
724	普代２号橋	国道45号	1972	49	53.0	7.7	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H28	Ⅱ						○								
725	普代３号橋	国道45号	1972	49	22.7	8.2	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H30	Ⅲ								○						□	当て板補強
726	普代４号橋	国道45号	1972	49	43.3	8.2	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H30	Ⅰ								○						
727	普代５号橋	国道45号	1972	49	26.7	7.7	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H28	Ⅰ						○								
728	柳渕橋	国道45号	1972	49	24.7	8.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H29	Ⅱ							○							
729	深渡橋	国道45号	1959	62	36.2	5.3	RC		三陸	久慈	岩手県	普代村	H29	Ⅲ							○						□	支承取替
730	堀内大橋	国道45号	1970	51	168.0	9.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
731	堀内跨線橋	国道45号	1968	53	19.9	7.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
732	野田跨線橋	国道45号	1968	53	17.4	7.9	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□	□					床版補修
733	野田橋	国道45号	1968	53	42.0	8.0	PC		三陸	久慈	岩手県	野田村	H27	Ⅱ	伸縮装置取替	R2	Ⅰ		○									
734	新玉川橋	国道45号	1992	29	91.0	13.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H30	Ⅱ								○						
735	宇部４号橋	国道45号	1963	58	25.1	6.0	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
736	新宇津目橋	国道45号	1993	28	26.0	13.8	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅰ						○								
737	桑畑橋	国道45号	1967	54	144.8	6.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅰ	塗替塗装							○						
738	宇部３号橋	国道45号	1983	38	22.5	7.7	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅰ						○								
739	上長内橋	国道45号	1985	36	29.5	12.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅱ						○								
740	長内跨線橋	国道45号	1985	36	37.6	12.0	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
741	久慈大橋	国道45号	1986	35	269.8	13.3	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
742	湊高架橋	E45	1991	30	426.0	9.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅱ						○								
743	湊高架橋（ランプ上）	E45	1991	30	92.4	5.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅱ						○								
744	湊高架橋（ランプ下）	E45	1991	30	92.4	5.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅰ						○								
745	夏井川橋	E45	1992	29	157.0	10.0	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
746	夏井ランプ橋	E45	1993	28	30.0	14.9	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅱ						○								
747	荒川１号橋	国道45号	1970	51	9.5	7.8	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
748	荒川ご線橋	国道45号	1972	49	9.4	8.0	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅱ						○								
749	荒川橋	国道45号	1971	50	40.0	8.0	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
750	片岸大橋	国道45号	1971	50	68.0	8.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
751	大平橋	国道45号	1975	46	146.0	10.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H29	Ⅲ							○						□	□	塗替塗装
752	石浜橋	国道45号	1975	46	42.0	9.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅱ	床版補修	R2	Ⅱ		○									
753	嬉石橋	国道45号	1975	46	89.0	9.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				支承取替
754	鳥谷坂橋	国道45号	1968	53	30.0	8.2	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅲ	当て板補強							○						□	当て板補強
755	水海大橋	国道45号	1968	53	72.2	8.2	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅰ	伸縮装置取替					○								
756	両石橋（水海桟橋）	国道45号	1968	53	122.6	7.1	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅱ								○						
757	大浜渡橋	国道45号	1986	35	132.0	11.8	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅰ						○								
758	矢の浦橋	国道45号	1987	34	108.6	15.4	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅱ								○						
759	釜石高架橋	国道45号	1988	33	681.0	9.5	混合橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅱ						○								
760	天神高架橋	国道45号	1985	36	99.8	5.5	混合橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅱ						○								
761	吉里吉里跨線橋	国道45号	1968	53	20.1	8.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
762	浪板橋	国道45号	1970	51	25.1	8.0	PC		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H27	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅰ		○									
763	古廟大橋	国道45号	1988	33	107.5	11.5	混合橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H30	Ⅱ								○	□					床版補修
764	大石橋	国道45号	1988	33	156.2	11.5	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H30	Ⅱ								○	□					床版補修
765	長部橋	国道45号	1971	50	11.4	7.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
766	新神田橋	国道45号	1963	58	6.3	8.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	断面修復
767	下平橋	国道45号	1962	59	7.3	10.6	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
768	商人橋	国道45号	1956	65	11.7	7.4	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
769	塚の前橋	国道45号	1967	54	6.5	7.2	RC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
770	大畑野１号橋	国道45号	1967	54	7.3	7.7	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
771	大畑野２号橋	国道45号	1967	54	6.3	8.2	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
772	畳石橋	国道45号	1967	54	7.4	7.7	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
773	横石橋	国道45号	1965	56	9.6	9.0	RC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
774	１号溝橋	国道45号	1970	51	10.4	7.5	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
775	浦浜橋	国道45号	1953	68	18.9	6.7	RC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
776	要橋	国道45号	1963	58	20.0	6.5	RC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
777	白木沢大橋	国道45号	1970	51	69.1	8.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
778	泊川橋	E45	1985	36	29.8	12.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅲ							○				□	□	塗替塗装
779	権現堂橋	国道45号	1979	42	118.3	17.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
780	大船渡橋（上）	E45	1998	23	20.5	10.4	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅱ						○								
781	桑原橋	E45	1998	23	86.0	5.9	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H30	Ⅲ	ひびわれ補修							○						
782	立根大橋（上）	E45	1998	23	210.0	9.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
783	滝入川橋	E45	1998	23	42.0	12.4	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
784	立根川橋	E45	1998	23	23.0	8.8	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
785	細野橋	E45	1992	29	28.5	16.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○					□					断面修復
786	畳石橋（畳石こ道橋）	E45	1992	29	214.3	10.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
787	大沢橋側道橋（下）	国道45号	1978	43	13.5	1.5	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
788	新田橋側道橋	国道45号	1972	49	105.0	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	山田町	H29	Ⅱ							○							
789	波子舞橋側道橋	国道45号	1986	35	51.0	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□	□				床版取替
790	岩沢橋側道橋	国道45号	1988	33	76.2	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
791	小本大橋側道橋	国道45号	1986	35	222.1	1.8	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H29	Ⅰ							○							
792	清水野橋側道橋	国道45号	1979	42	38.0	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H29	Ⅲ	伸縮装置取替						○				□		伸縮装置取替
793	田老橋側道橋	国道45号	1979	42	63.0	1.4	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅲ	支承補修					○				□	□		支承補修
794	大平橋側道橋	国道45号	1979	42	33.0	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
795	摂待側道橋	国道45号	1983	38	59.9	1.8	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅱ						○								
796	旭橋（側道橋）	国道45号	1980	41	19.7	1.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
797	宇部１号橋（側道橋）	国道45号	1985	36	13.7	1.8	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
798	上長内橋（側道橋）	国道45号	2002	19	5.0	1.0	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
799	大浜橋（側道橋）	国道45号	1981	40	21.1	1.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H26	Ⅱ	床版補修	R1	Ⅰ	○										
800	有家大橋（側歩道橋）	国道45号	1986	35	169.5	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H29	Ⅰ							○							
801	新川尻橋（側道橋）	国道45号	1978	43	34.4	1.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	洋野町	H28	Ⅰ						○								
802	轟橋（側道橋）	国道45号	1978	43	22.8	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
803	二の渡橋側歩道橋	国道45号	1980	41	37.7	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
804	才の神橋側歩道橋	国道45号	1980	41	18.2	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H29	Ⅱ							○							
805	寺田橋側歩道橋	国道45号	1979	42	18.1	2.1	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H29	Ⅱ							○							
806	野田跨線橋側歩道橋	国道45号	1973	48	24.8	1.8	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
807	野田橋（側歩道橋）	国道45号	1979	42	42.0	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H27	Ⅰ	伸縮装置取替	R2	Ⅰ		○									
808	宇部４号橋（側道橋）	国道45号	1972	49	25.1	2.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
809	宇部３号橋（側道橋）	国道45号	1985	36	22.5	1.4	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市	H28	Ⅱ						○								
810	荒川１号橋側歩道橋	国道45号	1982	39	14.5	1.4	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
811	荒川ご線橋側歩道橋	国道45号	1982	39	22.0	1.4	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H28	Ⅱ					○									
812	荒川橋側歩道橋	国道45号	1981	40	54.1	2.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
813	片岸大橋側歩道橋	国道45号	1978	43	66.7	2.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				塗替塗装
814	吉里吉里跨線橋側歩道橋	国道45号	1983	38	34.0	2.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
815	長部側道橋	国道45号	2000	21	17.5	2.6	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
816	商人橋側歩道橋（下）	国道45号	1971	50	12.5	1.7	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
817	商人橋側歩道橋（上）	国道45号	1971	50	13.0	1.8	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
818	塚の前橋側歩道橋（上）	国道45号	1978	43	11.8	1.4	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
819	塚の前橋側歩道橋（下）	国道45号	1978	43	7.1	1.4	RC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
820	堀之内側歩道橋	国道45号	1968	53	8.0	1.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
821	大畑野１号橋側歩道（下）	国道45号	1980	41	19.0	1.8	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
822	大畑野１号橋側歩道（上）	国道45号	1998	23	22.5	1.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
823	大畑野２号橋側歩道橋	国道45号	1980	41	14.5	1.4	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
824	横石ご線橋（側道橋）	国道45号	1982	39	14.5	1.8	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅱ						○								
825	横石橋側歩道橋	国道45号	1983	38	14.5	1.4	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
826	浦浜橋側歩道橋（下）	国道45号	1985	36	24.8	1.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
827	浦浜橋側歩道橋（上）	国道45号	1979	42	24.8	2.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
828	要橋側歩道橋	国道45号	1981	40	25.6	2.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
829	白木沢橋側歩道橋（下）	国道45号	1989	32	81.1	2.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
830	白木沢橋側歩道橋（上）	国道45号	1977	44	79.5	1.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅲ	当て板補強						○					□	□	当て板補強
831	立根大橋（下）	E45	2003	18	210.0	9.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
832	大沢橋側道橋（上）	国道45号	1978	43	16.5	2.4	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
833	丸森Ｂランプ橋	E45	2001	20	70.0	7.4	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
834	丸森Ｃランプ橋	E45	1996	25	44.0	7.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
835	下船渡１号橋	E45	1997	24	24.0	18.6	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
836	下船渡２号橋	E45	1998	23	30.0	10.5	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
837	下船渡３号橋	E45	2001	20	47.0	10.5	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
838	宮ノ前橋（下）	E45	1997	24	54.5	10.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
839	永沢橋	E45	2001	20	135.0	10.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
840	北笹崎川橋	E45	2001	20	95.0	10.4	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
841	須崎川橋	E45	1993	28	275.0	10.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
842	溝橋	E45	1998	23	15.5	12.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
843	御山下大橋	E45	2004	17	360.0	10.3	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
844	宇津の沢川橋	E45	1999	22	57.0	10.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅰ							○							
845	盛川大橋	E45	1996	25	360.0	10.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
846	前田橋（下）	E45	2001	20	202.0	9.2	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
847	前田橋（上）	E45	1991	30	202.0	9.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H29	Ⅱ							○							
848	槇木沢ご道橋	E45	2004	17	25.3	12.2	PC		三陸	久慈	岩手県	田野畑村	H28	Ⅱ						○								
849	甲子ご線橋	E46	2005	16	220.0	10.2	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
850	甲子１号橋	E46	2001	20	30.0	12.4	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅱ								○						
851	甲子２号橋	E46	2001	20	30.0	12.4	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅱ								○						
852	荒川橋	E46	2003	18	126.0	8.2	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅰ								○						
853	洞泉橋	E46	2004	17	405.0	10.2	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
854	枯松沢橋	E46	2007	14	310.0	10.2	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H30	Ⅲ								○					□	支承取替
855	秋丸橋	E46	2007	14	33.9	11.9	PC		三陸	釜石	岩手県	住田町	H30	Ⅰ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
856	赤羽ご道橋	E46	2007	14	33.2	11.9	PC		三陸	釜石	岩手県	遠野市	H30	Ⅱ							○							
857	大船渡橋（下）	E45	2003	18	20.5	15.0	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅱ						○								
858	思案坂大橋	E45	2004	17	285.0	11.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	田野畑村	H30	Ⅲ							○						□	当て板補強
859	丸森橋	E45	2004	17	46.0	10.4	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
860	金浜ご線橋	E45	2009	12	16.5	8.7	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
861	新弥生沢橋	E45	2009	12	133.0	10.5	PC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H29	Ⅰ							○							
862	真木沢ご道橋	E45	2004	17	25.3	11.9	PC		三陸	宮古	岩手県	田野畑村	H28	Ⅱ						○								
863	真木沢ＩＣ橋	E45	2009	12	39.5	7.0	PC		三陸	宮古	岩手県	田野畑村	H28	Ⅱ						○								
864	南長内沢橋	E45	2007	14	63.0	10.2	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H30	Ⅱ							○							
865	北長内沢橋	E45	2007	14	37.0	12.0	RC		三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H30	Ⅰ							○							
866	米田橋側歩道橋	国道45号	2012	9	21.0	1.8	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	野田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
867	千徳大橋	国道45号	2012	9	341.0	10.5	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
868	普代大橋	E45	2013	8	490.0	10.5	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	普代村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
869	上普代橋	E45	2013	8	421.0	10.3	PC		三陸	久慈	岩手県	普代村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
870	浪板橋側歩道橋（上）	国道45号	2013	8	45.0	2.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
871	浪板橋側歩道橋（下）	国道45号	2013	8	38.5	2.0	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	大槌町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
872	宝来橋側道橋	国道45号	2013	8	91.8	2.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	山田町	H27	Ⅰ														撤去
873	高木橋	国道45号	1963	58	5.5	13.0	－	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H28	Ⅰ						○								
874	２３６．７６２Ｋボックス	国道45号	1969	52	4.6	8.5	－	○	三陸	宮古	岩手県	山田町	H28	Ⅰ														撤去
875	２６０．４５ｋ地下道	国道45号	1990	31	5.7	29.7	－	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
876	２７６．０３ｋボックス	国道45号	1971	50	6.3	11.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅱ						○								
877	２９４．４４８ｋボックス	国道45号	1986	35	2.6	11.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H28	Ⅰ						○								
878	２５８．４１ｋボックス	E45	1990	31	8.4	12.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅱ						○								
879	２５９．１４ｋボックス	E45	1990	31	4.6	12.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
880	２６２．１３６ｋボックス	国道45号	1974	47	6.0	8.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
881	２９６．２６８ｋボックス	E45	2007	14	4.8	11.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H28	Ⅰ						○								
882	２９６．４９５ｋボックス	E45	2007	14	4.5	12.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H28	Ⅰ						○								
883	２９６．８６３ｋボックス	E45	2007	14	4.5	12.0	－	○	三陸	宮古	岩手県	岩泉町	H28	Ⅱ						○								
884	３３０．９２３ｋボックス	国道45号	1970	51	2.7	11.4	－	○	三陸	久慈	岩手県	普代村	H29	Ⅱ							○							
885	３４２．２６ｋボックス	国道45号	2012	9	6.2	8.0	－	○	三陸	久慈	岩手県	野田村	H29	Ⅱ							○							
886	３４３．７６５ｋボックス	国道45号	1979	42	4.7	7.6	－	○	三陸	久慈	岩手県	野田村	H29	Ⅱ							○							
887	３４４．０９６ｋボックス	国道45号	1968	53	4.1	7.7	－	○	三陸	久慈	岩手県	野田村	H29	Ⅰ							○							
888	３５４．１８４ｋボックス	国道45号	1985	36	3.6	14.0	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H29	Ⅱ							○							
889	３５４．３８４ｋボックス	国道45号	1985	36	3.6	14.0	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H29	Ⅱ							○							
890	３５４．７５４ｋボックス	国道45号	1985	36	4.1	12.0	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H29	Ⅱ							○							
891	３５４．８２５ｋボックス	国道45号	1985	36	3.1	12.0	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H29	Ⅰ							○							
892	３５６．５２４ｋボックス	国道45号	1986	35	7.0	23.2	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
893	３５６．７４８ｋボックス	国道45号	1986	35	5.1	18.8	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
894	３５７．１６５ｋボックス	国道45号	1991	30	7.3	40.5	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
895	３５７．８ｋボックス	国道45号	1991	30	6.6	23.6	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
896	３５８．８７８ｋボックス	国道45号	1991	30	10.4	16.7	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
897	３５９．０８２ｋボックス	国道45号	1992	29	5.8	23.5	－	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市	H30	Ⅱ								○						
898	高畑橋	国道45号	1963	58	5.5	8.0	－	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H28	Ⅱ						○								
899	重倉橋	国道45号	1963	58	4.3	11.5	－	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市	H28	Ⅰ						○								
900	三陸ＩＣ市道ボックス	E45	2015	6	5.5	8.1	－	○	三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅰ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
901	荒谷沢川ボックス	国道45号	2014	7	9.5	18.6	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
902	小成川橋	国道45号	2014	7	21.0	11.8	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H28	Ⅰ						○								
903	越喜来高架橋	E45	2015	6	584.0	10.5	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅱ						○								
904	吉浜高架橋	E45	2015	6	373.0	10.5	PC		三陸	大船渡	岩手県	大船渡市	H28	Ⅱ						○								
905	平田橋	国道45号	2016	5	24.5	13.5	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H29	Ⅰ							○							
906	長内橋	国道45号	2016	5	30.3	17.0	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市	H29	Ⅰ							○							
907	長久橋	国道45号	2017	4	9.5	18.5	–	○	三陸	宮古	岩手県	山田町	H29	Ⅰ							○							
908	新小成橋	E45	2016	5	114.0	12.7	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
909	岩泉南ICランプ橋	E45	2017	4	17.8	16.2	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
910	門沢橋	E45	2016	5	37.0	14.4	PC		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅱ								○						
911	摂待大橋	E45	2016	5	234.0	12.7	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅱ								○						
912	青野滝大橋	E45	2016	5	101.0	12.7	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
913	豊間根橋	国道45号	2017	4	91.0	15.8	鋼橋		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ								○						
914	七田川橋	E45	2017	4	44.0	14.4	PC		三陸	宮古西	岩手県	宮古市	H30	Ⅱ								○						
915	荒川川橋	E45	2017	4	67.0	12.8	鋼橋		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ								○						
916	豊間根大橋	E45	2017	4	95.0	14.4	鋼橋		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ								○						
917	田名部橋	E45	2017	4	25.0	18.9	PC		三陸	宮古西	岩手県	山田町	H30	Ⅱ								○						
918	No.831ボックス	E45	2017	4	5.9	21.0	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
919	No.920+15.2ボックス	E45	2017	4	2.0	40.0	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
920	No.923+17.3ボックス	E45	2017	4	2.0	28.0	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
921	No.949ボックス	E45	2017	4	3.5	19.2	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅰ								○						
922	２８４．８８６ＫＰカルバート	E45	2015	6	3.5	13.5	–	○	三陸	宮古	岩手県	宮古市	H30	Ⅱ								○						
923	長部高架橋	E45	2017	4	408.0	12.8	PC		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R1	Ⅰ	○										
924	気仙川大橋（新気仙大橋）	E45	2017	4	438.0	12.8	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R1	Ⅱ	○										
925	豊間根ご線橋	E45	2015	6	30.5	13.5	PC		三陸	宮古西	岩手県	山田町				R1	Ⅰ	○										
926	小本川大橋	E45	2017	4	362.0	22.9	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町				R1	Ⅱ	○										
927	小本高架橋	E45	2016	5	151.0	12.0	鋼橋		三陸	宮古	岩手県	岩泉町				R1	Ⅰ	○										
928	釜石JCT　Aランプ橋	E46	2018	3	57.5	7.9	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
929	釜石JCT　Bランプ橋	E46	2018	3	31.0	8.1	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
930	定内高架橋	E46	2016	5	145.0	22.8	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
931	向定内橋	E46	2014	7	44.5	12.8	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
932	梶ヶ沢橋	E46	2018	3	22.0	13.5	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
933	松倉第１橋	E46	2018	3	23.0	13.5	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
934	松倉第２橋	E46	2018	3	24.0	13.5	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
935	坪内沢橋	E46	2017	4	117.0	12.8	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
936	不動沢橋	E46	2016	5	19.0	13.5	PC		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
937	関沢高架橋	E46	2017	4	214.5	23.4	鋼橋		三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
938	気仙大橋	国道45号	2018	3	201.0	16.0	鋼橋		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅱ		○									
939	陸前高田長部ICランプボックス	E45	2017	4	10.1	16.2	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市								○								
940	No.328+13.50ボックス	E45	2017	4	4.7	18.1	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅰ		○									
941	No.451+0.00ボックス	E45	2016	5	4.9	19.2	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅰ		○									
942	陸前高田ICランプボックス	E45	2017	4	13.2	16.4	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市								○								
943	山田南ICランプボックス	E45	2017	4	13.8	23.4	–	○	三陸	宮古	岩手県	山田町								○								
944	No.202+5.00ボックス	E46	2014	7	18.2	11.4	–	○	三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
945	No.234+9.55ボックス	E46	2017	4	6.1	18.8	–	○	三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
946	釜石西IC　Cランプボックス	E46	2013	8	8.0	18.8	–	○	三陸	釜石	岩手県	釜石市								○								
947	川原川橋	国道45号	2019	2	29.6	19.8	PC		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅱ		○									
948	浜田川橋	国道45号	2019	2	22.7	19.8	PC		三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅰ		○									
949	宝来橋	国道45号	2019	2	63.8	17.8	PC		三陸	宮古	岩手県	山田町				R2	Ⅰ		○									
950	鳥谷高架橋	E45	2019	2	497.0	12.7	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市				R2	Ⅰ		○									
951	鳥谷ご道橋	E45	2019	2	17.5	13.5	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市				R2	Ⅰ		○									
952	宇津目ご線橋	E45	2019	2	21.0	13.5	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市								○								
953	宇津目ご道橋	E45	2019	2	55.0	12.0	鋼橋		三陸	久慈	岩手県	久慈市				R2	Ⅰ		○									
954	宇津目高架橋	E45	2019	2	178.0	13.2	PC		三陸	久慈	岩手県	久慈市				R2	Ⅱ		○									
955	73.209kカルバート	E46	2017	4	6.1	18.8	–	○	三陸	釜石	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
956	365.844kカルバート	E45	2016	5	7.2	31.8	–	○	三陸	久慈	岩手県	久慈市				R2	Ⅰ		○									
957	152.227kカルバート	E45	2017	4	4.7	18.1	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅰ		○									
958	154.673kカルバート	E45	2016	5	4.9	19.2	–	○	三陸	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅰ		○									
959	鵜住居第１橋高架橋	E45	2009	12	137.0	9.5	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市	H29	Ⅰ							○							
960	鵜住居第２橋高架橋	E45	2009	12	187.0	9.5	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市	H29	Ⅰ							○							
961	両石高架橋	E45	2008	13	176.0	9.3	PC		南三陸	–	岩手県	釜石市	H29	Ⅰ							○							
962	鵜住居川橋	E45	2010	11	146.5	9.5	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市	H29	Ⅱ							○							
963	新白木沢橋	E45	2017	4	250.0	19.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	大船渡市				R2	Ⅱ		○									
964	荒川高架橋	E45	2017	4	307.0	13.0	PC		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
965	片岸高架橋	E45	2017	4	352.0	13.0	PC		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
966	小佐野高架橋 本線橋	E45	2018	3	461.0	24.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
967	小佐野高架橋 Dランプ橋	E45	2018	3	120.0	7.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
968	釜石中央IC橋	E45	2018	3	69.0	24.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
969	八雲ご道橋	E45	2017	4	81.0	10.0	PC		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
970	水海高架橋	E45	2014	7	184.0	11.0	PC		南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅱ		○									
971	大槌IC橋	E45	2017	4	22.0	12.0	PC		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅰ		○									
972	浪板高架橋	E45	2016	5	159.0	13.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅱ		○									
973	鯨山橋	E45	2016	5	38.0	15.0	鋼橋		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅱ		○									
974	大槌大沢橋	E45	2017	4	155.0	13.0	PC		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅱ		○									
975	四十八坂大橋	E45	2018	3	210.0	13.0	PC		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅰ		○									
976	新四十八坂橋	E45	2016	5	71.0	13.0	PC		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅰ		○									
977	三陸道 186.0kカルバート	E45	2013	8	7.0	19.0	–	○	南三陸	–	岩手県	大船渡市				R2	Ⅰ		○									
978	三陸道 193.9kカルバート	E45	2017	4	5.0	32.0	–	○	南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
979	三陸道 197.3kカルバート	E45	2017	4	8.0	18.0	–	○	南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
980	三陸道 203.1kカルバート	E45	2015	6	4.0	17.0	–	○	南三陸	–	岩手県	釜石市				R2	Ⅰ		○									
981	三陸道 220.2kカルバート	E45	2015	6	5.0	23.0	–	○	南三陸	–	岩手県	山田町				R2	Ⅱ		○									
982	小鎚高架橋	E45	2018	3	170.0	12.8	鋼橋		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅰ		○									
983	大槌高架橋	E45	2018	3	375.0	12.8	鋼橋		南三陸	–	岩手県	大槌町				R2	Ⅱ		○									
984	名取大橋	国道4号	1963	58	541.0	13.6	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅲ	床版取替	R1	Ⅱ	○					□					床版補修
985	笊川橋	国道4号	1963	58	45.8	28.0	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○	□					当て板補強
986	千代大橋	国道4号	1965	56	310.0	28.3	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
987	苦竹第一ご道橋（下）	国道4号	1974	47	32.5	9.2	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
988	苦竹第一ご道橋（上）	国道4号	1974	47	32.5	12.7	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
989	梅田川橋（下）	国道4号	1968	53	129.0	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
990	梅田川橋（上）	国道4号	1973	48	129.0	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○	□					当て板補強

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性H26-30		年度	健全性R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
991	小鶴一号橋（下）	国道4号	1969	52	16.0	21.6	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
992	小鶴一号橋（上）	国道4号	1970	51	16.0	17.4	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
993	燕沢ご線橋（下）	国道4号	1969	52	41.6	13.2	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ							○							
994	燕沢ご線橋（上）	国道4号	1973	48	41.6	13.2	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ							○							
995	燕沢ご道橋（下）	国道4号	1968	53	21.6	10.2	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
996	燕沢ご道橋（上）	国道4号	1974	47	21.6	10.2	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
997	要害橋（下）	国道4号	1969	52	16.4	9.6	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
998	要害橋（上）	国道4号	1969	52	16.4	9.6	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
999	泉大橋（下）	国道4号	1969	52	150.4	9.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□				□	断面修復
1000	泉大橋（上）	国道4号	1974	47	150.4	9.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□				□	断面修復
1001	愛宕橋	国道4号	1969	52	16.6	19.5	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1002	大黒橋（下）	国道4号	1973	48	22.1	9.9	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1003	大黒橋（上）	国道4号	1973	48	22.1	10.4	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1004	大沢橋（下）	国道4号	1973	48	20.1	16.9	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1005	大沢橋（上）	国道4号	1974	47	20.1	12.9	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1006	高田橋（上）	国道4号	1993	28	71.3	11.0	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	大和町	H29	Ⅱ							○							
1007	高田橋（下）	国道4号	1996	25	71.3	11.0	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	大和町	H29	Ⅱ							○							
1008	吉童橋（下）	国道4号	1961	60	34.5	7.1	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□			□	断面修復
1009	塩浪橋（上）	国道4号	1961	60	27.1	7.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H30	Ⅱ								○						
1010	内田橋（下）	国道4号	1983	38	20.9	14.8	PC		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H29	Ⅱ							○							
1011	内田橋（上）	国道4号	1983	38	20.9	11.8	PC		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H29	Ⅰ							○							
1012	富谷大橋（上）	国道4号	1983	38	107.5	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				支承取替
1013	富谷大橋（下）	国道4号	1999	22	107.5	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				支承取替
1014	第一清水川橋	国道4号	1962	59	8.8	21.7	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1015	第二清水川橋	国道4号	1962	59	7.3	15.0	RC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1016	郡山ご道橋	国道4号	1965	56	10.4	26.8	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1017	苦竹第二ご道橋ランプ	国道4号	1974	47	32.5	5.4	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1018	苦竹ご道橋（下）	国道4号	1972	49	9.1	13.7	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1019	苦竹ご道橋（上）	国道4号	1972	49	9.1	13.7	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1020	小鶴二号橋（下）	国道4号	2004	17	17.0	18.9	RC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1021	小鶴二号橋（上）	国道4号	2004	17	17.0	18.9	RC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1022	八乙女橋（上）	国道4号	1970	51	8.5	10.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1023	八乙女橋（下）	国道4号	1969	52	8.5	8.1	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1024	大清水橋	国道4号	1958	63	13.7	25.7	PC		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1025	一の宮橋（下）	国道4号	1983	38	11.6	12.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H30	Ⅱ								○						
1026	一の宮橋（上）	国道4号	1983	38	11.6	12.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H30	Ⅱ								○						
1027	車橋（下）	国道4号	1960	61	19.7	13.8	PC		仙台	仙台東	宮城県	大和町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1028	車橋（上）	国道4号	1960	61	19.7	13.8	PC		仙台	仙台東	宮城県	大和町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1029	福田橋（下）	国道45号	1957	64	51.4	10.4	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅱ	○						□	□				断面修復
1030	福田橋（上）	国道45号	1971	50	53.9	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1031	福田大橋（下）	国道45号	1971	50	111.8	10.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
1032	福田大橋（上）	国道45号	1957	64	108.6	11.0	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅱ	○										
1033	多賀城橋	国道45号	1953	68	56.0	21.8	RC		仙台	仙台東	宮城県	多賀城市	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
1034	高城大橋	国道45号	1976	45	82.9	12.8	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	松島町	H28	Ⅱ						○			□	□				支承補修
1035	寺前橋	国道45号	1957	64	5.6	10.5	RC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1036	越の浦橋	国道45号	1947	74	4.6	7.6	RC		仙台	仙台東	宮城県	塩竈市	H29	Ⅱ							○							
1037	須賀橋	国道45号	1956	65	7.5	8.5	RC		仙台	仙台東	宮城県	利府町	H30	Ⅲ								○					□	断面修復
1038	松島溝橋	国道45号	1977	44	13.5	11.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	松島町	H28	Ⅱ						○								
1039	燕沢跨線橋（ＯＮランプ）	国道4号	1997	24	49.3	11.4	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ							○							
1040	燕沢跨線橋（ＯＦＦランプ）	国道4号	1997	24	49.3	11.4	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ							○							
1041	子の島橋	国道45号	1973	48	2.3	7.8	RC		仙台	仙台東	宮城県	利府町	H29	Ⅲ							○							架替
1042	松島函橋	国道45号	1977	44	3.6	14.1	RC		仙台	仙台東	宮城県	松島町	H29	Ⅱ							○							
1043	若宮橋	国道45号	1970	51	6.3	7.3	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅱ						○								
1044	新荒町橋	国道45号	1970	51	5.3	9.0	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1045	たまち橋	国道45号	1970	51	3.0	7.0	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1046	追分橋	国道45号	1970	51	7.7	10.4	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1047	ころびいし橋	国道45号	1972	49	4.0	9.5	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1048	仙台南三陸町溝橋２	国道45号	1974	47	3.2	9.1	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1049	磯の沢橋	国道45号	1970	51	25.6	7.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅲ								○					□	当て板補強
1050	平井田橋	国道45号	1971	50	7.2	8.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1051	下立沢橋	国道45号	1971	50	16.7	11.2	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1052	夏崎橋	国道45号	1971	50	13.4	8.1	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅱ							○							
1053	下夏崎橋	国道45号	1971	50	14.4	7.7	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅱ							○							
1054	大畠橋	国道45号	1971	50	17.0	9.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1055	大天馬橋	国道45号	1962	59	17.0	7.2	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅰ								○						
1056	新桜橋	国道45号	1970	51	22.8	7.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1057	歌津１号溝橋	国道45号	1972	49	7.3	8.2	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1058	歌津２号溝橋	国道45号	1972	49	10	7.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅱ	撤去													
1059	蔵内ご線橋	国道45号	1972	49	10.4	7.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅱ						○								
1060	津谷高架橋	国道45号	1995	26	131	13.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1061	大沢橋	国道45号	1967	54	20	8	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1062	沖の田橋	国道45号	1967	54	20	7.5	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							架替
1063	五ツ橋	国道45号	1968	53	6.3	7.6	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1064	面瀬川橋	国道45号	1986	35	38.1	11.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1065	神山川橋	国道45号	1986	35	51.6	11.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○						□				当て板補強
1066	平前橋	国道45号	1979	42	84.1	11.8	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅲ	支承補修	R2	Ⅱ		○				□	□				支承補修
1067	松川高架橋（上）	国道45号	1980	41	69.6	9.2	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1068	松川高架橋（下）	国道45号	1980	41	69.6	11.8	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1069	仙台気仙沼市第２号溝橋（下）	国道45号	1980	41	14.4	8.6	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅱ								○						
1070	仙台気仙沼市第２号溝橋（上）	国道45号	1980	41	14.4	5.6	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅱ								○						
1071	仙台気仙沼市溝橋３	国道45号	1980	41	22.4	11.7	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1072	松川橋（下）	国道45号	1980	41	25.3	8.3	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							
1073	松川橋（上）	国道45号	1980	41	25.3	10.7	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							
1074	鹿折高架橋	国道45号	1984	37	209.0	11.3	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1075	八幡大橋	国道45号	1985	36	42.4	19.5	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							
1076	只越第１橋	国道45号	1969	52	39.3	7.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					塗替塗装
1077	只越第２橋	国道45号	1970	51	28.0	7.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					ひびわれ補修
1078	新館橋	国道45号	1970	51	25.7	7.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1079	大沢第一橋	国道45号	1970	51	28.1	7.7	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H26	Ⅲ		R1	Ⅰ	○					□					塗替塗装
1080	砂田高架橋	国道108号	1990	31	111.0	13.3	PC		仙台	古川	宮城県	涌谷町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○					□				断面修復

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1081	上下堤橋	国道45号	1936	85	5.2	7.9	RC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	断面修復
1082	鳴瀬大橋	国道45号	1974	47	435.3	10.4	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅲ							○						□	床版取替
1083	小野橋（下）	国道45号	1966	55	10.4	10.3	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ							○							
1084	小野橋（上）	国道45号	1966	55	10.4	10.5	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ							○							
1085	熊野橋	国道45号	1959	62	2.4	6.5	RC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ						○								
1086	矢本ご線橋	国道45号	1968	53	25.1	9.7	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1087	鹿妻ご道橋	国道45号	1968	53	7.3	9.3	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ							○							
1088	河戸橋	国道45号	1953	68	4.6	7.9	RC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1089	定川橋	国道45号	1986	35	80.0	8.2	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ							○							
1090	赤井橋（下）	国道45号	1984	37	19.6	6.9	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1091	柳目２号橋	国道45号	1955	66	5.3	8.7	RC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1092	蛇田ご線橋	国道45号	1961	60	10.5	10.7	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1093	蛇田２号橋	国道45号	1969	52	9.5	7.9	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1094	鹿又１号橋	国道45号	1969	52	6.3	7.5	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1095	鹿又２号橋	国道45号	1969	52	10.4	7.6	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1096	鹿又３号橋	国道45号	1969	52	8.8	7.5	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1097	鹿又ご線橋	国道45号	1970	51	24.0	7.5	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ						○								
1098	天王橋	国道45号	1959	62	367.7	6.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅲ	架替						○							
1099	河北ご道橋	国道45号	1976	45	21.7	10.3	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1100	古川橋	国道45号	1975	46	53.9	9.8	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅲ						○			□	□				当て板補強
1101	新飯野川橋	国道45号	1973	48	441.5	9.8	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅲ						○			□	□	□			床版取替
1102	合戦谷橋	国道45号	1964	57	6.3	7.2	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□			□	断面修復
1103	石貝橋	国道45号	1963	58	17.0	6.1	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	登米市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1104	伊貝橋	国道45号	2012	9	10.5	10.3	RC		仙台	石巻	宮城県	登米市	H29	Ⅱ							○							
1105	南沢橋	国道45号	1962	59	35.0	6.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	登米市	H29	Ⅲ							○							架替
1106	新北沢橋	国道45号	1970	51	31.2	7.6	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	登米市	H27	Ⅲ	部材交換	R2	Ⅱ		○				□					塗替塗装
1107	権口橋	国道45号	1964	57	10.5	6.7	PC		仙台	石巻	宮城県	登米市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1108	竹の沢橋	国道45号	1967	54	14.7	7.7	PC		仙台	石巻	宮城県	登米市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1109	柳橋	国道108号	1961	60	10.5	8.2	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1110	山下橋	国道108号	1959	62	5.3	6.7	RC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1111	桶場橋	国道108号	1951	70	7.8	6.3	RC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1112	大拘橋	国道108号	1959	62	6.2	10.5	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1113	黒沢西橋	国道108号	1930	91	3.4	8.6	RC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ							○							
1114	筒頭橋	国道108号	1963	58	10.7	7.3	RC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1115	樋ノ口橋	国道108号	1976	45	10.0	8.0	RC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅲ						○				□				ひびわれ補修
1116	鳥谷坂ご線橋	国道108号	2006	15	15.0	10.3	PC		仙台	古川	宮城県	美里町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1117	明治水門橋	国道108号	1969	52	37.9	7.7	鋼橋		仙台	古川	宮城県	涌谷町	H29	Ⅱ							○							
1118	一本柳ご線橋	国道108号	1991	30	107.0	13.3	鋼橋		仙台	古川	宮城県	涌谷町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□			□	支承取替
1119	小谷橋	国道108号	1937	84	4.7	8.1	RC		仙台	古川	宮城県	涌谷町	H28	Ⅲ						○			□					断面修復
1120	坂元ご道橋	国道6号	1962	59	10.4	9.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ							○							
1121	戸花橋	国道6号	1962	59	13.5	9.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
1122	高瀬橋	国道6号	1963	58	5.3	9.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
1123	新田橋	国道6号	1963	58	11.4	9.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ							○							
1124	新田ご道橋	国道6号	1963	58	7.3	9.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1125	山下ご道橋	国道6号	1963	58	5.2	11.6	RC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ							○							

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1126	物見橋	国道6号	1963	58	7.4	9.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅱ							○							
1127	鷲足橋	国道6号	1964	57	5.3	9.1	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1128	木崎橋	国道6号	1964	57	3.8	12.5	RC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1129	横山ご道橋	国道6号	1965	56	9.4	9.2	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1130	第二号吉田橋	国道6号	1964	57	4.4	10.3	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1131	第三号吉田橋	国道6号	1964	57	2.6	10.7	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1132	第一号長瀞橋	国道6号	1962	59	2.6	13.7	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1133	第二号長瀞橋	国道6号	1964	57	2.6	9.9	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1134	第三号長瀞橋	国道6号	1964	57	2.6	8.8	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1135	雪穴沢橋	国道6号	1970	51	14.9	9.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅱ								○						
1136	亘理第四号函渠	国道6号	1970	51	8.6	9.2	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅲ						○			□	□				断面修復
1137	亘理ご線橋	国道6号	1964	57	25.2	9.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1138	阿武隈橋	国道6号	1979	42	625.3	11.5	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅲ								○					□	塗替塗装
1139	六志橋	国道6号	1964	57	16.1	17.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
1140	加茂橋	国道6号	1963	58	5.3	15.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅰ						○								
1141	斉川大橋	国道4号	1962	59	212.3	9.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H30	Ⅱ								○						
1142	白鳥橋（上）	国道4号	1982	39	70.5	10.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1143	白鳥橋（下）	国道4号	1982	39	70.5	10.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1144	大太郎川橋（上）	国道4号	1973	48	30.9	10.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅲ							○		□					部材交換
1145	大太郎川橋（下）	国道4号	1973	48	30.9	13.2	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1146	井戸井前橋（下）	国道4号	1975	46	35.2	10.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H30	Ⅰ								○						
1147	井戸井前橋（上）	国道4号	1975	46	35.2	10.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H30	Ⅱ								○						
1148	森の川橋	国道4号	1975	46	32.1	27.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H30	Ⅰ								○						
1149	蔵王大橋（下）	国道4号	1975	46	285.4	10.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H28	Ⅱ						○								
1150	新白石大橋（上）	国道4号	1974	47	280.9	10.5	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅲ							○		□					当て板補強
1151	天津沢橋（上）	国道4号	1977	44	20.1	10.1	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1152	天津沢橋（下）	国道4号	1977	44	20.1	8.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1153	新韮神橋（上）	国道4号	1983	38	155.9	10.5	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H29	Ⅱ							○							
1154	新韮神橋（下）	国道4号	1994	27	138.0	10.5	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H29	Ⅰ							○							
1155	白石高架橋（上）	国道4号	1979	42	147.6	10.5	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H30	Ⅱ								○						
1156	槻木高架橋（下）	国道4号	1988	33	597.3	10.0	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H30	Ⅱ								○						
1157	槻木高架橋（上）	国道4号	1983	38	597.3	10.0	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H30	Ⅲ								○					□	部材交換
1158	新西原橋	国道4号	1963	58	19.3	24.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H30	Ⅲ								○					□	支承取替
1159	新増田川橋	国道4号	1963	58	27.0	14.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅲ						○			□					床版補修
1160	松沢橋	国道4号	1962	59	4.4	22.1	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1161	向田橋	国道4号	1962	59	9.3	8.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ						○								
1162	斉川第二号橋	国道4号	1962	59	2.0	9.5	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1163	斉川第三号橋	国道4号	1962	59	2.4	9.3	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1164	大平第二号橋（上）	国道4号	1962	59	2.9	9.2	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1165	大平第五号橋	国道4号	1978	43	12.4	10.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H30	Ⅱ								○						
1166	機関場橋	国道4号	1963	58	8.4	20.2	PC		仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H29	Ⅱ							○							
1167	岩沼ご道橋	国道4号	1963	58	11.4	21.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H30	Ⅲ								○					□	断面修復
1168	岩沼ご線橋	国道4号	1963	58	11.2	21.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅲ		○								□	当て板補強
1169	吹上ご線橋	国道4号	1963	58	7.6	22.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H29	Ⅱ							○							
1170	志賀沢橋	国道4号	1961	60	11.4	14.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1171	一の橋	国道4号	1961	60	7.3	15.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1172	川内沢橋	国道4号	1961	60	11.4	18.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1173	宮下橋	国道4号	1961	60	5.5	15.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅱ						○								
1174	荒井橋	国道6号	1962	59	7.3	9.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1175	坂元橋	国道6号	1998	23	26.1	15.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1176	床好橋	国道6号	1964	57	5.0	12.9	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1177	第一号吉田橋	国道6号	1964	57	2.6	9.9	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1178	愛宕沢橋	国道6号	1970	51	10.7	27.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○								
1179	石神橋	国道4号	1962	59	4.1	9.9	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1180	滝の沢橋	国道4号	1962	59	2.4	9.1	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1181	亘理第一号溝橋	国道6号	1970	51	5.2	14.0	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅱ							○							
1182	亘理第二号溝橋	国道6号	1970	51	3.6	10.5	RC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅰ								○						
1183	大井川橋	国道4号	1962	59	5.0	40.0	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1184	三本木大橋（上）	国道4号	1970	51	196.1	9.7	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					床版補修
1185	三本木大橋（下）	国道4号	1998	23	196.1	10.5	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					床版補修
1186	多田川橋（上）	国道4号	1989	32	84.6	11.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1187	多田川橋（下）	国道4号	1987	34	84.6	11.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅱ							○							
1188	新江合川橋（下）	国道4号	1973	48	243.0	9.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□				□	床版補修
1189	沢田ご道橋（下）	国道4号	1974	47	22.6	9.5	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1190	八反田橋（下）	国道4号	1975	46	45.5	9.5	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□	□				床版補修
1191	末川橋	国道4号	1962	59	21.1	9.3	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1192	高泉橋	国道4号	1981	40	54.5	11.8	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1193	高清水橋	国道4号	1979	42	97.0	11.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□	□			部材交換
1194	高里橋	国道4号	1979	42	40.0	11.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅱ						○								
1195	留場橋	国道4号	1953	68	76.9	7.0	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	断面修復
1196	新荒瀬橋	国道4号	1962	59	128.0	8.2	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1197	常現寺橋	国道4号	1963	58	31.0	8.5	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1198	新達田橋	国道4号	1962	59	132.0	7.7	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1199	金鶏橋	国道4号	1957	64	21.5	8.1	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1200	青竜橋	国道4号	1964	57	24.6	9.1	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅲ						○			□					支承取替
1201	有壁ご線橋	国道4号	1965	56	102.8	8.2	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1202	長堀川橋（下）	国道4号	1986	35	23.9	11.8	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1203	長堀川橋（上）	国道4号	1986	35	23.9	11.8	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1204	古川第３号溝橋	国道4号	1974	47	8.4	21.8	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1205	中蝦沢橋	国道4号	1963	58	9.4	8.7	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H30	Ⅱ								○						
1206	小山田橋	国道4号	1961	60	10.5	9.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1207	蟹沢橋	国道4号	1961	60	11.5	9.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					伸縮装置補修
1208	八ツ沢橋（下）	国道4号	1961	60	8.5	10.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1209	八ツ沢橋（上）	国道4号	1961	60	8.5	13.2	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1210	神田橋	国道4号	1961	60	12.5	11.4	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1211	荻沢川橋	国道4号	1960	61	11.4	9.7	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1212	伊豆野堰橋	国道4号	1960	61	13.5	9.1	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1213	渋川橋	国道4号	1962	59	10.5	9.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1214	鉄五郎橋	国道4号	1962	59	10.5	9.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1215	小屋敷橋	国道4号	1963	58	12.6	8.8	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□			□	断面修復

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1216	下江橋	国道4号	1963	58	15.6	9.2	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	断面修復
1217	床版橋	国道4号	1962	59	2.6	9.8	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1218	沢辺ご線橋	国道4号	1964	57	11.3	9.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1219	かなぬま橋	国道4号	1963	58	7.4	14.8	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1220	荒崎橋	国道4号	1963	58	4.6	9.0	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1221	竜崎橋	国道4号	1963	58	7.3	8.0	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1222	新金成橋	国道4号	1963	58	9.4	9.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅲ						○			□					断面修復
1223	小褄橋	国道4号	1964	57	5.3	8.1	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1224	大日向橋	国道4号	1964	57	5.3	9.6	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1225	仙台大崎市第二溝橋	国道4号	1963	58	3.2	9.5	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1226	金留橋	国道4号	1964	57	15.6	9.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅲ							○		□	□				部材交換
1227	新田橋	国道47号	1976	45	6.3	22.2	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1228	清水川橋	国道47号	1957	64	8.7	8.1	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1229	荒雄橋	国道108号	1949	72	115.0	5.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□	□				伸縮装置取替
1230	関根橋	国道108号	1958	63	4.0	9.5	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅱ							○							
1231	鹿島橋	国道108号	1922	99	3.5	10.2	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1232	御免橋	国道108号	1920	101	2.9	9.0	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅲ							○					□	□	断面修復
1233	諏訪橋	国道108号	1965	56	6.3	9.5	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1234	三本木溝橋（上）	国道4号	1968	53	11.0	12.2	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H30	Ⅱ								○						
1235	三本木溝橋（下）	国道4号	1998	23	12.3	11.8	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H30	Ⅱ								○						
1236	古川ご線橋	国道4号	1973	48	12.5	20.1	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1237	中江橋	国道4号	1969	52	6.0	9.6	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅲ							○					□	□	断面修復
1238	渋江橋	国道108号	1928	93	2.6	7.5	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅱ							○							
1239	停車場車橋	国道108号	1928	93	2.5	7.3	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1240	二又橋	国道108号	1931	90	4.0	7.4	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1241	斉勝川橋（上）	国道48号	1986	35	36.5	11.8	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1242	花京院ご線橋	国道45号	1951	70	23.1	18.2	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ						○								
1243	仙台青葉区溝橋１	国道48号	1953	68	3.0	6.3	RC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1244	熊ケ根橋	国道48号	2005	16	138.0	14.4	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1245	鳳鳴ご線橋	国道48号	1965	56	32.9	8.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ						○								
1246	湯渡戸橋	国道48号	1953	68	96.7	6.1	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						架替
1247	泉橋	国道48号	1959	62	47.4	7.6	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅲ	当て板補強					○			□					当て板補強
1248	大楠條橋	国道48号	1966	55	15.6	8.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1249	桂沢橋	国道48号	1967	54	42.4	8.7	混合橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅲ						○			□	□				伸縮装置取替
1250	鍋越橋	国道48号	1958	63	28.6	8.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○			□				伸縮装置取替
1251	御伊勢沢橋	国道48号	1962	59	17.1	8.2	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○		□	□				支承取替
1252	仲ノ瀬橋（下）	国道48号	1983	38	239.0	12.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
1253	仲ノ瀬橋（上）	国道48号	1983	38	239.0	6.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						□ 床版補修
1254	綱木ランプ橋	国道48号	1976	45	26.0	11.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1255	愛子ご線橋	国道48号	1965	56	12.0	8.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ						○								
1256	堀切橋	国道48号	1963	58	6.8	7.7	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ							○							
1257	檜橋	国道48号	1957	64	6.8	8.8	RC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1258	新鎌倉橋	国道48号	1998	23	17.7	13.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ						○								
1259	元木橋	国道48号	1962	59	8.0	8.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1260	久左衛門橋	国道48号	1966	55	14.9	9.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○				□				断面修復

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1261	第一中の目橋	国道48号	1967	54	12.5	8.2	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1262	第二中の目橋	国道48号	1967	54	13.5	8.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○			□				断面修復
1263	欄塔沢橋	国道48号	1960	61	7.7	9.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1264	郷六橋（下）	国道48号	1986	35	92.0	9.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○							架替
1265	郷六橋（上）	国道48号	1973	48	101.0	9.5	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○							架替
1266	綱木ご道橋（上）	国道48号	1988	33	67.8	13.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
1267	綱木ご道橋（下）	国道48号	1982	39	67.8	13.3	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1268	折立ランプ橋	国道48号	1975	46	30.5	8.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1269	折立ご道橋（上）	国道48号	1988	33	39.8	9.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅲ						○				□				断面修復
1270	折立ご道橋（下）	国道48号	1988	33	39.8	9.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
1271	折立西ご道橋（上）	国道48号	1989	32	15.0	11.5	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1272	折立西ご道橋（下）	国道48号	1989	32	15.0	14.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1273	下野目橋	国道47号	1958	63	30.1	7.0	RC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1274	新岩出山大橋	国道47号	1977	44	339.1	11.5	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅱ							○							
1275	成沢橋	国道47号	1963	58	56.0	6.8	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○						□				断面修復
1276	水無橋	国道47号	1963	58	19.0	7.3	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ	床版防水	R1	Ⅰ	○										
1277	大谷橋	国道47号	1971	50	85.9	8.3	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○						□				□	当て板補強
1278	花渕橋	国道47号	1968	53	32.6	7.8	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1279	小深沢橋	国道47号	1960	61	50.6	5.6	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○					□	□			当て板補強
1280	大深沢橋	国道47号	1962	59	99.7	8.7	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1281	杵沢橋	国道47号	1962	59	25.0	6.6	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H30	Ⅱ								○						
1282	沙坂橋	国道47号	1971	50	17.0	8.0	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○					□					塗替塗装
1283	宿橋	国道47号	1970	51	15.7	8.0	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1284	軽井沢橋	国道47号	1970	51	17.0	8.7	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅲ						○				□				断面修復
1285	新川渡大橋	国道47号	1984	37	318.5	11.8	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅲ							○			□				床版取替
1286	岩出山ご線橋	国道47号	1969	52	32.0	8.4	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1287	小深田１号橋	国道47号	1935	86	3.4	11.5	RC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1288	下宮橋	国道47号	1937	84	7.0	8.1	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1289	松川原２号橋	国道47号	1938	83	11.0	14.5	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ						○								
1290	上宮橋	国道47号	1938	83	9.3	5.3	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1291	砂川原橋	国道47号	1995	26	11.6	15.0	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1292	第２号橋	国道47号	1970	51	5.3	8.2	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1293	第４号橋	国道47号	1970	51	5.3	8.5	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1294	名取大橋側道橋	国道4号	1979	42	541.1	2.8	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1295	笊川橋側道橋	国道4号	1985	36	46.4	1.9	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ									○					
1296	愛宕橋側道橋（上）	国道4号	1982	39	28.0	1.4	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										□	当て板補強
1297	大黒橋側道橋（下）	国道4号	1981	40	22.1	1.4	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ									○					
1298	大黒橋側道橋（上）	国道4号	1981	40	22.1	1.4	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ									○					
1299	第二清水川橋側道橋（上）	国道4号	1965	56	7.3	2.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1300	第二清水川橋側道橋（下）	国道4号	1965	56	7.3	2.5	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1301	郡山第一号溝橋側道橋	国道4号	1963	58	9.8	1.8	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ							○							
1302	上横前橋側道橋（上）	国道4号	1959	62	5.0	1.5	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅱ							○							
1303	新荒町橋側道橋（下）	国道45号	1970	51	5.3	1.8	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1304	たまち橋側道橋（下）	国道45号	1970	51	4.7	2.0	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1305	追分橋側道橋	国道45号	1970	51	10.6	1.4	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□	□		□		部材交換

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1306	ころびいし橋側道橋	国道45号	1976	45	4.5	1.1	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1307	磯の沢橋側道橋（下）	国道45号	1983	38	27.5	1.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅱ								○						
1308	平井田橋側道橋	国道45号	1976	45	7.2	2.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅰ						○								
1309	大畠橋側道橋（下）	国道45号	1971	50	17.0	1.4	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1310	大天馬橋側道橋（下）	国道45号	1962	59	17.0	1.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅰ								○						
1311	大天馬橋側道橋（上）	国道45号	1962	59	17.0	1.1	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅱ								○						
1312	新桜橋側道橋（下）	国道45号	1980	41	23.0	1.4	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
1313	歌津１号溝橋側道橋	国道45号	1972	49	7.3	1.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1314	歌津２号溝橋側道橋（上）	国道45号	1972	49	20.0	1.4	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅱ	撤去													
1315	歌津２号溝橋側道橋（下）	国道45号	1972	49	17.3	1.4	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅲ	撤去													
1316	蔵内ご線橋側道橋	国道45号	1984	37	21	1.7	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅲ						○				□				当て板補強
1317	大沢橋側道橋	国道45号	1977	44	20	1.4	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1318	沖の田橋側道橋	国道45号	1974	47	23.5	1.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅲ							○							架替
1319	五ツ橋側道橋（下）	国道45号	1968	53	7.5	1.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅱ						○								
1320	五ツ橋側道橋（上）	国道45号	1968	53	7.3	1.4	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1321	新館橋側道橋	国道45号	1985	36	25.0	1.8	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1322	上下堤橋側道橋（下）	国道45号	1984	37	14.0	1.0	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1323	定川橋側道橋（下）	国道45号	1986	35	80.0	1.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅰ								○						
1324	定川橋側道橋（上）	国道45号	1986	35	80.0	1.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H30	Ⅰ								○						
1325	柳目２号橋側道橋（上）	国道45号	1955	66	5.3	1.6	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1326	蛇田２号橋側道橋（下）	国道45号	1987	34	13.6	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ							○							
1327	鹿又１号橋側道橋（下）	国道45号	1985	36	10.0	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ							○							
1328	鹿又１号橋側道橋（上）	国道45号	1986	35	9.4	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ							○							
1329	鹿又２号橋側道橋（下）	国道45号	1985	36	10.8	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○							
1330	鹿又２号橋側道橋（上）	国道45号	1986	35	11.4	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○							
1331	鹿又３号橋側道橋（下）	国道45号	1985	36	10.8	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○							
1332	鹿又３号橋側道橋（上）	国道45号	1986	35	9.4	2.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○							
1333	鹿又ご線橋側道橋（下）	国道45号	1982	39	34.0	2.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ							○							
1334	天王橋側道橋（下）	国道45号	1976	45	367.7	2.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H29	Ⅲ	撤去													
1335	南沢橋側道橋（上）	国道45号	1980	41	36.0	2.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	登米市	H29	Ⅱ							○							
1336	新北沢橋側道橋（上）	国道45号	1982	39	31.3	1.8	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	登米市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1337	柳橋側道橋	国道108号	1978	43	12.6	1.1	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1338	桶場橋側道橋	国道108号	1961	60	8.5	1.8	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1339	大拘橋側道橋（下）	国道108号	1991	30	15.0	1.8	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1340	大拘橋側道橋（上）	国道108号	1991	30	6.2	1.4	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1341	筒頭橋側道橋（上）	国道108号	1984	37	11.4	1.4	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1342	筒頭橋側道橋（下）	国道108号	1988	33	12.0	1.8	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1343	樋ノ口橋側道橋	国道108号	1980	41	11.5	1.9	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅲ						○			□	□				当て板補強
1344	小谷橋側道橋	国道108号	1954	67	4.7	1.5	RC		仙台	古川	宮城県	涌谷町	H28	Ⅱ						○								
1345	坂元ご道橋側道橋（下）	国道6号	1983	38	17.5	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1346	戸花橋側道橋（下）	国道6号	1980	41	23.4	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1347	高瀬橋側道橋（上）	国道6号	1963	58	7.7	1.6	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1348	高瀬橋側道橋（下）	国道6号	1963	58	11.4	1.6	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1349	新田橋側道橋（下）	国道6号	1980	41	16.7	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1350	新田ご道橋側道橋（下）	国道6号	1980	41	14.8	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1351	山下ご道橋側道橋（下）	国道6号	1963	58	5.5	1.6	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ							○							
1352	物見橋側道橋（下）	国道6号	1963	58	7.4	2.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1353	鷲足橋側道橋（下）	国道6号	1964	57	5.5	2.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1354	木崎橋側道橋（下）	国道6号	1964	57	7.5	1.6	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H29	Ⅰ							○							
1355	横山ご道橋側道橋（下）	国道6号	1965	56	16.0	1.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1356	第一号長瀞橋側道橋（下）	国道6号	1999	22	2.7	1.0	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅱ						○								
1357	第二号長瀞橋側道橋	国道6号	1999	22	2.2	1.1	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅱ						○								
1358	第三号長瀞橋側道橋（下）	国道6号	1999	22	2.1	1.0	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅱ						○								
1359	第三号長瀞橋側道橋（上）	国道6号	1999	22	2.1	1.1	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅲ						○			□					床版補修
1360	雪穴沢橋側道橋（上）	国道6号	1980	41	21.4	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅱ								○						
1361	雪穴沢橋側道橋（下）	国道6号	1987	34	20.0	1.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅱ								○						
1362	亘理第四号函渠側道橋	国道6号	1979	42	10.3	1.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○								
1363	亘理ご線橋側道橋（下）	国道6号	1979	42	57.5	1.8	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H27	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○					□					断面修復
1364	大太郎川橋側道橋	国道4号	1990	31	33.0	2.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1365	新増田川橋側道橋（下）	国道4号	1980	41	28.0	1.8	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1366	新増田川橋側道橋（上）	国道4号	1986	35	27.8	1.8	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅱ						○								
1367	向田橋側道橋	国道4号	1997	24	13.1	2.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ						○								
1368	大平第二号橋側道橋	国道4号	1967	54	2.9	1.8	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1369	機関場橋側道橋（上）	国道4号	1963	58	11.0	2.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H29	Ⅰ							○							
1370	機関場橋側道橋（下）	国道4号	1963	58	17.2	1.6	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H29	Ⅰ							○							
1371	梶橋第３号橋側道橋	国道4号	1961	60	5.5	1.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1372	三河堀橋側道橋（下）	国道4号	1961	60	6.1	1.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1373	三河堀橋側道橋（上）	国道4号	1961	60	5.5	1.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1374	志賀沢橋側道橋（上）	国道4号	1961	60	13.5	2.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1375	志賀沢橋側道橋（下）	国道4号	1961	60	11.7	2.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1376	川内沢橋側道橋（上）	国道4号	1961	60	13.5	6.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1377	川内沢橋側道橋（下）	国道4号	1961	60	11.7	2.8	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
1378	植松橋側道橋	国道4号	1961	60	4.2	3.9	RC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H29	Ⅱ							○							
1379	宮下橋側道橋	国道4号	1961	60	5.9	1.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅰ						○								
1380	名取第一号溝橋側道橋	国道4号	1961	60	5.5	2.2	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1381	名取第四号溝橋側道橋（上）	国道4号	1963	58	5.1	1.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1382	名取第四号溝橋側道橋（下）	国道4号	1963	58	5.1	1.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	名取市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1383	荒井橋側道橋（上）	国道6号	1995	26	28.2	2.4	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	山元町	H30	Ⅱ								○						
1384	末川橋側道橋（上）	国道4号	1965	56	22.2	1.4	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1385	末川橋側道橋（下）	国道4号	1965	56	22.2	1.4	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1386	留場橋側道橋（下）	国道4号	1971	50	76.8	1.3	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1387	留場橋側道橋（上）	国道4号	1971	50	76.8	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H26	Ⅲ	部材交換	R1	Ⅰ	○										
1388	新荒瀬橋側道橋	国道4号	1986	35	127.9	1.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅲ	部材交換					○			□	□	□			当て板補強
1389	常現寺橋側道橋	国道4号	1986	35	32.5	1.6	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1390	新達田橋側道橋	国道4号	1986	35	131.2	1.8	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1391	金鶏橋側道橋	国道4号	1978	43	20.5	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1392	青竜橋側道橋（上）	国道4号	1988	33	24.6	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1393	青竜橋側道橋（下）	国道4号	1978	43	30.6	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅲ						○			□					断面修復
1394	中蝦沢橋側道橋	国道4号	1980	41	15.5	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H30	Ⅲ								○					□	支承補修
1395	小山田橋（小山田橋側道橋）	国道4号	1965	56	11.3	2.2	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1396	蟹沢橋側道橋	国道4号	1969	52	15.5	1.5	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1397	神田橋側道橋	国道4号	1963	58	13.2	2.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1398	荻沢橋側道橋	国道4号	1982	39	16.2	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅱ						○								
1399	伊豆野堰橋側道橋（上）	国道4号	1974	47	13.5	1.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1400	伊豆野堰橋側道橋（下）	国道4号	1974	47	13.5	1.3	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○									架替
1401	渋川橋側道橋（上）	国道4号	2002	19	10.5	2.1	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1402	渋川橋側道橋（下）	国道4号	2002	19	10.5	2.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1403	鉄五郎橋側道橋	国道4号	1965	56	15.0	1.5	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1404	小屋敷橋側道橋	国道4号	1969	52	17.7	1.6	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1405	下江橋側道橋	国道4号	1969	52	21.7	1.6	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1406	床版橋側道橋	国道4号	1967	54	4.0	0.9	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1407	沢辺ご線橋側道橋	国道4号	1986	35	33.0	2.0	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1408	竜崎橋側道橋	国道4号	1967	54	6.5	1.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1409	新金成橋側道橋	国道4号	1968	53	9.3	1.4	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1410	小褄橋側道橋（下）	国道4号	1969	52	9.7	1.4	鋼橋		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅲ							○				□	□		床版取替
1411	小褄橋側道橋（上）	国道4号	1968	53	12.3	2.3	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1412	大日向橋側道橋	国道4号	1968	53	6.4	1.0	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅰ							○							
1413	仙台名取市第二溝橋側道橋	国道4号	1966	55	5.0	1.6	RC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1414	清水川橋側道橋	国道47号	1960	61	7.2	2.2	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1415	荒雄橋側道橋（上）	国道108号	1971	50	116.0	1.7	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1416	荒雄橋側道橋（下）	国道108号	1971	50	116.0	1.9	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○					□	□			当て板補強
1417	中江橋側道橋	国道4号	1979	42	6.9	1.0	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H29	Ⅱ							○							
1418	仙台青葉区溝橋側道橋（上）	国道48号	1969	52	2.2	1.7	RC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1419	鳳鳴ご線橋側道橋	国道48号	1981	40	63.4	2.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ						○								
1420	湯渡戸橋側道橋	国道48号	1978	43	96.7	1.6	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						架替
1421	愛子ご線橋側道橋（上）	国道48号	1976	45	21.5	1.3	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ						○								
1422	堀切橋側道橋（上）	国道48号	1983	38	7.0	0.9	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○				□	□		塗替塗装
1423	堀切橋側道橋（下）	国道48号	1983	38	10.9	2.0	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○				□	□		支承取替
1424	檜橋側道橋（上）	国道48号	2004	17	11.5	1.4	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○				□	□		部材交換
1425	元木橋側道橋	国道48号	1963	58	14.5	2.2	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ							○							
1426	下野目橋側道橋（下）	国道47号	1984	37	30.6	2.0	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H29	Ⅱ							○							
1427	水無橋側道橋	国道47号	1969	52	19.0	1.7	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅲ	部材交換	R1	Ⅲ	○					□				□	塗替塗装
1428	花渕橋側道橋	国道47号	1973	48	39.6	1.8	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1429	小深沢橋側道橋	国道47号	1973	48	58.0	1.7	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1430	杵沢橋側道橋	国道47号	1971	50	34.9	1.7	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H30	Ⅱ								○						
1431	沙坂橋側道橋	国道47号	1971	50	16.9	1.7	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1432	宿橋側道橋	国道47号	1978	43	15.7	1.4	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1433	岩出山ご線橋側道橋	国道47号	1983	38	44.0	1.4	鋼橋		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1434	下一栗橋側道橋	国道47号	1929	92	8.4	1.4	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1435	田中橋側道橋	国道47号	1962	59	5.9	1.7	RC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1436	小深田二号橋側道橋	国道47号	1935	86	5.0	1.5	RC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1437	下宮橋側道橋	国道47号	1937	84	7.0	1.7	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1438	上宮橋側道橋	国道47号	1938	83	9.3	1.6	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1439	踏切橋	国道45号	1972	49	5.1	19.0	RC		仙台	仙台東	宮城県	多賀城市	H29	Ⅱ							○							
1440	夏崎橋側道橋	国道45号	2000	21	13.4	4.6	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1441	下夏崎側道橋	国道45号	2000	21	14.4	3.7	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H29	Ⅱ							○							
1442	清水ご道橋	国道45号	1971	50	34.0	7.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H28	Ⅱ						○								
1443	本吉ご道橋	国道45号	1971	50	31.0	7.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1444	風越ご道橋	国道45号	1996	25	41.8	7.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅱ								○						
1445	岩月ご道橋	国道45号	1989	32	37.5	7.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1446	松崎ご道橋	国道45号	1988	33	42.4	7.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅱ								○						
1447	気仙沼ご道橋	国道45号	1988	33	30.0	7.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1448	山根ご道橋	国道4号	1973	48	58.6	4.1	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1449	狐沢ご道橋	国道4号	1973	48	53.2	4.1	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1450	仲ノ瀬橋（上）ランプ	国道48号	1979	42	163.0	11.8	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						□	断面修復
1451	斉勝川橋（下）	国道48号	2004	17	36.5	11.8	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ							○							
1452	鎌倉側道橋	国道48号	1977	44	11.0	4.7	RC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1453	仲の瀬橋（終点ＲＣランプ）	国道48号	1984	37	74.9	15.0	RC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1454	滝岸ご道橋	国道47号	2003	18	20.7	7.0	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1455	境川橋	国道47号	2003	18	39.9	7.0	PC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1456	大谷橋側道橋	国道47号	1933	88	53.6	1.0	RC		仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1457	沢田ご道橋（上）	国道4号	2002	19	22.5	10.5	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1458	新田橋（上）	E45	1993	28	150.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ	伸縮装置取替	R1	Ⅰ	○										
1459	高松橋（上）	E45	1994	27	134.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○							□			□	塗替塗装
1460	旗沢橋（上）	E45	1993	28	160.0	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅱ	○										
1461	上小松橋（上）	E45	1993	28	141.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1462	三間堀橋（上）	E45	1993	28	19.2	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅱ							○							
1463	小松ご道橋（上）	E45	1996	25	26.9	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅰ								○						
1464	小松一号ご道橋（上）	E45	1995	26	20.1	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅱ							○							
1465	小松二号ご道橋（上）	E45	1996	25	20.0	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ								○						
1466	小松三号ご道橋（上）	E45	1996	25	18.9	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ								○						
1467	小松四号ご道橋（上）	E45	1996	25	20.9	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ								○						
1468	矢本大橋（上）	E45	1996	25	126.8	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ								○						
1469	川前ご道橋（上）	E45	1996	25	24.6	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅱ								○						
1470	赤井堀ランプ橋（ＯＮ）	E45	1996	25	17.5	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1471	赤井堀橋（上）	E45	1996	25	17.7	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										□	断面修復
1472	赤井ご道橋（上）	E45	1996	25	27.4	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○								
1473	川南ご道橋（上）	E45	1996	25	24.0	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1474	崎山橋（上）	E45	2007	14	34.8	11.9	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1475	稲荷橋（上）	E45	2007	14	63.0	10.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅲ	部材交換	R1	Ⅲ	○									□		当て板補強
1476	山居沢橋（上）	E45	2007	14	96.0	10.2	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1477	桃生ＩＣ橋	E45	2007	14	21.8	15.2	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
1478	梅田川橋側道橋（上）	国道4号	2006	15	144.0	3.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						□	部材交換
1479	梅田川橋側道橋（下）	国道4号	2006	15	139.0	3.5	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅲ								○						□	部材交換
1480	鳴瀬奥松島ＩＣ橋（Ｃランプ）	E45	1996	25	36.0	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ						○					□			断面修復
1481	鳴瀬奥松島大橋（上）	E45	1996	25	410.5	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○							□		□		断面修復
1482	鳴瀬奥松島大橋（下）	E45	1996	25	415.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅲ	○							□		□		断面修復
1483	蛇田ご道橋（上）	E45	2003	18	37.0	10.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1484	福村ご道橋（上）	E45	2003	18	30.0	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1485	深田ご道橋（上）	E45	2003	18	33.2	10.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1486	曽波神高架橋（上）	E45	2002	19	514.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ							○							
1487	鹿又ご道橋（上）	E45	2001	20	54.0	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1488	鹿又高架橋（上）	E45	2001	20	473.6	9.3	RC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1489	新天王橋（上）	E45	2002	19	426.6	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ								○						
1490	松沢橋側道橋（下）	国道4号	1963	58	5.0	1.9	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1491	斉川第二号橋側道橋（下）	国道4号	1999	22	3.8	1.6	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1492	斎川第三号橋側道橋（下）	国道4号	1962	59	3.0	1.4	PC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅰ							○							
1493	新白石大橋（下）	国道4号	2004	17	280.9	11.3	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H29	Ⅱ							○							
1494	第一号吉田橋側道橋（下）	国道6号	2004	17	3.4	1.5	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1495	第二号吉田橋側道橋（下）	国道6号	2004	17	4.4	0.7	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1496	第三号吉田橋側道橋（下）	国道6号	2004	17	3.9	1.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1497	亘理第一号溝橋側道橋（上）	国道6号	2004	17	10.5	3.0	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H29	Ⅰ							○							
1498	亘理第二号溝橋側道橋（上）	国道6号	2004	17	3.6	1.3	PC		仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H30	Ⅰ								○						
1499	上横前橋	国道4号	1971	50	2.8	10.2	RC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅰ							○							
1500	新江合川橋（上）	国道4号	2004	17	243.0	9.2	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1501	八反田橋（上）	国道4号	2004	17	45.4	9.2	PC		仙台	古川	宮城県	大崎市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1502	越の浦橋側道橋（下）	国道45号	1969	52	15.0	2.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	塩竈市	H29	Ⅱ							○							
1503	渋江橋側道橋（上）	国道108号	1999	22	2.8	1.0	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅱ							○							
1504	二又橋側道橋（上）	国道108号	1956	65	4.9	1.9	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1505	関根橋側道橋（下）	国道108号	1958	63	3.8	2.3	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1506	御免橋側道橋（下）	国道108号	1999	22	3.2	2.1	RC		仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅰ							○							
1507	白石高架橋（下）	国道4号	2005	16	147.6	10.5	RC		仙台	岩沼	宮城県	白石市	H30	Ⅱ								○						
1508	高野川橋	国道4号	2004	17	26.8	39.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1509	小鶴ご道橋（上）	国道4号	2004	17	35.9	12.1	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1510	小鶴ご道橋（下）	国道4号	2004	17	35.9	12.1	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅱ								○						
1511	荒川橋	国道4号	2007	14	24.4	7.8	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1512	内南沢ご道橋	国道4号	2007	14	33.2	12.7	PC		仙台	古川	宮城県	栗原市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1513	小松ご道橋（下）	E45	1996	25	26.9	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H30	Ⅰ								○						
1514	赤井ご道橋（下）	E45	1996	25	27.4	9.3	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ						○								
1515	鳴瀬奥松島ＩＣ橋（Dランプ）	E45	1996	25	36.0	6.8	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅲ							○				□			断面修復
1516	蛇田ご道橋（下）	E45	2003	18	37.0	14.8	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1517	福村ご道橋（下）	E45	2003	18	30.0	10.6	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1518	赤井堀ランプ橋（ＯＦＦ）	E45	1996	25	17.5	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1519	赤井堀橋（下）	E45	1996	25	17.7	9.3	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1520	蔵王大橋（上）	国道4号	2004	17	285.4	10.5	鋼橋		仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1521	日高見大橋	E45	2006	15	825.0	9.5	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1522	成沢橋	E45	2004	17	45.0	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1523	日野渡橋（下）	E45	2007	14	72.1	9.0	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1524	新米谷大橋	E45	2009	12	522.0	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H28	Ⅲ						○			□	□				支承補修
1525	赤井橋（上）	国道45号	1984	37	10.2	11.0	PC		仙台	石巻	宮城県	東松島市	H26	Ⅲ	ひびわれ補修	R1	Ⅱ	○					□					断面修復
1526	桃生北ＩＣ橋Ａランプ橋	E45	2007	14	20.8	7.2	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1527	桃生北ＩＣ橋	E45	2007	14	20.8	12.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1528	日野渡橋（上）	E45	2008	13	89.2	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1529	赤井堀橋	国道108号	2008	13	22.5	10.0	PC		仙台	石巻	宮城県	石巻市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1530	吉童橋（上）	国道4号	2010	11	53.6	12.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1531	塩浪橋（下）	国道4号	2008	13	36.7	12.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅰ							○							
1532	五郎兵衛橋（上）	国道4号	2010	11	22.0	12.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅰ							○							
1533	五郎兵衛橋（下）	国道4号	2008	13	22.0	14.3	PC		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H29	Ⅰ							○							
1534	子の島橋側道橋	国道45号	2010	11	12.0	2.0	PC		仙台	仙台東	宮城県	利府町	H29	Ⅰ							○							
1535	只越大橋	E45	2008	13	95.0	9.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							
1536	小原木橋	E45	2006	15	11.5	12.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H29	Ⅱ							○							
1537	登米ＩＣ橋（上）	E45	2008	13	30.0	10.5	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H28	Ⅰ						○								
1538	登米ＩＣ橋（下）	E45	2008	13	30.0	10.5	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H28	Ⅱ						○								
1539	三間堀橋（下）	E45	2010	11	19.2	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ							○							
1540	小松一号ご道橋（下）	E45	2010	11	20.1	10.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ							○							
1541	相生橋	国道48号	2010	11	50.0	10.5	鋼橋		仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ							○							
1542	諏訪橋側道橋（上）	国道108号	2010	11	9.2	1.5	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1543	諏訪橋側道橋（下）	国道108号	2010	11	7.0	1.5	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H29	Ⅰ							○							
1544	小梨屋溝橋	国道45号	1977	44	2.5	6.1	RC		仙台	仙台東	宮城県	松島町	H28	Ⅲ						○			□					断面修復
1545	小梨屋橋	国道45号	1977	44	12.5	1.7	PC		仙台	仙台東	宮城県	松島町	H28	Ⅱ						○								
1546	遠見塚側道橋（上）	国道4号	1979	42	13.7	1.3	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○								
1547	遠見塚側道橋（下）	国道4号	1979	42	12.9	1.8	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ						○								
1548	塩浪橋側道橋	国道4号	2010	11	39.5	3.3	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	大衡村	H28	Ⅱ						○								
1549	須賀橋側道橋	国道45号	2008	13	20.5	1.8	鋼橋		仙台	仙台東	宮城県	利府町	H30	Ⅰ								○						
1550	李埣跨線橋	国道108号	2012	9	163.0	10.5	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1551	新荒雄橋	国道108号	2012	9	133.4	14.3	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1552	八乙女橋側道橋（上）	国道4号	2008	13	18.4	2.4	PC		仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H30	Ⅰ								○						
1553	岩－１ボックス	国道4号	1962	59	3.6	14.3	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1554	岩－２ボックス	国道4号	1962	59	3.8	16.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1555	岩－３ボックス	国道4号	1962	59	2.0	16.1	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1556	岩－４ボックス	国道4号	1978	43	2.5	23.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅲ						○			□					ひびわれ補修
1557	岩－５ボックス	国道4号	2005	16	2.5	20.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1558	岩－８ボックス	国道4号	1977	44	3.5	22.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1559	岩－９ボックス	国道4号	1982	39	3.0	29.1	－	○	仙台	岩沼	宮城県	白石市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1560	岩－１０（井戸井前地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	22.7	－	○	仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1561	岩－１１ボックス	国道4号	1975	46	2.5	22.7	－	○	仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1562	岩－１２（新西川地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	22.6	－	○	仙台	岩沼	宮城県	蔵王町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1563	岩－１３（中川原地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	31.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1564	岩－１４（旧金ヶ瀬地下道）地下道	国道4号	1975	46	2.0	33.4	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅲ	断面修復					○			□	□				断面修復
1565	岩－１５（金ヶ瀬地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	22.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1566	岩－１６（大河原１号地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	27.6	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1567	岩－１７（大型函渠）ボックス	国道4号	1975	46	6.6	32.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1568	岩－１８（大河原２号地下道）地下道	国道4号	1975	46	3.0	24.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
1569	岩－１９（大河原３号地下道）地下道	国道4号	1994	27	3.0	27.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1570	岩－２０（大河原４号地下道）地下道	国道4号	1994	27	3.0	27.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1571	岩－２１（大河原５号地下）地下道	国道4号	1994	27	3.0	24.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1572	岩－２２ボックス	国道4号	1994	27	4.5	25.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	大河原町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1573	岩－２３（船迫１号地下道）地下道	国道4号	1983	38	3.0	40.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1574	岩－２４（船迫２号地下道）地下道	国道4号	1983	38	3.0	45.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
1575	岩－２５（船迫３号地下道）地下道	国道4号	1983	38	3.0	30.1	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1576	岩－２６（船迫４号地下道）地下道	国道4号	1983	38	3.0	25.3	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1577	岩－２７（船迫５号地下道）地下道	国道4号	1983	38	3.0	26.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1578	岩－２８ボックス	国道4号	1983	38	2.5	36.2	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1579	岩－２９ボックス	国道4号	1983	38	2.5	26.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1580	岩－３０ボックス	国道4号	1983	38	3.0	38.7	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1581	岩－３１ボックス	国道4号	1983	38	5.0	35.2	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1582	岩－３２ボックス	国道4号	1983	38	3.0	24.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1583	岩－３４（大型函渠）ボックス	国道4号	1988	33	8.5	46.4	－	○	仙台	岩沼	宮城県	柴田町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1584	岩－３５（南長谷地下道）地下道	国道4号	1963	58	3.2	34.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1585	岩－３６（玉崎１号地下道）地下道	国道4号	1963	58	3.0	22.7	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1586	岩－３７（玉崎２号地下横断歩道）地下道	国道4号	1963	58	3.0	34.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1587	岩－３９ボックス	国道4号	1963	58	3.0	23.2	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1588	岩－４０（吹上地下道）地下道	国道4号	1963	58	2.5	34.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1589	岩－４１（桑原地下横断歩道）地下道	国道4号	1963	58	2.5	26.2	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1590	岩－４２（桜地下道）地下道	国道4号	1961	60	3.0	39.9	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市	H28	Ⅱ						○							
1591	岩－４４（増田地下道）地下道	国道4号	1963	58	3.0	28.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	名取市	H28	Ⅱ						○							
1592	岩－４５－１（大型函渠）ボックス	国道6号	1995	26	3.0	19.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅱ						○							
1593	岩－４５－２（大型函渠）ボックス	国道6号	1995	26	6.8	2.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅰ						○							
1594	岩－４８ボックス	国道6号	1963	58	3.5	14.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅱ						○							
1595	岩－４９ボックス	国道6号	1963	58	3.5	14.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅱ						○							
1596	岩－５０ボックス	国道6号	1965	56	3.5	18.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	山元町	H28	Ⅲ						○			□				断面修復
1597	岩－５１ボックス	国道6号	1980	41	4.0	16.6	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅲ						○			□				断面修復
1598	岩－５２ボックス	国道6号	1970	51	4.0	20.0	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○							
1599	岩－５３ボックス	国道6号	1979	42	3.1	12.7	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅱ						○							
1600	岩－５５ボックス	国道6号	1964	57	3.0	19.8	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○							
1601	岩－５６ボックス	国道6号	1979	42	2.5	14.2	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○							
1602	岩－５７（大型函渠）ボックス	国道6号	1979	42	8.0	14.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	亘理町	H28	Ⅰ						○							
1603	東－１ボックス	国道4号	1963	58	7.6	34.6	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅲ						○			□	□			断面修復
1604	東－２ボックス	国道4号	1963	58	3.0	21.4	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
1605	東－３ボックス	国道4号	1963	58	3.0	14.5	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
1606	東－４ボックス	国道4号	1965	56	3.5	28.9	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
1607	東－５ボックス	国道4号	1965	56	3.5	30.1	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
1608	東－６ボックス	国道4号	1965	56	4.0	30.0	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
1609	東－７ボックス	国道4号	1974	47	3.0	43.8	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
1610	東－８（大型函渠）ボックス	国道4号	1972	49	6.5	42.3	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅲ						○			□	□			ひびわれ補修
1611	東－９（大型函渠）ボックス	国道4号	1969	52	7.0	42.6	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
1612	東－１２（大型函渠）ボックス	国道4号	1970	51	6.0	75.9	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1613	東－１４ボックス	国道4号	1974	47	4.0	23.4	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1614	東－１６ボックス	国道4号	1983	38	3.0	33.5	－	○	仙台	仙台東	宮城県	富谷市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1615	東－１７ボックス	国道4号	1996	25	4.5	26.9	－	○	仙台	仙台東	宮城県	大和町	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○								
1616	東－１８ボックス	国道4号	1993	28	5.0	26.3	－	○	仙台	仙台東	宮城県	大和町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1617	東－２０ボックス	国道45号	1957	64	2.5	30.5	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅱ						○							
1618	東－２１（大型函渠）ボックス	国道45号	1957	64	5.8	12.3	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ						○							
1619	東－２２（県道仙台亘理自転車道）地下道	国道45号	1957	64	3.0	23.3	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ						○							
1620	東－２３ボックス	国道45号	1957	64	5.1	24.4	－	○	仙台	仙台東	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ						○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1621	東－２４ボックス	国道45号	1976	45	2.5	13.7	－	○	仙台	仙台東	宮城県	松島町	H28	Ⅰ						○								
1622	西－８ボックス	国道48号	1986	35	2.5	29.1	－	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1623	西－１０ボックス	国道48号	1986	35	2.5	28.5	－	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1624	西－１１ボックス	国道48号	1986	35	5.0	25.9	－	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅰ						○								
1625	西－１２ボックス	国道48号	1965	56	4.6	30.0	－	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅱ						○								
1626	古－５（大型函渠）ボックス	国道4号	1987	34	6.5	26.5	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1627	古－６（大型函渠）ボックス	国道4号	1987	34	6.5	38.1	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1628	古－９ボックス	国道4号	1973	48	5.0	21.1	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1629	古－１１（城西地下道）地下道	国道4号	1973	48	3.0	23.7	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1630	古－１２（宮袋地下道）地下道	国道4号	1974	47	3.0	24.2	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1631	古－１３（ひかりのこみち）地下道	国道4号	1974	47	4.0	22.0	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1632	古－１４（福浦地下道）地下道	国道4号	1974	47	3.0	23.9	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1633	古－１５（福浦第２地下道）地下道	国道4号	1974	47	4.5	20.2	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1634	古－１６ボックス	国道4号	1974	47	5.0	23.5	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1635	古－１７ボックス	国道4号	1974	47	5.0	23.7	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1636	古－１８ボックス	国道4号	1974	47	4.0	34.3	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1637	古－１９ボックス	国道4号	1975	46	5.0	21.1	－	○	仙台	古川	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1638	古－２１（大型函渠）ボックス	国道4号	1981	40	6.5	28.2	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1639	古－２２ボックス	国道4号	1981	40	3.0	28.2	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1640	古－２５（大型函渠）ボックス	国道4号	1979	42	9.0	55.7	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1641	古－２８ボックス	国道4号	1961	60	3.5	40.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1642	古－２９（金成町沢辺地下道）地下道	国道4号	1962	59	2.0	10.1	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1643	古－３１ボックス	国道4号	1963	58	3.2	14.3	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1644	古－３３（くがね地下歩道）地下道	国道4号	1964	57	3.0	23.7	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1645	古－３５ボックス	国道4号	1965	56	3.2	14.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1646	古－３６ボックス	国道4号	1960	61	5.0	17.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1647	古－３８（大型函渠）ボックス	国道4号	2006	15	9.6	17.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1648	古－３９（大型函渠）ボックス	国道4号	1960	61	13.0	18.3	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1649	古－４０（大型函渠）ボックス	国道4号	1960	61	7.3	16.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市	H28	Ⅰ						○								
1650	古－４３（大型函渠）ボックス	国道108号	1991	30	7.0	25.8	－	○	仙台	古川	宮城県	涌谷町	H29	Ⅰ							○							
1651	古－４５ボックス	国道108号	2001	20	5.0	40.0	－	○	仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅲ							○					□	□	断面修復
1652	古－４７（大型函渠）ボックス	国道108号	1999	22	9.0	26.0	－	○	仙台	古川	宮城県	美里町	H29	Ⅱ							○							
1653	石－３ボックス	国道45号	1966	55	5.0	26.3	－	○	仙台	石巻	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1654	石－４ボックス	国道45号	1966	55	3.1	29.1	－	○	仙台	石巻	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1655	石－５（大型函渠）ボックス	国道45号	1953	68	11.3	44.9	－	○	仙台	石巻	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1656	石－６（大型函渠）ボックス	国道45号	1970	51	6.0	12.2	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1657	石－７ボックス	国道45号	2002	19	2.5	19.3	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1658	石－８ボックス	国道45号	2001	20	10.6	18.6	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1659	石－９（大型函渠）ボックス	国道45号	2001	20	7.5	21.7	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1660	石－１０（大型函渠）ボックス	国道45号	2001	20	10.6	20.3	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1661	石－１１（大型函渠）ボックス	国道45号	1976	45	7.4	20.6	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1662	石－１２（大型函渠）ボックス	国道45号	2004	17	7.5	13.3	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1663	石－１３ボックス	国道45号	2004	17	3.5	22.2	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1664	石－１５ボックス	国道45号	2004	17	2.5	21.2	－	○	仙台	石巻	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○								
1665	気－４ボックス	国道45号	1997	24	5.3	23.2	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1666	気－６（大型函渠）ボックス	国道45号	1997	24	8.5	21.7	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1667	気－７ボックス	国道45号	1967	54	3.0	25.9	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1668	気－８ボックス	国道45号	1986	35	4.0	34.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1669	気－９ボックス	国道45号	1986	35	3.5	28.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1670	気－１０（大型函渠）ボックス	国道45号	1986	35	8.5	28.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1671	気－１３ボックス	国道45号	1986	35	4.0	33.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1672	気－１５ボックス	国道45号	1988	33	4.0	34.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1673	気－１６（大型函渠）ボックス	国道45号	1988	33	8.5	30.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1674	気－１７ボックス	国道45号	1988	33	3.0	29.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1675	気－２０（大型函渠）ボックス	国道45号	1986	35	6.5	31.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1676	気－２２ボックス	国道45号	1986	35	3.0	30.5	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1677	気－２３（上田中地下道）地下道	国道45号	1986	35	3.0	33.9	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1678	気－２４（大型函渠）ボックス	国道45号	1979	42	5.5	29.3	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1679	気－２５（大型函渠）ボックス	国道45号	1979	42	8.6	36.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1680	気－２６ボックス	国道45号	1979	42	4.0	24.1	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1681	気－２８ボックス	国道45号	1984	37	4.5	17.3	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1682	気－３４ボックス	国道45号	1970	51	3.0	9.6	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅱ						○								
1683	気－３５ボックス	国道45号	1970	51	3.0	11.4	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1684	気－３７ボックス	国道45号	2006	15	4.0	16.0	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H28	Ⅰ						○								
1685	鳴－１（上古川地下道）地下道	国道47号	1976	45	3.0	24.8	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1686	鳴－２（塚目地下道）地下道	国道47号	1976	45	3.0	36.0	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1687	鳴－５ボックス	国道47号	1977	44	5.0	17.2	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1688	鳴－６（大型函渠）ボックス	国道47号	1977	44	9.0	16.2	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1689	鳴－７ボックス	国道47号	1977	44	4.0	17.4	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1690	鳴－１０ボックス	国道47号	1929	92	2.5	9.8	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅲ						○				□				断面修復
1691	鳴－１１（大型函渠）ボックス	国道47号	2003	18	6.0	13.5	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1692	鳴－１２（大型函渠）ボックス	国道47号	2003	18	8.0	28.8	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1693	鳴－１３ボックス	国道47号	2003	18	3.5	19.6	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1694	鳴－１４ボックス	国道47号	2003	18	3.5	22.1	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1695	鳴－１５（川渡地下道）地下道	国道47号	1984	37	2.9	18.5	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1696	鳴－１６ボックス	国道47号	1998	23	3.0	16.8	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1697	鳴－１７ボックス	国道47号	1984	37	3.0	20.6	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市	H28	Ⅰ						○								
1698	三－１（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.0	31.8	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ						○								
1699	三－２ボックス	E45	1993	28	3.5	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ						○								
1700	三－１２（大型函渠）ボックス	E45	1997	24	11.0	27.7	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H29	Ⅰ						○								
1701	三－１６（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.9	26.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1702	三－１７（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	10.1	17.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1703	三－１８（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	10.3	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1704	三－２０（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	13.1	26.1	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1705	三－２１（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	10.0	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1706	三－２４ボックス	E45	1997	24	10.0	25.2	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○								
1707	三－２７（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.2	36.1	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1708	三－２８（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.2	36.2	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1709	三－２９（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.2	10.8	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1710	三－３０（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	8.1	32.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○								

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1711	三－３３（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	13.3	25.1	－	○	仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1712	三－３４（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	10.7	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
1713	三－３５（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	9.9	27.3	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○								
1714	三－３６（大型函渠）ボックス	E45	2003	18	8.8	45.8	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1715	三－３７（大型函渠）ボックス	E45	1996	25	8.1	35.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○							
1716	三－４３（大型函渠）ボックス	E45	2001	20	7.7	16.4	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ							○						
1717	三－４４（大型函渠）ボックス	E45	2001	20	7.7	16.3	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○						
1718	三－４５（大型函渠）ボックス	E45	2001	20	10.0	28.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○						
1719	三－４６（大型函渠）ボックス	E45	2003	18	10.6	12.4	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1720	三－４７（大型函渠）ボックス	E45	2003	18	7.5	60.1	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○						
1721	三－４８（大型函渠）ボックス	E45	2003	18	8.8	19.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○							
1722	三－５２（大型函渠）ボックス	E45	2004	17	7.4	25.9	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1723	三－５３ボックス	E45	2005	16	5.0	13.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1724	三－５４（大型函渠）ボックス	E45	2005	16	8.5	31.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1725	三－５５（大型函渠）ボックス	E45	2006	15	6.5	15.2	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1726	三－５６（大型函渠）ボックス	E45	2005	16	10.3	13.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1727	三－５７（大型函渠）ボックス	E45	2005	16	6.0	13.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1728	三－６０ボックス	E45	2006	15	3.0	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1729	三－６４（大型函渠）ボックス	E45	2005	16	7.1	36.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○							
1730	三－６６（大型函渠）ボックス	E45	2006	15	10.5	27.7	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
1731	三－６７（大型函渠）ボックス	E45	2007	14	10.6	25.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1732	三－７０（大型函渠）ボックス	E45	2007	14	10.3	14.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1733	三－７１ボックス	E45	2006	15	5.0	13.6	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1734	三－７２ボックス	E45	2006	15	5.0	13.7	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ						○							
1735	三－７３（大型函渠）ボックス	E45	2006	15	12.6	13.8	－	○	仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ						○							
1736	三－７８ボックス	E45	2006	15	5.0	17.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1737	三－７９（大型函渠）ボックス	E45	2006	15	10.0	13.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅱ							○						
1738	三－８６（大型函渠）ボックス	E45	2008	13	10.0	13.7	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H28	Ⅰ						○							
1739	三－９０ボックス	E45	2007	14	5.0	17.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1740	三－９２（大型函渠）ボックス	E45	2007	14	10.0	18.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1741	三－９６（大型函渠）ボックス	E45	2008	13	8.6	32.7	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅱ							○						
1742	三－９７ボックス	E45	2008	13	5.0	23.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1743	三－１００ボックス	E45	2009	12	5.0	15.0	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1744	三－１０１ボックス	E45	2009	12	5.0	20.5	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○						
1745	三－１０７ボックス	E45	2009	12	3.0	20.3	－	○	仙台	三陸道	宮城県	登米市	H28	Ⅰ						○							
1746	新田橋（下）	E45	2013	8	150.0	9.8	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ						○							
1747	高松橋（下）	E45	2013	8	136.9	9.8	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1748	旗沢橋（下）	E45	2012	9	160.0	10.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1749	上小松橋（下）	E45	2013	8	138.0	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1750	小松２号ご道橋（下）	E45	2012	9	19.9	11.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1751	小松３号ご道橋（下）	E45	2012	9	18.9	11.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅱ						○							
1752	小松４号ご道橋（下）	E45	2012	9	20.8	11.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1753	矢本大橋（下）	E45	2013	8	126.8	22.0	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1754	川前ご道橋（下）	E45	2012	9	24.6	11.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	東松島市	H28	Ⅰ						○							
1755	川南ご道橋（下）	E45	2012	9	24.0	11.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅱ						○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1756	石巻女川ＩＣ橋（上）	E45	2015	6	29.9	10.8	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H28	Ⅰ						○								
1757	崎山橋（下）	E45	2015	6	34.2	11.4	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅰ							○							
1758	稲荷橋（下）	E45	2015	6	63.0	10.6	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H29	Ⅱ							○							
1759	岩の沢橋	E45	2009	12	259.0	11.1	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅰ							○							
1760	福平橋	E45	2016	5	49.2	14.4	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H29	Ⅱ							○							
1761	西―１３ボックス	国道48号	不明	–	2.5	10.6	–	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○					□	□	断面修復
1762	西―１４ボックス	国道48号	不明	–	3.4	10.0	–	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市	H29	Ⅲ							○					□	□	断面修復
1763	汐見橋	国道45号	2017	4	77.5	17.8	PC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅱ								○						
1764	曽波神高架橋（下）	E45	2016	5	514.5	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ								○						
1765	深田ご道橋（下）	E45	2017	4	33.6	11.7	PC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1766	石巻女川IC橋（下）	E45	2017	4	29.9	11.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ								○						
1767	鹿ご道橋（下）	E45	2017	4	54.0	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ								○						
1768	鹿又高架橋（下）	E45	2017	4	497.8	10.7	RC		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1769	新天王橋（下）	E45	2017	4	430.1	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅰ								○						
1770	山居沢橋（下）	E45	2017	4	83.0	10.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	石巻市	H30	Ⅱ								○						
1771	杉の沢橋	E45	2016	5	104.0	12.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H30	Ⅱ								○						
1772	獅子鼻橋	E45	2016	5	148.0	12.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	登米市	H30	Ⅱ								○						
1773	寺沢橋	E45	2016	5	130.0	12.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町	H30	Ⅰ								○						
1774	滝根川橋（上）	E45	2015	6	21.1	10.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅰ								○						
1775	滝根川橋（下）	E45	2015	6	21.1	10.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市	H30	Ⅰ								○						
1776	水尻橋	国道45号	2017	4	76.5	17.8	RC		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町	H30	Ⅰ								○						
1777	面瀬橋（上）	E45	2017	4	41.7	10.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R1	Ⅰ	○										
1778	面瀬橋（下）	E45	2017	4	40.5	10.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R1	Ⅰ	○										
1779	新泉橋	国道48号	2018	3	46.0	13.0	PC		仙台	仙台西	宮城県	仙台市				R1	Ⅱ	○										
1780	ランプ橋	E45	2016	5	32.0	14.9	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅰ	○										
1781	小森橋	E45	2016	5	150.0	12.7	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅱ	○										
1782	磯の沢大橋	E45	2016	5	163.0	12.7	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅱ	○										
1783	立沢橋	E45	2017	4	165.0	12.7	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅰ	○										
1784	大上坊橋	E45	2017	4	146.0	12.7	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅰ	○										
1785	蛇王橋	E45	2017	4	121.0	12.7	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅰ	○										
1786	伊里前川橋	E45	2015	6	180.0	12.0	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R1	Ⅰ	○										
1787	大沢第二橋	国道45号	2019	2	59.7	13.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○	○								
1788	天王橋	国道45号	2016	5	372.0	11.0	鋼橋		仙台	石巻	宮城県	石巻市				R2	Ⅱ		○									
1789	港川橋	E45	2018	3	107.0	18.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	南三陸町				R2	Ⅰ		○									
1790	柳沢川橋	E45	2018	3	94.0	12.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1791	外尾橋	E45	2018	3	65.0	12.0	PC		仙台	三陸道	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○									
1792	津谷川橋	E45	2018	3	190.1	12.0	鋼橋		仙台	三陸道	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1793	小泉海岸ICランプ橋	E45	2018	3	35.8	8.5	PC		仙台	三陸道	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○									
1794	中島跨道橋	E45	2018	3	4.3	10.5	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1795	大沢川橋	E45	2018	3	64.0	12.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○									
1796	赤牛川橋	E45	2018	3	71.0	20.0	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○									
1797	本吉パーキングランプ橋(第3号跨道橋)	E45	2018	3	21.4	9.5	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1798	夜這路川橋	E45	2018	3	23.9	14.4	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1799	青野沢川橋	E45	2018	3	287.0	12.0	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○									
1800	歌津大橋	国道45号	2019	2	113.0	14.5	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	南三陸町				R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1801	小泉大橋	国道45号	2019	2	455.0	13.3	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○								
1802	旭橋	国道108号	2019	2	29.7	10.7	鋼橋		仙台	古川	宮城県	大崎市				R2	Ⅰ		○								
1803	気仙沼ICご道橋	E45	2019	2	80.6	12.7	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1804	気仙沼IC Bﾗﾝﾌﾟ橋	E45	2019	2	23.6	7.9	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1805	気仙沼IC Cﾗﾝﾌﾟ橋	E45	2019	2	25.8	7.9	鋼橋		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1806	片浜ご道橋	E45	2019	2	34.0	13.5	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1807	片浜ご線橋	E45	2019	2	36.0	13.5	PC		仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1808	No.178+19.75ボックス	E45	2015	6	5.2	23.8	－	○	仙台	大船渡	岩手県	陸前高田市				R2	Ⅱ		○								
1809	本吉パーキングランプ橋	E45	2019	2	21.4	10.5	PC		仙台	三陸道	岩手県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○								
1810	岩－38ボックス	国道4号	不明	－	5.5	33.5	－	○	仙台	岩沼	宮城県	岩沼市				R2	Ⅱ		○								
1811	古－20ボックス	国道4号	不明	－	3.0	32.1	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市				R2	Ⅰ		○								
1812	古－23ボックス	国道4号	不明	－	2.5	32.1	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市				R2	Ⅱ		○								
1813	古－26ボックス	国道4号	不明	－	3.0	29.5	－	○	仙台	古川	宮城県	栗原市				R2	Ⅱ		○								
1814	気－11-1ボックス	国道45号	不明	－	3.0	37.9	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1815	気－18ボックス	国道45号	不明	－	4.0	39.6	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅰ		○								
1816	気－21（大型函渠）ボックス	国道45号	不明	－	5.0	27.4	－	○	仙台	気仙沼	宮城県	気仙沼市				R2	Ⅱ		○								
1817	鳴－8ボックス	国道47号	不明	－	3.0	20.0	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市				R2	Ⅰ		○								
1818	鳴－9ボックス	国道47号	不明	－	2.5	38.0	－	○	仙台	鳴子	宮城県	大崎市				R2	Ⅱ		○								
1819	西－6ボックス	国道48号	不明	－	5.0	28.4	－	○	仙台	仙台西	宮城県	仙台市				R2	Ⅱ		○								
1820	道川跨線橋	国道7号	1966	55	31.0	8.6	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□	□				部材交換
1821	二古橋	国道7号	1969	52	25.3	11.3	RC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H27	Ⅱ	伸縮装置取替	R2	Ⅱ		○								
1822	松ケ崎跨線橋	国道7号	1966	55	26.8	8.4	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○				□	□		断面修復
1823	芦川橋	国道7号	2001	20	42.0	15.8	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H30	Ⅱ								○					
1824	本荘大橋	国道7号	1966	55	200.0	17.0	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H30	Ⅲ								○			□		当て板補強
1825	海士剥橋	国道7号	1976	45	39.2	9.8	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H30	Ⅱ								○					
1826	白雪橋	国道7号	1958	63	30.0	7.2	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○								
1827	白糸橋	国道7号	1960	61	54.0	7.0	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅱ	塗替塗装	R1	Ⅰ	○									
1828	上浜跨線橋	国道7号	1966	55	34.6	8.7	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○				□	□		塗替塗装
1829	西申田跨線橋	国道7号	1980	41	77.0	16.8	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								
1830	備中跨線橋	国道7号	1980	41	32.4	17.0	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H29	Ⅲ							○				□		支承取替
1831	小出跨道橋	国道7号	1980	41	14.7	11.2	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○									
1832	黒川跨道橋	国道7号	1979	42	16.8	11.0	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H29	Ⅱ							○						
1833	赤石川橋	国道7号	1981	40	18.0	16.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅱ	床版補修	R1	Ⅰ	○									
1834	小砂川大橋	国道7号	1988	33	90.0	16.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○								
1835	小砂川跨線橋	国道7号	1988	33	36.7	17.0	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H29	Ⅱ							○						
1836	中ノ沢橋	国道7号	1963	58	8.4	8.7	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○					
1837	三本堰橋	国道7号	1962	59	13.0	15.6	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○					
1838	象潟橋	国道7号	1963	58	13.6	15.8	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○					
1839	平沢跨線橋	国道7号	1958	63	12.8	8.0	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
1840	大沢橋	国道7号	1958	63	8.0	13.8	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○					
1841	八森橋	国道7号	1958	63	3.4	7.6	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅱ								○					
1842	浜ノ町跨道橋	国道7号	1964	57	11.5	17.7	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
1843	松ケ崎跨道橋	国道7号	1974	47	12.5	11.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
1844	三倉鼻跨線橋	国道7号	1966	55	22.3	8.7	PC		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○									
1845	竜馬橋	国道7号	1965	56	97.0	7.8	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅲ	○						□				伸縮装置取替

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1846	浜井川橋	国道7号	1963	58	51.3	7.8	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	井川町	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅰ	○										
1847	天王跨線橋	国道7号	1970	51	38.8	10.9	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H30	Ⅲ								○				□		塗替塗装
1848	島合川橋	国道7号	1981	40	20.1	19.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅱ	伸縮装置取替	R2	Ⅲ		○									
1849	新城川橋	国道7号	1963	58	27.1	18.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1850	相染跨線橋	国道7号	1966	55	23.7	16.7	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1851	勝平橋	国道7号	1972	49	24.1	22.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1852	新旭橋（上）	国道13号	1974	47	133.8	9.1	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅰ	○										
1853	新旭橋（下）	国道13号	1974	47	131.0	9.1	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅰ	○										
1854	鮎川橋	国道7号	1988	33	29.8	14.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1855	雪川橋	国道7号	1987	34	29.8	14.0	PC		秋田	秋田	秋田県	由利本荘市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○						□			断面修復
1856	開橋	国道13号	1980	41	25.3	19.8	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1857	牛島跨線橋	国道13号	1983	38	35.0	20.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ						○								
1858	猿田川橋	国道13号	1966	55	23.0	21.3	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○						□				当て板補強
1859	仁井田橋	国道13号	1981	40	19.5	19.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ	部材交換	R1	Ⅱ	○										
1860	目長田跨線橋（上）	国道13号	1987	34	31.9	13.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ								○						
1861	目長田跨線橋（下）	国道13号	1987	34	31.9	13.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ								○						
1862	和田大橋	国道13号	1960	61	81.9	6.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ	防護柵補修							○						
1863	小黒川橋	国道13号	1964	57	19.5	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ	床版補修	R1	Ⅰ	○										
1864	船岡橋	国道13号	1965	56	45.1	8.2	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
1865	古川橋（下）	国道13号	1991	30	19.0	17.4	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅰ								○						
1866	上淀川橋	国道13号	1960	61	57.2	6.7	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1867	仲沢橋	国道7号	1979	42	96.0	10.0	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H26	Ⅱ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
1868	鹿の崎橋	国道7号	1979	42	98.6	10.0	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅲ		○									
1869	豊川橋	国道7号	1976	45	28.1	10.8	PC		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H26	Ⅱ	部材交換	R1	Ⅰ	○										
1870	元木山橋	国道7号	1978	43	76.0	10.0	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅲ	支承取替	R2	Ⅱ		○									
1871	新馬踏川橋	国道7号	1978	43	34.0	10.5	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1872	割山ご道橋（下）	国道7号	2001	20	24.2	9.2	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1873	臨海大橋	国道7号	2001	20	349.0	13.2	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1874	横山跨道橋（下）	国道13号	1990	31	24.8	9.5	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅰ								○						
1875	滝の下跨道橋	国道7号	1988	33	30.8	12.5	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ								○						
1876	浜田跨道橋（下）	国道7号	1985	36	24.3	9.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1877	寄進田橋	国道7号	1958	63	9.0	19.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ									○					
1878	第１号溝橋	国道7号	1964	57	5.3	10.1	PC		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H30	Ⅱ									○					
1879	第２号溝橋	国道7号	1964	57	4.0	16.5	RC		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H30	Ⅱ									○					
1880	船岡小橋	国道13号	1965	56	10.4	12.8	PC		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H30	Ⅰ									○					
1881	河辺跨線橋	国道13号	1965	56	13.5	8.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅲ									○			□		防護柵補修
1882	第１号溝橋	国道13号	1960	61	5.3	7.7	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ									○					
1883	第２号溝橋	国道13号	1960	61	5.3	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ									○					
1884	第３号溝橋	国道13号	1960	61	6.3	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ									○					
1885	第４号溝橋	国道13号	1960	61	6.3	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ									○					
1886	第５号溝橋	国道13号	1960	61	6.3	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ									○					
1887	第６号溝橋	国道13号	1960	61	8.4	8.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ									○					
1888	第１号溝橋	国道13号	1966	55	6.0	21.4	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ									○					
1889	第２号溝橋	国道13号	1966	55	5.5	21.4	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ									○					
1890	牛島跨道橋	国道13号	1967	54	10.4	20.2	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1891	雄物大橋（下）	国道7号	1986	35	394.0	11.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	断面修復
1892	合貝跨線橋	国道13号	1965	56	18.9	8.2	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H30	Ⅲ								○				□		床版補修
1893	杉沢橋	国道7号	1979	42	99.0	10.0	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	潟上市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
1894	荒川橋	国道46号	1970	51	30.7	8.3	PC		秋田	角館	秋田県	大仙市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
1895	横道橋	国道46号	1968	53	26.5	8.3	PC		秋田	角館	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1896	板沢橋	国道46号	1967	54	16.4	8.3	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1897	学校橋	国道46号	1962	59	18.8	6.5	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1898	下川原橋	国道46号	1957	64	28.2	11.2	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
1899	上川原橋	国道46号	1958	63	28.1	6.6	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1900	日陰橋	国道46号	1960	61	24.9	8.2	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
1901	下日陰橋	国道46号	1961	60	18.5	8.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1902	田の上橋	国道46号	1959	62	17.3	8.2	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	部材交換	R1	Ⅲ	○									□	支承取替
1903	刺巻ご線橋	国道46号	1969	52	25.0	8.0	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○							架替
1904	生保内橋	国道46号	1967	54	160.0	6.8	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
1905	大平沢橋	国道46号	1973	48	166.7	8.2	混合橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○					□				断面修復
1906	山紫橋	国道46号	1974	47	40.8	8.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅱ	○										
1907	熊見橋	国道46号	1972	49	53.6	8.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅲ	○									□	当て板補強
1908	木滝沢橋	国道46号	1974	47	152.0	8.2	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	床版防水	R1	Ⅱ	○										
1909	板谷橋	国道46号	1973	48	40.0	8.7	RC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
1910	樹海橋	国道46号	1973	48	23.0	8.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	床版防水	R1	Ⅲ	○									□	当て板補強
1911	猿倉橋	国道46号	1974	47	64.3	8.7	混合橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1912	蛇沢橋	国道46号	1974	47	87.9	8.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅰ		○									
1913	堀木橋	国道46号	1974	47	147.2	7.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
1914	桂巣橋	国道46号	1974	47	42.0	8.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅱ	○										
1915	須神橋	国道46号	1972	49	210.0	8.2	混合橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅱ	○										
1916	宝風橋	国道46号	1974	47	209.6	8.2	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	支承取替
1917	生保内ご道橋	国道46号	1997	24	15.1	11.0	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
1918	生保内ご線橋	国道46号	1998	23	13.7	16.8	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅱ								○						
1919	大道川橋	国道46号	1961	60	9.5	7.5	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
1920	第１号溝橋	国道46号	1969	52	4.6	8.5	RC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
1921	柳沢橋	国道46号	1962	59	13.5	12.3	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
1922	目倉台橋	国道46号	1959	62	13.5	8.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
1923	柴倉橋	国道46号	1961	60	10.4	8.6	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
1924	夏瀬小橋	国道46号	1945	76	5.3	8.3	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
1925	荒川尻橋	国道46号	1966	55	9.4	8.6	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
1926	鬼壁川橋	国道46号	1988	33	13.9	12.3	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1927	第６号溝橋	国道46号	1967	54	6.4	8.1	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1928	第７号溝橋	国道46号	1968	53	6.0	8.6	RC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1929	第８号溝橋	国道46号	1968	53	6.4	8.0	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
1930	水沢橋	国道46号	1937	84	13.6	8.2	PC		秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○						
1931	道川跨線橋側道橋（下）	国道7号	1991	30	70.0	1.6	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□	□				塗替塗装
1932	道川跨線橋側道橋（上）	国道7号	1981	40	47.3	1.6	混合橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□	□			□	部材交換
1933	松ケ崎跨線橋側道橋	国道7号	1982	39	50.5	1.6	混合橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅲ						○					□	□		塗替塗装
1934	海士剥橋側道橋	国道7号	1985	36	39.2	1.4	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H30	Ⅱ								○						
1935	白雪橋側道橋	国道7号	1990	31	35.0	1.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ	防護柵補修	R2	Ⅰ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1936	白糸橋側道橋	国道7号	1984	37	54.0	1.4	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅱ	伸縮装置取替	R1	Ⅱ	○				○						
1937	上浜跨線橋側道橋（下）	国道7号	1976	45	37.1	1.4	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅲ						○				□	□			塗替塗装
1938	上浜跨線橋側道橋（上）	国道7号	1986	35	54.5	1.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○				□	□			塗替塗装
1939	中ノ沢橋側道橋	国道7号	1980	41	18.7	1.4	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○						
1940	三本堰橋側道橋	国道7号	1980	41	15.0	3.1	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○						
1941	平沢跨線橋側道橋	国道7号	1986	35	21.4	1.8	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1942	大沢橋側道橋	国道7号	1980	41	13.6	1.4	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H30	Ⅰ								○						
1943	三倉鼻跨線橋側道橋	国道7号	1978	43	44.5	1.6	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
1944	竜馬橋側道橋（下）	国道7号	1981	40	97.0	1.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	八郎潟町	H26	Ⅱ	床版補修	R1	Ⅲ	○										□	床版取替
1945	浜井川橋側道橋	国道7号	1983	38	68.0	1.6	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	井川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										□	床版取替
1946	鮎川橋側道橋	国道7号	1982	39	27.2	1.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1947	雪川橋側道橋	国道7号	1982	39	27.2	1.8	PC		秋田	秋田	秋田県	由利本荘市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
1948	和田大橋側道橋（下）	国道13号	1990	31	91.0	2.0	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ							○							
1949	和田大橋側道橋（上）	国道13号	1970	51	89.3	1.3	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ	防護柵補修						○							
1950	小黒川橋側道橋	国道13号	1984	37	23.5	1.5	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1951	船岡橋側道橋	国道13号	1985	36	52.0	1.8	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1952	上淀川橋側道橋	国道13号	1976	45	63.1	1.3	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
1953	船岡小橋側道橋	国道13号	1965	56	10.4	1.9	PC		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H30	Ⅰ								○						
1954	河辺跨線橋側道橋	国道13号	1977	44	22.0	1.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅲ								○				□		当て板補強
1955	第１号溝橋側道橋（上）	国道13号	1980	41	7.0	1.7	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1956	第１号溝橋側道橋（下）	国道13号	1980	41	6.2	1.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅲ								○				□		支承補修
1957	第２号溝橋側道橋（上）	国道13号	1980	41	8.4	1.1	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1958	第２号溝橋側道橋（下）	国道13号	1980	41	5.3	1.6	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1959	第３号溝橋側道橋（上）	国道13号	1980	41	9.5	1.1	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1960	第３号溝橋側道橋（下）	国道13号	1980	41	6.3	1.6	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1961	第４号溝橋側道橋（上）	国道13号	1960	61	9.5	1.1	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1962	第４号溝橋側道橋（下）	国道13号	1960	61	6.3	1.6	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1963	第５号溝橋側道橋（上）	国道13号	1980	41	9.5	1.1	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1964	第５号溝橋側道橋（下）	国道13号	1980	41	6.3	1.6	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
1965	第６号溝橋側道橋（上）	国道13号	1980	41	11.4	1.1	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ								○						
1966	第６号溝橋側道橋（下）	国道13号	1980	41	8.5	1.5	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ								○						
1967	合貝跨線橋側道橋	国道13号	1986	35	28.0	1.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○				□		当て板補強
1968	板沢橋側道橋	国道46号	1981	40	16.5	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1969	学校橋側道橋	国道46号	1967	54	19.0	1.8	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1970	下川原橋側道橋	国道46号	1987	34	28.6	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1971	上川原橋側道橋（下）	国道46号	1969	52	28.1	1.1	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
1972	上川原橋側道橋（上）	国道46号	1969	52	28.1	1.1	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
1973	生保内橋側道橋	国道46号	1985	36	164.3	1.4	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
1974	夏瀬小橋側道橋（下）	国道46号	1945	76	11.6	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
1975	夏瀬小橋側道橋（上）	国道46号	2000	21	17.1	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
1976	荒川尻橋側道橋	国道46号	1966	55	9.4	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
1977	第６号溝橋側道橋	国道46号	1967	54	6.4	1.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1978	第７号溝橋側道橋	国道46号	1968	53	6.0	1.5	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1979	第８号溝橋側道橋	国道46号	1968	53	6.4	1.4	RC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1980	横山跨道橋（上）	国道13号	1990	31	24.8	9.5	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
1981	古川橋（上）	国道13号	1991	30	19.0	17.4	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅰ							○							
1982	竜馬大橋側道橋（上）	国道7号	1996	25	97.0	2.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	五城目町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1983	二十六木橋	E7	2007	14	62.0	8.8	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1984	大中ノ沢橋	E7	2006	15	194.8	8.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1985	土谷橋	E7	2007	14	51.0	8.8	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1986	長者川橋	E7	2006	15	152.5	8.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1987	内越橋	E7	2005	16	81.6	8.8	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1988	米坂橋	E7	2006	15	65.3	10.2	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1989	親川橋	E7	2005	16	279.4	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
1990	芦川第一橋	E7	2005	16	280.0	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1991	芦川第二橋	E7	2005	16	356.5	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1992	松ヶ崎高架橋	E7	2006	15	338.5	10.2	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1993	二古第一橋	E7	2007	14	209.5	10.2	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅲ	ひびわれ補修	R1	Ⅱ	○										
1994	二古第二橋	E7	2006	15	118.0	10.2	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
1995	つなぎ沢川橋	E7	2007	14	306.0	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1996	二古川橋	E7	2007	14	173.0	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1997	西目川橋	E7	2006	15	52.1	10.2	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1998	葛法橋	E7	2006	15	30.5	10.6	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
1999	子吉跨線橋	E7	2006	15	91.0	10.2	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2000	子吉川橋	E7	2007	14	193.0	10.2	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2001	小友橋	E7	2007	14	30.0	24.1	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2002	内陸線跨線橋	国道46号	2004	17	17.0	10.4	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2003	院内川橋	国道46号	2005	16	59.3	12.5	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2004	真木口跨道橋	国道46号	2004	17	22.2	10.5	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2005	桧木内川橋	国道46号	2004	17	163.5	10.4	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2006	芋川橋	E7	2005	16	250.5	8.5	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2007	大清水第１号橋	国道7号	1974	47	2.8	7.1	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅰ								○						
2008	大清水第２号橋	国道7号	1972	49	2.6	7.1	RC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ								○						
2009	釜ヶ沢跨道橋	E7	2006	15	63.6	4.0	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2010	深沢橋	E7	2007	14	62.5	9.7	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
2011	芦川跨道橋	E7	2007	14	86.6	2.8	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2012	梵字川橋（上）	国道13号	2005	16	28.7	13.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2013	梵字川橋（下）	国道13号	2007	14	28.7	13.4	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2014	芹田溝橋	国道7号	1958	63	4.1	10.0	RC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2015	小勝田ご道橋（日三市角館跨道橋）	国道46号	2009	12	24.8	10.7	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H28	Ⅱ						○								
2016	勝手橋	国道7号	2009	12	43.0	11.5	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2017	新衣川橋	国道7号	2007	14	61.9	13.3	PC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H26	Ⅱ	伸縮装置取替	R1	Ⅱ	○										
2018	白雪川橋	E7	2010	11	47.6	10.5	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2019	院内ご道橋	E7	2011	10	20.6	12.0	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2020	大沢川橋	E7	2009	12	32.0	11.3	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2021	琴浦川橋	E7	2010	11	118.0	10.3	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2022	仁賀保ＩＣ橋	E7	2011	10	26.7	11.2	PC		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2023	山崎ご道橋	国道46号	2009	12	26.1	10.5	PC		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2024	入見内川橋（本線橋）	国道46号	2012	9	71.0	10.3	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2025	入見内川橋（Ｂランプ橋）	国道46号	2012	9	68.8	6.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2026	入見内川橋（Ｃランプ橋）	国道46号	2011	10	73.8	6.7	鋼橋		秋田	角館	秋田県	仙北市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2027	飯島橋	国道7号	2013	8	57.4	19.3	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2028	小砂川ボックス	国道7号	1988	33	6.5	25.4	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2029	大須郷ボックス	国道7号	1988	33	5.5	28.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2030	赤石ボックス	国道7号	1980	41	15.5	27.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2031	高森ボックス	国道7号	1981	40	7.7	19.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2032	砂田ボックス	国道7号	1981	40	5.5	20.7	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2033	石廻ボックス	国道7号	1981	40	5.5	19.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2034	館ヶ森ボックス	国道7号	1981	40	4.4	20.4	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2035	笹森ボックス	国道7号	1981	40	3.7	20.6	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2036	古賀の田ボックス	国道7号	1980	41	3.8	26.5	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2037	下竹嶋潟ボックス	国道7号	1979	42	5.0	20.5	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2038	琴浦ボックス	国道7号	1958	63	4.9	14.7	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2039	家ノ浦ボックス	国道7号	1958	63	3.4	24.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2040	境川第一ボックス	国道7号	1988	33	12.4	34.4	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2041	境川第二ボックス	国道7号	1988	33	4.5	15.5	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2042	出小屋ボックス	国道7号	1988	33	4.0	33.4	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2043	大清水台第一ボックス	国道7号	1974	47	3.6	12.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2044	大清水台第二ボックス	国道7号	1974	47	3.6	16.8	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2045	開ボックス	国道7号	1974	47	4.8	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2046	大開第一ボックス	国道7号	1978	43	4.8	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2047	大開第二ボックス	国道7号	1978	43	4.8	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2048	木ノ前ボックス	国道7号	1978	43	4.8	24.7	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2049	小川瀬ボックス	国道7号	1978	43	4.8	43.5	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2050	松館大平ボックス	国道7号	1978	43	4.8	26.8	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2051	元木山根第二ボックス	国道7号	1978	43	7.3	22.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2052	開沢第一ボックス	国道7号	1976	45	2.7	24.2	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2053	開沢第二ボックス	国道7号	1976	45	8.1	25.2	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H27	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2054	開沢第三ボックス	国道7号	1976	45	4.8	26.3	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2055	開沢第四ボックス	国道7号	1976	45	5.6	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2056	毘沙門ボックス	国道7号	1976	45	4.3	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2057	中屋敷ボックス	国道7号	1976	45	3.8	23.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2058	鹿ノ崎第一ボックス	国道7号	1976	45	5.0	24.6	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2059	鹿ノ崎第二ボックス	国道7号	1976	45	6.6	27.3	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2060	古開ボックス	国道7号	1979	42	2.6	26.8	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2061	妙見第一ボックス	国道7号	1963	58	3.6	29.4	－	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2062	堂ノ沢第一ボックス	E7	2007	14	5.8	50.7	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2063	堂ノ沢第二ボックス	E7	2007	14	5.7	30.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2064	栄田ボックス	E7	2007	14	7.6	10.8	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2065	大坪ボックス	E7	2007	14	11.0	31.3	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2066	新谷地ボックス	E7	2007	14	9.6	12.8	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2067	上谷地ボックス	E7	2007	14	6.6	12.8	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2068	前田ボックス	E7	2007	14	8.6	12.8	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2069	向山ボックス	E7	2007	14	4.3	15.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2070	岡本ボックス	E7	2007	14	7.0	13.6	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2071	三本木ボックス	E7	2007	14	13.0	21.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2072	上田場第一ボックス	E7	2006	15	28.0	26.4	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2073	上田場第二ボックス	E7	2006	15	7.1	15.3	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2074	追留ボックス	E7	2005	16	7.1	14.4	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2075	大堤ボックス	E7	2005	16	5.0	31.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2076	堅田沢ボックス	E7	2007	14	3.0	31.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2077	清水沢ボックス	E7	2007	14	3.0	14.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2078	大森ボックス	E7	2005	16	10.2	13.7	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2079	寺ヶ沢第一ボックス	E7	2007	14	6.9	20.2	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2080	寺ヶ沢第二ボックス	E7	2007	14	4.0	25.6	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2081	大平ボックス	E7	2005	16	6.0	20.8	－	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2082	浜中ボックス	E7	2006	15	7.0	13.5	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○								
2083	狐森ボックス	E7	2010	11	7.5	15.9	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○								
2084	普断寺新田ボックス	E7	2010	11	4.8	15.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅰ						○								
2085	八幡新田ボックス	E7	2010	11	15.7	22.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○								
2086	潟頭ボックス	E7	2010	11	5.2	27.0	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅰ						○								
2087	吉森ボックス	E7	2010	11	17.1	27.6	－	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○								
2088	北野田高屋ボックス	国道13号	2008	13	8.0	25.0	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2089	古野ボックス	国道13号	1990	31	6.0	30.0	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2090	茨島地下道	国道13号	1974	47	2.5	17.0	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2091	新川地下道	国道13号	1974	47	2.5	15.0	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2092	新川ボックス	国道13号	1974	47	2.5	15.0	－	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H29	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2093	生保内第一ボックス	国道46号	1974	47	4.6	22.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2094	生保内第二ボックス	国道46号	1974	47	2.4	17.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2095	刺巻第一ボックス	国道46号	1967	54	2.3	10.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2096	刺巻第二ボックス	国道46号	1961	60	2.0	20.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2097	卒田第一ボックス	国道46号	1962	59	4.6	20.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2098	卒田第二ボックス	国道46号	1961	60	2.0	8.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2099	卒田第三ボックス	国道46号	1957	64	6.6	10.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2100	稲沢第一ボックス	国道46号	不明	－	4.0	9.5	－	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○						
2101	稲沢第二ボックス	国道46号	不明	－	4.0	9.5	－	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○						
2102	稲沢第三ボックス	国道46号	不明	－	5.0	27.6	－	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○						
2103	荒川第一ボックス	国道46号	不明	－	3.0	31.7	－	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅲ								○				□		断面修復
2104	荒川第二ボックス	国道46号	不明	－	4.0	46.5	－	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ								○						
2105	小松第一ボックス	国道46号	2004	17	2.6	15.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2106	小松第二ボックス	国道46号	2004	17	8.2	20.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2107	小松第三ボックス	国道46号	2004	17	3.6	10.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2108	小松第五ボックス	国道46号	2004	17	3.5	50.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2109	小松第七ボックス	国道46号	2004	17	7.3	40.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2110	小松第八ボックス	国道46号	2004	17	3.5	50.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2111	小松第九ボックス	国道46号	2004	17	3.0	50.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2112	小松第十二ボックス	国道46号	2004	17	3.8	30.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2113	小松第十三ボックス	国道46号	2004	17	6.9	20.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2114	小松第十四ボックス	国道46号	2004	17	7.9	10.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2115	川原ボックス	国道46号	2004	17	6.0	10.0	－	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2116	小勝田第一ボックス	国道46号	1969	52	5.0	10.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2117	小勝田第三ボックス	国道46号	1969	52	8.0	30.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2118	小勝田第四ボックス	国道46号	1969	52	6.2	50.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2119	小勝田第六ボックス	国道46号	1969	52	3.9	30.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2120	小勝田第七ボックス	国道46号	1969	52	3.3	10.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2121	小勝田第八ボックス	国道46号	1969	52	3.3	10.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2122	小勝田第九ボックス	国道46号	1969	52	3.4	15.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2123	小勝田第十一ボックス	国道46号	1969	52	4.6	50.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅰ							○							
2124	雲然山崎第一ボックス	国道46号	2013	8	6.0	63.1	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅱ								○						
2125	雲然山口第一ボックス	国道46号	2013	8	6.0	51.4	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅱ								○						
2126	雲然山口第二ボックス	国道46号	2013	8	6.0	9.7	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
2127	雲然山口第三ボックス	国道46号	2013	8	3.0	51.8	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
2128	西長野第一ボックス	国道46号	2013	8	3.0	93.2	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ								○						
2129	荒磯橋	国道7号	2014	7	45.0	16.0	RC		秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2130	赤石川橋（高）	E7	2013	8	58.6	10.5	鋼橋		秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅰ						○								
2131	新城川橋側道橋	国道7号	2015	6	19.0	1.5	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H30	Ⅱ							○							
2132	割山こ道橋（上）	国道7号	2014	7	23.7	16.7	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ						○								
2133	雄物大橋（上）	国道7号	2014	7	394.0	11.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ						○								
2134	浜田跨道橋（上）	国道7号	2014	7	24.3	9.0	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ						○								
2135	八橋ボックス	国道7号	1965	56	2.2	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅲ		R2	Ⅰ		○					□				断面修復
2136	県道下ボックス	国道7号	1965	56	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	潟上市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2137	神内ボックス	国道13号	1965	56	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2138	榊表地下道	国道13号	2007	14	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2139	前田地下道	国道13号	1981	40	4.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2140	仁井田地下道	国道13号	1981	40	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2141	牛島南地下道	国道13号	1984	37	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2142	牛島北地下道	国道13号	1982	39	3.0	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2143	卸町ボックス	国道13号	1965	56	3.7	36.0	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2144	堂ノ沢第三ボックス	E7	2007	14	6.0	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅰ						○								
2145	内越第一ボックス	E7	2007	14	5.0	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2146	内越第二ボックス	E7	2007	14	5.0	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2147	内越第三ボックス	E7	2007	14	9.0	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2148	土谷ボックス	E7	2007	14	3.7	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	由利本荘市	H28	Ⅱ						○								
2149	白雪第一ボックス	E7	2009	12	5.0	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅱ						○								
2150	白雪第二ボックス	E7	2009	12	2.9	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅰ						○								
2151	白雪第三ボックス	E7	2009	12	2.1	36.0	–	○	秋田	本荘	秋田県	にかほ市	H28	Ⅲ	ひびわれ補修					○								
2152	卒田第五ボックス	国道46号	不明	–	2.5	10.9	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅲ							○				□			断面修復
2153	小松第十五ボックス	国道46号	2007	14	2.2	57.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2154	生保内第三ボックス	国道46号	不明	–	2.0	23.8	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2155	生保内第四ボックス	国道46号	不明	–	5.5	79.5	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2156	生保内第五ボックス	国道46号	不明	–	6.0	49.5	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2157	生保内第六ボックス	国道46号	不明	–	1.0	74.0	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2158	生保内第七ボックス	国道46号	不明	–	1.0	24.2	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2159	卒田第四ボックス	国道46号	不明	–	1.2	13.9	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							
2160	小勝田第十二ボックス	国道46号	2007	14	5.4	27.3	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2161	西長野第三ボックス	国道46号	2013	8	6.0	27.5	–	○	秋田	角館	秋田県	仙北市	H30	Ⅰ							○							
2162	稲沢第四ボックス	国道46号	不明	–	8.0	12.0	–	○	秋田	角館	秋田県	大仙市	H30	Ⅱ							○							
2163	羽川大橋	国道7号	2016	5	145.1	13.5	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市								○								
2164	下浜鮎川橋	国道7号	2018	3	47.3	13.8	PC		秋田	秋田	秋田県	秋田市				R2	Ⅰ		○									
2165	下浜桂根橋	国道7号	2014	7	105.0	13.5	鋼橋		秋田	秋田	秋田県	秋田市								○								
2166	下浜第一ボックス	国道7号	2016	5	4.5	18.6	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市								○								
2167	下浜第三ボックス	国道7号	2012	9	5.0	17.2	–	○	秋田	秋田	秋田県	秋田市								○								
2168	玉川橋（下）	国道13号	1972	49	652.0	10.0	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								□	塗替塗装
2169	丸子大橋（下）	国道13号	1985	36	95.0	12.5	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○						□				断面修復
2170	仙大橋（上）	国道13号	2001	20	48.2	12.5	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅰ						○								
2171	仙大橋（下）	国道13号	1986	35	48.2	12.5	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ						○							□	床版防水
2172	新芦沢橋	国道13号	1999	22	69.5	16.8	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2173	丸子ご道橋（下）	国道13号	1985	36	18.3	12.9	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○				□					伸縮装置取替
2174	富士見高架橋（下）	国道13号	1989	32	340.0	11.2	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								□	支承取替
2175	三貫堰橋	国道13号	1997	24	9.8	15.3	PC		湯沢	大曲	秋田県	横手市	H28	Ⅰ						○								
2176	厨川橋	国道13号	1970	51	11.4	12.7	RC		湯沢	大曲	秋田県	横手市	H30	Ⅰ							○							
2177	出川橋	国道13号	1965	56	14.1	11.8	RC		湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2178	白山橋	国道13号	1970	51	13.5	12.8	RC		湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H30	Ⅱ							○							
2179	六郷橋	国道13号	1970	51	5.5	15.4	RC		湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H30	Ⅰ							○							
2180	花館高架橋（下）	国道13号	1992	29	420.0	11.3	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅲ	断面修復					○								
2181	万太郎川橋（下）	国道13号	1993	28	13.7	12.5	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2182	宇留井橋	国道13号	1964	57	7.5	9.4	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2183	峰吉川橋	国道13号	1966	55	7.3	12.4	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2184	南刈和野跨線橋	国道13号	2000	21	112.5	17.0	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2185	土買大橋	国道13号	2000	21	135.7	16.8	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2186	安田橋（下）	国道13号	1990	31	21.4	13.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H30	Ⅰ							○							
2187	杉沢橋	国道13号	1964	57	30.7	7.6	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○			□					塗替塗装
2188	横手川橋	国道13号	1964	57	93.2	7.7	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○			□	□				塗替塗装
2189	横手第２ご線橋	国道13号	1966	55	22.9	9.2	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○					□	□				剥落防止
2190	横手第１ご線橋	国道13号	1966	55	21.5	9.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					支承取替
2191	金屋ご線橋	国道13号	1965	56	24.9	9.1	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅲ	支承取替	R2	Ⅲ		○				□	□				塗替塗装
2192	新岩崎橋	国道13号	1978	43	318.9	10.5	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2193	岩崎ご線橋	国道13号	1968	53	21.9	9.9	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○							□	断面修復
2194	関口ご線橋	国道13号	1966	55	19.1	8.5	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	支承取替
2195	戸沢橋	国道13号	1966	55	46.9	7.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○			□	□				洗掘対策
2196	須川橋	国道13号	1973	48	185.3	9.6	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○					□				当て板補強
2197	横堀ご線橋	国道13号	1966	55	20.3	8.7	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
2198	湯の沢橋	国道13号	1964	57	21.4	8.3	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○				□					当て板補強
2199	雄勝川橋	国道13号	1964	57	39.0	7.7	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○				□					当て板補強
2200	第２片桟橋	国道13号	1963	58	181.2	3.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									□	断面修復
2201	第１片桟橋	国道13号	1963	58	104.1	3.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2202	新山橋	国道13号	1975	46	11.5	12.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2203	佐賀会橋	国道13号	1974	47	11.5	12.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2204	十五野橋	国道13号	1975	46	10.5	25.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅰ						○								
2205	金屋橋	国道13号	1961	60	9.0	12.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○								

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2206	坂の下橋	国道13号	1962	59	3.8	11.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○							□	床版防水
2207	持田橋	国道13号	1967	54	12.0	11.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○								
2208	中野橋	国道13号	1967	54	3.2	10.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○								
2209	矢込沢橋	国道13号	1981	40	11.4	12.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2210	冷水橋	国道13号	1956	65	4.7	7.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
2211	岩萩橋	国道13号	1955	66	6.3	9.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2212	平和橋	国道13号	1968	53	5.3	19.6	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅰ						○								
2213	古館橋	国道13号	1968	53	7.3	15.7	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅰ						○								
2214	姉倉橋	国道13号	1961	60	7.3	11.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2215	堤先橋	国道13号	1964	57	3.0	11.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅲ	床版取替	R2	Ⅰ		○									
2216	横揚橋	国道13号	1962	59	5.3	14.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2217	岩崎ご道橋	国道13号	1978	43	11.4	13.6	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2218	上川原橋	国道13号	1966	55	13.5	9.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2219	前通橋	国道13号	1964	57	8.4	10.6	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅰ						○								
2220	槻の沢橋	国道13号	1978	43	6.3	13.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2221	小白岩橋	国道13号	1978	43	10.4	13.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□		断面修復
2222	新万石橋	国道13号	1980	41	144.6	12.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2223	成沢橋	国道13号	1963	58	3.0	11.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅲ	床版取替	R2	Ⅰ		○									
2224	出川橋側道橋	国道13号	1963	58	14.1	2.0	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2225	宇留井橋側道橋	国道13号	1964	57	13.6	2.0	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅰ							○							
2226	杉沢橋側道橋	国道13号	1984	37	37.7	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅰ						○								
2227	横手川橋側道橋	国道13号	1984	37	101.2	1.8	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ						○			□					断面修復
2228	横手第２ご線橋側道橋	国道13号	1984	37	31.6	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□	□				床版防水
2229	横手第１ご線橋側道（下）	国道13号	1979	42	27.1	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□				□	支承補修
2230	横手第１ご線橋側道（上）	国道13号	1979	42	27.1	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2231	金屋ご線橋側道橋	国道13号	1981	40	33.7	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅲ	床版取替	R2	Ⅲ		○				□	□				塗替塗装
2232	岩崎ご線橋側道橋（上）	国道13号	1978	43	21.8	2.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○								
2233	関口ご線橋側道橋	国道13号	1980	41	31.0	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										架替
2234	戸沢橋側道橋	国道13号	1982	39	46.9	1.9	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○				□				断面修復
2235	横堀ご線橋側道橋	国道13号	1980	41	30.1	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	支承補修
2236	湯の沢橋側道橋	国道13号	1984	37	24.0	2.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2237	雄勝川橋側道橋	国道13号	1982	39	42.4	2.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2238	新山橋側道橋	国道13号	1999	22	11.5	3.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅰ							○							
2239	上川原橋側道橋	国道13号	1986	35	26.8	2.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅰ							○							
2240	安田橋（上）	国道13号	1990	31	21.4	13.0	PC		湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H30	Ⅰ								○						
2241	関口ご道橋	E13	2004	17	119.5	10.3	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2242	戸沢川橋	E13	2001	20	29.0	11.2	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2243	三関ご線橋	E13	2002	19	134.0	10.3	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○						□	塗替塗装
2244	大沢川橋	E13	2002	19	19.3	11.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2245	桦沢川橋	E13	2002	19	18.7	11.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2246	寺田川橋	E13	2004	17	34.2	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅰ								○						
2247	御返事川橋	E13	2004	17	18.8	11.2	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2248	高松川橋	E13	2004	17	142.1	9.3	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○					□	塗替塗装
2249	相川ご道橋	E13	2003	18	20.0	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○			□					伸縮装置取替
2250	間倉ご線橋	国道13号	2005	16	120.0	12.0	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2251	新玉川橋	国道13号	2006	15	699.0	12.3	鋼橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅰ							○							
2252	大門跨道橋	E13	2001	20	19.3	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2253	木山方跨道橋	E13	2001	20	18.4	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2254	山田跨道橋	E13	2001	20	20.9	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○								
2255	中野跨道橋	E13	2000	21	24.4	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○	□					伸縮装置取替
2256	駅西跨道橋	E13	2000	21	32.5	11.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2257	清水跨道橋	E13	2002	19	30.8	10.3	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2258	両神跨道橋	E13	2001	20	16.8	22.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2259	元清水跨道橋（上）	E13	2001	20	24.8	10.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2260	鶴館跨道橋（上）	E13	2000	21	23.9	14.8	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○								
2261	湯沢ＩＣ橋（上）	E13	2000	21	38.5	10.5	RC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2262	岩崎ご線橋側道橋（下）	国道13号	2005	16	36.0	2.5	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅰ						○								
2263	大浦ご線橋	国道13号	2009	12	233.5	12.0	混合橋		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							断面修復
2264	丸子大橋（上）	国道13号	2003	18	95.0	12.5	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○						□				断面修復
2265	富士見高架橋（上）	国道13号	2001	20	340.0	11.2	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2266	万太郎川橋（上）	国道13号	2000	21	13.6	12.5	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2267	元清水跨道橋（下）	E13	1999	22	24.8	10.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2268	鶴館跨道橋（下）	E13	1999	22	23.9	10.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ						○								
2269	湯沢ＩＣ橋（下）	E13	2000	21	38.5	16.8	RC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2270	丸子ご道橋（上）	国道13号	1985	36	18.3	12.5	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○				□					伸縮装置取替
2271	花館高架橋（上）	国道13号	2008	13	420.0	11.3	PC		湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ						○								
2272	堤地下道	国道13号	1991	30	3.7	22.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2273	堰添ボックス	国道13号	1991	30	3.0	29.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2274	堂山地下道	国道13号	1991	30	3.8	29.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2275	新馬場ボックス	国道13号	1981	40	2.0	13.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2276	東山ボックス	国道13号	1983	38	2.5	13.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2277	山口ボックス	国道13号	1983	38	2.0	12.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2278	小白岩１ボックス	国道13号	1983	38	3.8	13.4	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					断面修復
2279	小白岩２ボックス	国道13号	1983	38	3.0	13.2	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2280	六郎川原１ボックス	国道13号	1983	38	3.0	13.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					断面修復
2281	六郎川原２ボックス	国道13号	1983	38	3.6	13.2	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2282	板橋１ボックス	国道13号	1983	38	4.8	13.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2283	板橋２ボックス	国道13号	1983	38	2.8	13.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2284	沢田ボックス	国道13号	1966	55	4.0	12.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2285	関口地下道	国道13号	1978	43	2.9	12.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2286	愛宕町ボックス	国道13号	1969	52	5.2	12.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
2287	千石町ボックス	国道13号	1969	52	4.7	20.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○						□				断面修復
2288	山崎ボックス	国道13号	1968	53	2.3	19.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2289	北三条ボックス	国道13号	1978	43	3.1	25.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2290	新山道添ボックス	国道13号	1978	43	7.6	16.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2291	上揄ボックス	国道13号	1978	43	3.8	21.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2292	十文字下ボックス	国道13号	1978	43	2.0	27.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2293	十文字第一地下道	国道13号	1978	43	3.2	23.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2294	十文字第二地下道	国道13号	1978	43	3.2	28.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2295	海道下１ボックス	国道13号	1978	43	2.4	20.3	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2296	西上ボックス	国道13号	1978	43	3.2	13.8	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2297	海道下２ボックス	国道13号	1978	43	3.0	14.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2298	沖野２ボックス	国道13号	1978	43	7.5	18.1	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2299	街道下ボックス	国道13号	1961	60	2.0	11.7	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2300	大橋２ボックス	国道13号	1961	60	2.2	12.1	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2301	四ッ屋ボックス	国道13号	2006	15	2.2	20.5	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2302	上真山ボックス	国道13号	1966	55	3.5	23.8	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2303	久保目ボックス	国道13号	1966	55	6.6	11.0	－	○	湯沢	湯沢	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2304	長持ボックス	国道13号	1970	51	2.5	16.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	横手市	H29	Ⅱ							○							
2305	米ノ口ボックス	国道13号	2002	19	11.9	18.2	－	○	湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2306	白山１ボックス	国道13号	1970	51	9.7	16.7	－	○	湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2307	白山２ボックス	国道13号	1970	51	2.7	15.2	－	○	湯沢	大曲	秋田県	美郷町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2308	以与谷地ボックス	国道13号	1989	32	3.4	23.2	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2309	奈加谷地ボックス	国道13号	2003	18	2.6	33.6	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2310	田中ボックス	国道13号	1989	32	4.0	29.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2311	和合地下道	国道13号	1988	33	3.7	28.8	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2312	宝門清水２ボックス	国道13号	1989	32	9.2	26.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2313	穂長ボックス	国道13号	2003	18	7.5	31.5	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2314	屋敷後ボックス	国道13号	2004	17	5.6	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2315	戸畤地下道	国道13号	1988	33	3.7	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅱ	○										
2316	戸畤ボックス	国道13号	1989	32	7.0	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2317	福田１ボックス	国道13号	1989	32	3.4	27.4	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○						□				断面修復
2318	福田２ボックス	国道13号	2004	17	7.7	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2319	福田３ボックス	国道13号	1989	32	4.2	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2320	川前地下道	国道13号	1989	32	3.7	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2321	福田地下道	国道13号	1989	32	3.7	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2322	福田町ボックス	国道13号	1989	32	2.1	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2323	中町ボックス	国道13号	1989	32	4.8	27.2	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2324	柳町地下道	国道13号	1993	28	3.7	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2325	柳町ボックス	国道13号	1993	28	5.5	27.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2326	豊後野ボックス	国道13号	2005	16	7.7	15.1	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2327	豊後野下段ボックス	国道13号	2003	18	5.1	15.3	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2328	館越中嶋ボックス	国道13号	2004	17	5.7	27.6	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2329	薬師ボックス	国道13号	2004	17	3.3	11.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2330	大坪ボックス	国道13号	2009	12	5.5	14.6	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2331	下新屋ボックス	国道13号	2009	12	5.2	14.5	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2332	北楢岡沖田ボックス	国道13号	2010	11	5.4	14.6	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2333	嶋谷地ボックス	国道13号	2010	11	4.6	14.8	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2334	高花ボックス	国道13号	2010	11	8.2	15.8	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2335	中野ボックス	国道13号	2010	11	2.5	15.1	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2336	下船戸ボックス	国道13号	2002	19	4.6	17.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2337	浮蓋谷地１ボックス	国道13号	1997	24	4.9	17.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2338	浮蓋谷地２ボックス	国道13号	1997	24	3.4	21.5	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2339	加賀戸ボックス	国道13号	1991	30	5.3	17.0	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2340	一ト鶴ボックス	国道13号	1997	24	17.6	16.9	－	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2341	大佐沢ボックス	国道13号	1986	35	4.3	14.0	–	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
2342	前田ボックス	国道13号	1966	55	4.8	11.1	–	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H28	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
2343	峰吉川地下道	国道13号	1991	30	4.0	11.0	–	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅱ							○							
2344	半仙ボックス	国道13号	1966	55	2.9	16.4	–	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市	H29	Ⅲ							○			□				断面修復
2345	雄勝こまち２ボックス	E13	2003	18	9.0	12.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2346	雄勝こまち６ボックス	E13	2003	18	9.1	12.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2347	須川２ボックス	E13	2004	17	8.8	12.6	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2348	須川３ボックス	E13	2004	17	9.5	12.7	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2349	須川５ボックス	E13	2004	17	9.6	12.8	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2350	須川６ボックス	E13	2004	17	9.5	12.8	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2351	須川８ボックス	E13	2004	17	10.0	13.5	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2352	須川１１ボックス	E13	2004	17	10.4	12.9	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2353	須川１４ボックス	E13	2004	17	9.5	13.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2354	須川１５ボックス	E13	2004	17	13.8	13.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2355	須川１６ボックス	E13	2004	17	10.0	12.8	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2356	須川１７ボックス	E13	2004	17	10.1	12.7	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2357	三関１ボックス	E13	2004	17	12.1	11.3	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2358	三関６ボックス	E13	1999	22	11.2	12.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2359	新雄勝川橋	E13	2013	8	59.8	8.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2360	院内小沢橋	E13	2009	12	29.6	13.5	PC		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅰ							○							
2361	湯ノ沢温泉大橋	E13	2010	11	179.0	12.0	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H29	Ⅱ							○							
2362	第１号ボックス	E13	2009	12	4.5	14.6	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2363	第２号ボックス	E13	2009	12	12.5	13.5	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅱ								○						
2364	第５号ボックス	E13	2010	11	5.0	16.1	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市	H30	Ⅰ								○						
2365	横手安田側道橋（上）	国道13号	不明	–	11.2	1.2	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市				R2	Ⅲ		○									架替
2366	横手安田側道橋（下）	国道13号	不明	–	12.0	1.4	鋼橋		湯沢	湯沢	秋田県	横手市				R2	Ⅲ		○									架替
2367	下船戸ボックス2(仮名)	国道13号	不明	–	2.5	20.5	–	○	湯沢	大曲	秋田県	大仙市				R2	Ⅰ		○									
2368	北三条ボックス2(仮名)	国道13号	不明	–	3.1	25.0	–	○	湯沢	湯沢	秋田県	湯沢市				R2	Ⅱ		○									
2369	新大湯橋	国道7号	2006	15	36.0	15.0	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅱ								○		□				伸縮装置取替
2370	今度渡橋	国道7号	1958	63	77.9	7.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅲ								○			□	□		床版防水
2371	長走ご線橋	国道7号	1967	54	51.0	8.7	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅲ								○				□	□	床版補修
2372	女神橋	国道7号	1964	57	20.5	9.4	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○							
2373	寺の沢橋	国道7号	1965	56	11.4	9.5	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○							
2374	白沢ご線橋	国道7号	1966	55	45.0	8.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅲ	支承補修	R2	Ⅲ		○									架替
2375	大館ご線橋	国道7号	1967	54	28.8	12.8	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅲ								○					□	塗替塗装
2376	岱野ご線橋	国道7号	1968	53	15.4	12.8	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2377	東大橋	国道7号	1970	51	137.1	11.5	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○		□	□				伸縮装置取替
2378	餅田橋	国道7号	1958	63	166.0	7.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅲ							○			□	□			当て板補強
2379	下川沿ご線橋	国道7号	1967	54	31.0	8.7	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅱ						○				□	□	□		床版防水
2380	山田橋	国道7号	1964	57	26.5	9.1	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○			□				塗替塗装
2381	田代大橋	国道7号	1965	56	115.0	7.6	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○							
2382	早口橋	国道7号	1987	34	68.3	21.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○				□			防護柵補修
2383	糠沢新橋	国道7号	1965	56	26.7	9.6	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅱ						○								
2384	綴子新橋	国道7号	1965	56	59.1	8.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅱ						○								
2385	前山新橋	国道7号	1965	56	53.0	7.6	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅲ	床版補修					○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2386	長木川橋	E7	1996	25	98.1	10.4	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H26	Ⅲ	剥落防止	R1	Ⅱ	○										
2387	あやめ橋（上）	E7	1998	23	34.0	10.9	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2388	新乱川橋	国道7号	1998	23	23.0	20.4	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2389	大館南第二ご道橋	E7	1998	23	34.5	15.1	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅱ						○								
2390	沼館大橋	E7	1998	23	170.0	10.4	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2391	松木跨道橋（上）	E7	1998	23	27.0	10.9	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2392	あやめ跨道橋（上）	E7	1998	23	27.4	10.9	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2393	多茂木橋	国道7号	1965	56	5.4	9.1	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2394	小繋橋	国道7号	1965	56	29.9	8.7	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2395	駒形橋	国道7号	1955	66	18.6	8.3	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2396	川尻橋	国道7号	1960	61	52.7	7.7	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
2397	糸流橋	国道7号	1962	59	16.6	8.7	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H28	Ⅱ						○								
2398	鹿渡橋	国道7号	1962	59	14.6	8.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2399	鯉川橋	国道7号	1962	59	16.6	8.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H28	Ⅱ						○								
2400	切石ご道橋	国道7号	1995	26	43.5	12.9	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2401	切石ご線橋	国道7号	1995	26	44.5	12.9	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅱ								○						
2402	悪土川橋（上）	国道7号	1975	46	15.5	10.8	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅱ								○						
2403	悪土川橋（下）	国道7号	2002	19	15.5	9.7	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅰ								○						
2404	能代ご線橋	国道7号	1975	46	51.9	11.0	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅲ								○					□	支承補修
2405	檜山川新橋	国道7号	1975	46	52.8	11.0	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H29	Ⅲ							○					□		支承補修
2406	きみまち大橋	国道7号	1978	43	263.7	12.5	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅱ								○						
2407	二ツ井大橋	国道7号	1995	26	408.8	11.3	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H29	Ⅱ							○						□	伸縮装置取替
2408	種梅川橋	国道7号	1986	35	36.0	13.0	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2409	二ツ井高架橋	国道7号	1990	31	442.2	8.8	混合橋		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅲ								○					□	支承取替
2410	天瀬川橋	国道7号	1965	56	10.4	9.0	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2411	山谷溝橋	国道7号	1962	59	8.4	8.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2412	新屋敷橋	国道7号	1962	59	8.4	8.7	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2413	牡丹橋	国道7号	1961	60	4.2	9.0	RC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2414	鵜川橋	国道7号	1960	61	13.6	8.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H29	Ⅰ							○							
2415	今度渡橋側道橋	国道7号	1979	42	78.0	1.5	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅱ								○					□	ひびわれ補修
2416	女神橋側道橋	国道7号	1981	40	30.4	2.0	混合橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅰ							○							
2417	寺の沢橋側道橋	国道7号	1983	38	12.0	2.0	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅰ							○							
2418	白沢側道橋	国道7号	1999	22	75.0	2.8	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2419	餅田橋側道橋	国道7号	1975	46	166.3	2.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅲ							○					□		支承補修
2420	下川沿ご線橋側道橋	国道7号	1982	39	36.3	1.4	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅲ						○				□	□			床版補修
2421	山田橋側歩道橋	国道7号	1980	41	26.5	2.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○			□				当て板補強
2422	田代大橋側道橋	国道7号	1978	43	115.0	2.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅲ							○		□					当て板補強
2423	綴子新橋側道橋	国道7号	1979	42	63.0	1.6	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅱ						○					□			防護柵補修
2424	前山橋側道橋	国道7号	1982	39	56.3	1.8	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅱ						○					□			防護柵補修
2425	小繋橋側道橋	国道7号	1987	34	48.6	1.4	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2426	駒形橋側道橋（下）	国道7号	1973	48	19.8	1.9	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅲ	床版補修					○								
2427	駒形橋側道橋（上）	国道7号	1982	39	18.6	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○								
2428	川尻橋側道橋	国道7号	1971	50	52.7	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H26	Ⅲ	支承補修	R1	Ⅰ	○										
2429	糸流橋側道橋	国道7号	1984	37	16.7	1.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H28	Ⅱ						○								
2430	鹿渡橋側道橋（上）	国道7号	1978	43	14.6	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2431	鹿渡橋側道橋（下）	国道7号	1994	27	14.6	1.7	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2432	鯉川橋側道橋（上）	国道7号	1984	37	16.6	1.5	PC		能代	能代	秋田県	三種町	H28	Ⅰ						○								
2433	鯉川橋側道橋（下）	国道7号	1979	42	16.6	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H28	Ⅱ						○								
2434	天瀬川橋側道橋	国道7号	1979	42	10.4	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2435	山谷溝橋側道橋	国道7号	1980	41	8.4	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2436	新屋敷橋側道橋	国道7号	1981	40	8.4	1.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2437	牡丹橋側道橋	国道7号	1961	60	4.2	1.6	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2438	鵜川橋側道橋	国道7号	1982	39	13.6	2.0	鋼橋		能代	能代	秋田県	三種町	H29	Ⅲ	塗替塗装						○							
2439	大館新橋	国道7号	2001	20	118.5	15.8	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○				○						
2440	二ツ井大橋側道橋	国道7号	1995	26	28.1	2.1	RC		能代	能代	秋田県	能代市	H29	Ⅰ								○						
2441	糠沢新橋側道橋	国道7号	2005	16	27.2	1.8	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅰ						○								
2442	福田第１こ道橋	国道7号	1989	32	42.0	4.6	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅱ								○						
2443	福田こ道橋	国道7号	1991	30	49.5	6.1	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅰ								○						
2444	浅内こ道橋	国道7号	1992	29	19.4	7.1	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2445	ムサ岱こ道橋	国道7号	2003	18	45.1	4.5	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2446	浅内橋	E7	2004	17	121.3	14.4	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅲ	剥落防止	R1	Ⅰ	○										
2447	小友こ線橋	E7	2005	16	148.0	10.2	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅲ	剥落防止	R1	Ⅱ	○										
2448	扇田こ道橋	E7	2004	17	80.0	4.0	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2449	大台野こ道橋	E7	2004	17	49.0	4.0	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2450	駒形こ道橋	E7	2005	16	32.7	4.0	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2451	桧山川橋	E7	2004	17	83.2	10.2	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅲ	剥落防止	R1	Ⅰ	○										
2452	姥懐橋	E7	2007	14	340.0	10.2	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
2453	駒形１号橋	E7	2006	15	190.0	10.2	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅰ		R2	Ⅲ		○									
2454	駒形２号橋	E7	2005	16	280.0	10.2	鋼橋		能代	能代	秋田県	能代市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2455	二ツ井高架橋（上オンランプ）	国道7号	1990	31	140.2	8.0	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H30	Ⅱ								○						□
2456	二ツ井高架橋（下オフランプ）	国道7号	1990	31	61.0	8.0	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2457	新下内橋	国道7号	2006	15	48.0	15.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2458	豊祥岱横断橋	国道7号	1975	46	18.5	9.8	PC		能代	能代	秋田県	能代市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2459	鯉川溝橋側道橋（上）	国道7号	1984	37	5.4	1.4	RC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2460	鯉川溝橋側道橋（下）	国道7号	1984	37	5.4	1.3	RC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2461	鯉川溝橋	国道7号	1967	54	3.5	17.0	RC		能代	能代	秋田県	三種町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2462	新矢立峠橋	国道7号	2010	11	88.0	15.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅱ								○		□				床版防水
2463	真中大橋	E7	2006	15	307.4	10.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2464	大館南第一こ道橋	E7	2006	15	32.4	14.8	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅱ						○								
2465	大館南ＩＣ橋	E7	2010	11	34.3	14.5	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅱ								○						
2466	赤湯橋	国道7号	2011	10	62.0	15.0	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2467	あやめ橋（下）	E7	2011	10	34.0	10.9	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2468	松木こ道橋（下）	E7	2012	9	29.0	10.0	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
2469	あやめこ道橋（下）	E7	2011	10	24.5	10.0	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2470	釈迦内こ道橋	E7	2012	9	100.9	10.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2471	釈迦内こ線橋	E7	2013	8	163.0	10.2	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2472	釈迦内橋	E7	2007	14	296.0	10.3	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2473	大茂内沢橋	E7	2008	13	88.0	10.2	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2474	大川目沢橋	E7	2009	12	431.0	10.3	鋼橋		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2475	支根刈沢橋	E7	2008	13	86.5	10.3	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2476	新遠部川橋	E7	2007	14	111.5	10.3	鋼橋		能代	大館	秋田県	小坂町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
2477	浅内ボックス	国道7号	1980	41	2.0	39.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2478	松長布ボックス	国道7号	1977	44	4.0	34.2	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2479	高塙ボックス	国道7号	1977	44	2.0	31.7	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2480	中谷地ボックス	国道7号	1977	44	4.0	31.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2481	宮ノ前ボックス	国道7号	1977	44	2.0	23.8	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2482	鰄渕①ボックス	国道7号	1977	44	2.0	23.6	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2483	扇田ボックス	国道7号	1977	44	2.0	18.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2484	切石①ボックス	国道7号	1962	59	4.0	22.5	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2485	切石②ボックス	国道7号	1995	26	3.0	20.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2486	種ボックス	国道7号	1995	26	3.0	28.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2487	小繋ボックス	国道7号	1965	56	2.0	11.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2488	綴子ボックス	国道7号	1965	56	2.8	13.0	–	○	能代	大館	秋田県	北秋田市	H28	Ⅱ						○								
2489	大谷地ボックス	国道7号	1966	55	2.6	11.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅱ						○								
2490	長木川ボックス	国道7号	1973	48	3.0	14.4	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅱ						○								
2491	有浦①ボックス	国道7号	1973	48	2.0	12.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2492	有浦②ボックス	国道7号	1973	48	2.0	27.7	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2493	板子石境ボックス	国道7号	1969	52	4.5	16.7	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2494	二本杉後ボックス	国道7号	1969	52	2.6	28.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2495	釈迦内①ボックス	国道7号	1969	52	4.0	17.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2496	河戸川ボックス	E7	2003	18	3.8	29.5	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2497	中ノ段ボックス	E7	2003	18	3.4	27.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2498	鰄渕②ボックス	E7	2003	18	3.4	42.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2499	田床内ボックス	E7	2004	17	4.5	18.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2500	中鴨巣ボックス	E7	2003	18	3.1	18.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2501	鴨巣ボックス	E7	2003	18	4.1	14.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅱ						○								
2502	飛根①ボックス	E7	2004	17	3.3	13.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2503	飛根②ボックス	E7	2004	17	3.3	14.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2504	駒形ボックス	E7	2004	17	4.0	15.0	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2505	切石③ボックス	E7	2004	17	3.0	31.5	–	○	能代	能代	秋田県	能代市	H28	Ⅰ						○								
2506	片山ボックス	E7	2000	21	2.0	38.5	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2507	釈迦内②ボックス	E7	2000	21	4.0	31.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2508	釈迦内③ボックス	E7	2000	21	4.2	31.0	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2509	釈迦内④ボックス	E7	2000	21	3.0	24.8	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H28	Ⅰ						○								
2510	摩当川橋	E7	2014	7	83.0	10.5	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H29	Ⅰ							○							
2511	引欠川橋	E7	2008	13	67.4	10.3	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅰ							○							
2512	櫃崎こ道橋	E7	2012	9	21.4	21.3	PC		能代	大館	秋田県	大館市	H29	Ⅱ							○							
2513	堂ノ下①ボックス	E7	2010	11	5.5	16.0	–	○	能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅰ								○						
2514	堂ノ下②ボックス	E7	2008	13	3.6	16.8	–	○	能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅰ								○						
2515	堂の沢ボックス	E7	2008	13	3.7	16.1	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2516	下八幡岱ボックス	E7	2009	12	2.0	25.1	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2517	堤谷内ボックス	E7	2009	12	7.0	26.2	–	○	能代	大館	秋田県	大館市	H30	Ⅰ								○						
2518	Eランプ橋	E7	2017	4	26.7	15.5	PC		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ								○						
2519	脇神こ道橋	E7	2018	3	49.4	10.6	PC		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ								○						
2520	小猿部川橋	E7	2015	6	137.2	12.7	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2521	小森川橋（上）	E7	2017	4	121.0	15.7	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ							○							
2522	小森川橋（下）	E7	2017	4	123.0	8.5	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ							○							
2523	藤株こ道橋	E7	2014	7	39.5	17.9	鋼橋		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅰ							○							
2524	蟹沢川橋	E7	1997	24	26.9	17.3	PC		能代	大館	秋田県	北秋田市	H30	Ⅱ							○							
2525	新田川橋	国道13号	1962	59	36.0	9.5	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2526	指首野川橋	国道13号	1967	54	24.7	9.2	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2527	新泉田川橋（新泉田橋）	国道13号	1967	54	153.4	8.0	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅱ						○								
2528	上台橋	国道13号	1941	80	22.0	8.0	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅱ							○							
2529	金山橋	国道13号	1955	66	74.8	7.0	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅱ							○							
2530	中田橋	国道13号	1960	61	20.5	7.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ								○						
2531	塩根橋	国道13号	1959	62	45.7	10.3	混合橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ								○						
2532	朴木沢橋	国道13号	1979	42	36.2	12.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	真室川町	H28	Ⅱ						○								
2533	鳥越跨線橋（上）	国道47号	1998	23	25.0	5.9	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2534	鳥越跨線橋（下）	国道47号	1998	23	25.2	5.9	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2535	内川橋	国道47号	1971	50	34.3	10.6	RC		山形	新庄	山形県	新庄市	H30	Ⅱ							○							
2536	本合海大橋	国道47号	1970	51	407.8	9.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H30	Ⅲ							○			□	□			床版補修
2537	砂子沢橋	国道47号	1969	52	28.4	7.7	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅱ							○							
2538	角川橋	国道47号	1971	50	160.1	9.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅲ							○		□	□				床版補修
2539	外川山第１桟橋	国道47号	1967	54	20.4	3.6	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅰ							○							
2540	角沢跨道橋（上）	国道47号	2001	20	29.0	12.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
2541	外川山第２桟橋	国道47号	1967	54	34.3	3.6	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅱ							○							
2542	福田跨道橋（上）	国道47号	2001	20	30.0	13.4	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2543	外川山第３桟橋	国道47号	1967	54	34.3	3.6	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅱ							○							
2544	有田橋	国道47号	1967	54	33.1	8.4	RC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅱ							○							
2545	高屋第１桟橋	国道47号	1967	54	80.1	8.6	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H29	Ⅱ								○						
2546	揚巻橋	国道47号	1967	54	78.3	7.5	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H29	Ⅰ								○						
2547	主寝坂橋	国道13号	1976	45	60.0	8.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅰ							○							
2548	新関屋橋	国道13号	1977	44	48.9	14.8	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅱ								○						
2549	戸萩橋	国道13号	1979	42	21.7	12.5	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅱ								○						
2550	古口跨線橋	国道47号	1981	40	36.0	10.3	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○								□	□	断面修復
2551	長沢目川橋	国道47号	1985	36	80.0	12.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H28	Ⅰ						○								
2552	新田川橋	国道47号	1987	34	50.1	12.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅱ						○								
2553	舟形大橋	E13	1997	24	210.0	10.0	PC		山形	新庄	山形県	舟形町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2554	沖の原跨道橋（上）	E13	1998	23	19.4	15.2	PC		山形	新庄	山形県	舟形町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
2555	沖の原跨道橋（下）	E13	1998	23	19.4	16.7	PC		山形	新庄	山形県	舟形町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2556	柏木山跨道橋（上）	E13	1998	23	22.5	10.6	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2557	柏木山跨道橋（下）	E13	1998	23	22.5	10.6	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2558	新庄内川橋	E13	1998	23	143.0	10.3	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○						□	□				断面修復
2559	大谷地跨道橋	E13	1998	23	24.5	10.5	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2560	鳥越八幡橋（旧新田川橋）	E13	1998	23	45.0	16.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2561	松本跨道橋	E13	1999	22	17.9	15.0	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2562	二つ屋橋	国道13号	1977	44	13.5	9.5	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2563	清水川橋	国道13号	1999	22	8.8	14.8	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2564	十日町溝橋	国道13号	1963	58	5.3	12.7	RC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ								○						
2565	泉田溝橋３	国道13号	1970	51	4.9	24.3	RC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2566	鍋倉川橋	国道13号	1997	24	12.6	12.5	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2567	内ノ川橋	国道13号	1975	46	5.5	11.8	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2568	寺ノ沢橋	国道13号	1959	62	3.5	7.7	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H27	Ⅲ	床版取替	R2	Ⅰ		○									
2569	比ノ上橋	国道13号	1959	62	5.1	9.8	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2570	外ノ沢溝橋	国道13号	1975	46	4.9	7.3	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2571	外ノ沢橋	国道13号	1965	56	12.0	7.6	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H26	Ⅱ	伸縮装置補修	R1	Ⅰ	○										
2572	沼台橋	国道13号	1965	56	10.2	7.2	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2573	鐘打沢橋	国道13号	1958	63	5.1	7.4	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2574	日陰橋	国道13号	1965	56	13.9	7.3	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2575	木伐沢橋	国道13号	1959	62	5.3	9.0	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2576	日当沢橋	国道13号	1970	51	3.9	10.5	RC		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2577	本合海高架橋	国道47号	1988	33	393.0	11.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅲ							○		□	□	□	□		床版補修
2578	福宮橋	国道47号	1962	59	5.0	13.3	RC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅲ	防護柵補修	R2	Ⅰ		○									
2579	乱川橋	国道47号	1962	59	8.2	7.9	RC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2580	滝ノ沢橋	国道47号	1965	56	13.6	8.4	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2581	古口溝橋	国道47号	1980	41	10.1	8.9	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H29	Ⅱ							○							
2582	桂沢橋	国道47号	1966	55	10.5	9.6	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2583	三ノ滝橋	国道47号	1966	55	13.5	10.1	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2584	柳沢橋	国道47号	1966	55	5.4	8.4	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H29	Ⅱ							○							
2585	漆沢橋	国道47号	1976	45	4.8	7.9	RC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2586	泡滝橋	国道47号	1979	42	4.7	8.1	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2587	土湯橋	国道47号	1967	54	9.5	8.4	PC		山形	新庄	山形県	戸沢村	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2588	赤浜橋	国道13号	1962	59	26.0	12.9	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅲ								○					□	伸縮装置補修
2589	栗子橋	国道13号	1962	59	40.0	8.7	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
2590	万世橋（下）	国道13号	1977	44	124.1	12.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅰ	○										
2591	米沢跨線橋	国道13号	1970	51	40.0	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2592	米沢大橋	国道13号	1969	52	242.5	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○		□	□				洗掘対策
2593	糠野目橋	国道13号	1956	65	188.1	7.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅱ							○							
2594	津久茂橋	国道13号	1962	59	28.2	9.0	PC		山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅲ							○					□		ひびわれ補修
2595	高畠跨線橋	国道13号	1962	59	21.7	7.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅲ							○			□	□	□		床版補修
2596	台山橋	国道13号	1965	56	7.4	8.3	PC		山形	米沢	山形県	米沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2597	赤湯跨線橋	国道13号	1964	57	17.1	9.8	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2598	黒井橋	国道13号	1958	63	8.6	8.0	RC		山形	米沢	山形県	高畠町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2599	鎌塚台橋	国道13号	1998	23	3.3	11.0	RC		山形	米沢	山形県	高畠町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2600	沢田１号橋	国道13号	1962	59	3.0	10.2	RC		山形	米沢	山形県	南陽市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2601	沢田２号橋	国道13号	1962	59	2.5	10.0	RC		山形	米沢	山形県	南陽市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2602	北門口橋	国道13号	1962	59	3.6	10.0	RC		山形	米沢	山形県	南陽市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2603	小渡橋	国道113号	1971	50	7.4	9.1	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2604	武川橋	国道113号	1970	51	9.8	8.3	RC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2605	田の沢橋	国道113号	1970	51	9.9	9.3	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
2606	小国大沢川橋	国道113号	1971	50	18.7	9.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2607	霜落橋	国道113号	1973	48	13.5	8.8	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2608	漆穂橋	国道113号	1972	49	12.5	8.8	PC		山形	米沢	山形県	飯豊町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2609	向原橋	国道113号	1967	54	5.1	14.9	−	○	山形	米沢	山形県	飯豊町	H29	Ⅰ							○							
2610	堂ヶ沢橋	国道113号	1967	54	5.1	9.9	RC		山形	米沢	山形県	飯豊町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2611	薬師橋	国道113号	1969	52	4.6	19.5	RC		山形	米沢	山形県	川西町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2612	玉川橋	国道113号	1970	51	85.0	9.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
2613	玉川高架橋	国道113号	1972	49	67.6	8.3	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅲ						○			□	□				伸縮装置補修
2614	中野橋	国道113号	1968	53	67.0	8.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
2615	大沢橋	国道113号	1970	51	42.0	8.6	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅲ						○			□					床版防水
2616	向大沢橋	国道113号	1968	53	123.2	8.9	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H30	Ⅲ								○	□				□	床版補修
2617	横根橋	国道113号	1968	53	54.5	9.7	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H30	Ⅱ								○						
2618	赤芝橋	国道113号	1968	53	84.4	8.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H30	Ⅱ								○						
2619	赤坂橋	国道113号	1955	66	76.4	7.1	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2620	松岡橋	国道113号	1971	50	87.6	8.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅲ								○	□				□	床版補修
2621	向大石橋	国道113号	1972	49	100.5	8.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅲ								○		□				床版補修
2622	小川橋	国道113号	1967	54	32.6	10.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅰ	○										
2623	箱の口橋	国道113号	1964	57	56.0	8.6	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2624	子子見沢橋（子子見橋）	国道113号	1972	49	46.0	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅲ						○				□				床版補修
2625	綱取橋	国道113号	1958	63	46.0	8.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
2626	紅葉橋	国道113号	1972	49	149.4	8.7	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅲ		○									
2627	弁当沢片桟橋	国道113号	1972	49	91.8	3.8	RC		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2628	栗松橋	国道113号	1973	48	33.0	8.7	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅱ								○						
2629	明沢橋	国道113号	1972	49	52.6	8.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H30	Ⅲ								○				□	□	伸縮装置補修
2630	岩屋橋	国道113号	1972	49	61.0	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅱ								○						
2631	登戸橋	国道113号	1972	49	61.0	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅱ								○						
2632	桜川橋	国道113号	1974	47	33.0	11.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2633	村中橋	国道113号	2010	11	26.8	12.0	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2634	岩渡戸橋（下）	国道113号	1974	47	21.0	5.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2635	通揚橋	国道113号	1973	48	34.5	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2636	思塚橋	国道113号	1972	49	32.0	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2637	下杉橋	国道113号	1972	49	34.7	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2638	上杉橋	国道113号	1974	47	33.7	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2639	遅越大橋	国道113号	1973	48	61.6	9.7	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2640	下遅越橋	国道113号	1974	47	37.4	8.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2641	上遅越橋	国道113号	1968	53	40.6	8.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅲ						○				□	□			断面修復
2642	間瀬跨線橋	国道113号	1972	49	16.0	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○					□					床版防水
2643	新間瀬橋	国道113号	1971	50	57.0	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅲ								○	□					床版補修
2644	菊水橋	国道113号	1971	50	40.9	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○					□		□	□	□	支承補修
2645	宇津川橋	国道113号	1971	50	18.6	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H30	Ⅰ								○						
2646	嬉ヶ沢橋	国道113号	1971	50	15.6	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H30	Ⅱ								○						
2647	手の子橋	国道113号	1956	65	99.4	9.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H30	Ⅱ								○	□	□				洗掘対策
2648	今泉跨線橋	国道113号	1970	51	26.0	8.8	鋼橋		山形	米沢	山形県	長井市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○							□	□	□	断面修復
2649	川西跨線橋	国道113号	1970	51	25.0	10.1	鋼橋		山形	米沢	山形県	川西町	H30	Ⅲ								○	□	□	□			床版防水
2650	元宿川橋	国道113号	1974	47	41.5	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	川西町	H28	Ⅲ						○				□	□			断面修復
2651	幸来橋	国道113号	1971	50	214.1	9.2	鋼橋		山形	米沢	山形県	川西町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○					□					断面修復
2652	玉川口跨線橋	国道113号	1974	47	30.2	9.3	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅲ		R2	Ⅰ		○				□	□	□			伸縮装置補修
2653	横根片桟橋	国道113号	1971	50	90.1	4.1	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅲ								○				□		伸縮装置補修
2654	大谷地橋	国道13号	1987	34	20.1	10.0	PC		山形	米沢	山形県	高畠町	H28	Ⅰ						○								
2655	杉立沢橋	国道113号	1991	30	135.0	12.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2656	新宇津橋	国道113号	1992	29	25.0	13.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H29	Ⅱ							○							
2657	新落合橋	国道113号	1992	29	95.0	13.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H29	Ⅱ							○		□					ひびわれ補修
2658	中田溝橋１	国道13号	1970	51	4.1	11.3	RC		山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2659	窪田溝橋３	国道13号	1970	51	4.1	10.4	RC		山形	米沢	山形県	米沢市	H27	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅲ		○									
2660	高畠溝橋４	国道13号	1974	47	3.2	12.2	RC		山形	米沢	山形県	高畠町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2661	八木橋	国道13号	1968	53	11.4	8.0	PC		山形	米沢	山形県	米沢市	H27	Ⅲ	ひびわれ補修	R2	Ⅱ		○									
2662	萩生橋	国道113号	1963	58	5.3	10.5	RC		山形	米沢	山形県	飯豊町	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
2663	溝橋（小国松岡）	国道113号	1997	24	4.4	12.7	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2664	神町跨線橋（下）	国道13号	1981	40	34.6	9.2	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	天童市	H30	Ⅲ								○				□	□	伸縮装置補修
2665	神町跨線橋（上）	国道13号	1971	50	34.7	9.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	天童市	H30	Ⅲ								○				□	□	伸縮装置補修
2666	神町跨線橋側道橋（上）	国道13号	1971	50	30.9	7.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	東根市	H30	Ⅲ								○				□	□	ひびわれ補修
2667	新野川橋（上）	国道13号	1972	49	68.1	10.4	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2668	新野川橋（下）	国道13号	1983	38	68.1	10.0	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅱ						○								
2669	新白水川橋（上）	国道13号	1972	49	61.3	10.9	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	東根市	H30	Ⅱ								○						
2670	新白水川橋（下）	国道13号	1984	37	61.3	9.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	東根市	H30	Ⅱ								○						
2671	村山大橋（上）	国道13号	1972	49	524.0	9.6	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	村山市	H30	Ⅲ								○	□	□	□		□	当て板補強
2672	村山大橋（下）	国道13号	1987	34	524.1	9.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	村山市	H30	Ⅲ								○		□	□		□	部材交換
2673	堺田跨線橋	国道47号	1970	51	24.0	7.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H26	Ⅳ	床版取替	R1	Ⅱ	○										
2674	発電所前片桟橋	国道47号	1968	53	60.0	3.6	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅱ								○						
2675	瀬見橋	国道47号	1968	53	20.0	8.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅰ							○							
2676	松原橋	国道47号	1987	34	158.0	12.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H28	Ⅱ						○								
2677	長尾橋	国道47号	1984	37	70.0	12.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H28	Ⅱ						○								
2678	横内橋（上）	国道13号	2001	20	16.4	13.0	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2679	横内橋（下）	国道13号	2000	21	16.4	13.0	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2680	横内跨道橋（下）	国道13号	1977	44	16.0	12.5	RC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2681	横内跨道橋（上）	国道13号	1979	42	13.0	15.9	RC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2682	新牖気川橋（上）	国道13号	1999	22	28.9	12.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2683	新牖気川橋（下）	国道13号	1977	44	28.9	12.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○						□				床版補修
2684	南原跨道橋１（下）	国道13号	1979	42	11.7	17.0	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2685	南原跨道橋１（上）	国道13号	1979	42	11.7	16.9	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2686	南原跨道橋２（下）	国道13号	1979	42	11.7	12.5	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2687	南原跨道橋３（下）	国道13号	1979	42	11.7	17.1	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2688	南原跨道橋３（上）	国道13号	1979	42	11.7	17.2	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2689	尾花沢跨道橋	国道13号	1983	38	16.6	9.5	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ						○								
2690	尾花沢橋	国道13号	1983	38	169.6	14.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅲ	断面修復					○						□	□	部材交換
2691	野尻川橋	国道13号	1983	38	29.2	14.3	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
2692	芦沢跨線橋	国道13号	1974	47	20.0	9.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2693	名木沢橋	国道13号	1961	60	24.6	14.6	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅱ	○										
2694	舟形跨線橋	国道13号	1958	63	16.8	9.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H29	Ⅱ							○							
2695	舟形橋	国道13号	1977	44	205.2	11.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H29	Ⅱ							○							
2696	無名橋（函渠）	国道13号	1992	29	5.0	11.8	RC		山形	新庄	山形県	舟形町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2697	紫山跨線橋	国道13号	1961	60	14.1	9.2	PC		山形	新庄	山形県	舟形町	H29	Ⅱ							○							
2698	関沢橋	国道47号	1971	50	14.2	8.5	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅱ							○							
2699	寒風沢橋	国道47号	1969	52	7.5	7.9	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									
2700	鍋倉沢橋	国道47号	1969	52	10.4	8.1	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅰ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2701	琵琶沢橋	国道47号	1968	53	63.1	8.2	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅱ							○							
2702	高橋川橋	国道47号	1968	53	61.8	8.2	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅱ							○							
2703	芦ヶ沢橋	国道47号	1968	53	7.3	8.2	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2704	坊ヶ沢橋	国道47号	1968	53	6.8	7.8	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2705	鳥出橋	国道47号	1979	42	61.9	11.0	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
2706	新絹出川橋	国道47号	1969	52	95.1	7.8	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅲ							○					□	□	支承補修
2707	向町跨線橋	国道47号	1969	52	28.5	8.2	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○					□	□				当て板補強
2708	沢原川橋	国道47号	1988	33	29.9	9.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅱ							○							
2709	白川橋	国道47号	1958	63	172.0	10.3	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅲ							○					□	□	部材交換
2710	大堀跨線橋	国道47号	1966	55	17.2	8.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2711	小横川橋	国道47号	1966	55	19.6	8.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
2712	鵜杉橋	国道47号	1977	44	108.9	11.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
2713	戦沢橋	国道47号	1966	55	8.4	7.1	PC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2714	笈ノ沢橋	国道47号	1969	52	15.6	8.7	RC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2715	瀬見温泉前片桟橋	国道47号	1968	53	125.9	5.1	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅲ								○	□			□	□	床版補修
2716	弁慶大橋	国道47号	1968	53	124.0	7.9	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅱ							○							
2717	六田跨道橋（上）	国道13号	1971	50	8.5	11.0	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2718	六田跨道橋（下）	国道13号	1984	37	8.5	11.0	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2719	大沢川橋（上）	国道13号	1972	49	14.2	23.5	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H29	Ⅱ							○							
2720	一本柳溝橋（上）	国道13号	1972	49	7.8	23.5	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H29	Ⅱ							○							
2721	一本柳跨道橋（上）	国道13号	1973	48	7.5	11.2	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2722	一本柳跨道橋（下）	国道13号	1989	32	7.5	11.2	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2723	金谷西跨道橋（上）	国道13号	1973	48	8.3	11.1	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2724	金谷西跨道橋（下）	国道13号	1989	32	8.3	11.3	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2725	沢の目川橋（下）	国道13号	1973	48	11.6	24.0	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H29	Ⅱ							○							
2726	長崎大橋（下）	国道112号	1971	50	341.3	9.5	鋼橋		山形	寒河江	山形県	中山町	H29	Ⅱ							○							
2727	上野橋	国道112号	1965	56	14.5	8.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
2728	新熊野川橋	国道112号	1966	55	46.1	7.0	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2729	新間沢橋	国道112号	1967	54	57.1	7.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅱ							○							
2730	新宝沢橋	国道112号	1967	54	58.1	7.0	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2731	新綱取橋	国道112号	1967	54	66.1	7.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2732	新水沢橋	国道112号	1968	53	81.6	7.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
2733	臥竜大橋	国道112号	1998	23	108.0	16.8	鋼橋		山形	寒河江	山形県	寒河江市	H27	Ⅰ		R2	Ⅲ		○									
2734	沼川橋	国道112号	1985	36	19.4	27.0	PC		山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅱ						○								
2735	新横岫橋	国道112号	1969	52	27.0	9.0	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅱ							○							
2736	三山橋	国道112号	1970	51	123.0	8.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅲ								○	□	□				床版補修
2737	湯殿神橋	国道112号	1970	51	35.0	8.7	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○								□		断面修復
2738	権現橋	国道112号	1971	50	18.5	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ								○						
2739	風吹大橋	国道112号	1972	49	136.0	8.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2740	横手橋	国道112号	1977	44	95.0	9.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○						□		床版補修
2741	椿沢橋	国道112号	1981	40	55.0	12.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○						□				床版補修
2742	月山沢橋	国道112号	1979	42	270.0	12.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ								○						
2743	大暮橋	国道112号	1980	41	245.0	12.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										断面修復
2744	月山沢陸橋	国道112号	1978	43	42.6	10.5	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅰ						○								
2745	山路沢橋	国道112号	1978	43	51.0	13.3	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2746	石見堂橋	国道112号	1978	43	179.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ							○							
2747	荒沢橋	国道112号	1977	44	290.0	9.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅲ						○					□			床版補修
2748	薬泉橋	国道112号	1977	44	35.0	10.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅰ					○									
2749	向弓張橋	国道112号	1978	43	95.0	12.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅱ						○								
2750	熊倉橋	国道112号	1979	42	40.0	10.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2751	山葵沼橋	国道112号	1979	42	170.0	9.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2752	大越川橋	国道112号	1978	43	266.2	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅲ	○							□			塗替塗装
2753	葦谷地沢橋	国道112号	1978	43	119.0	9.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2754	志津橋	国道112号	1979	42	80.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅱ	○										
2755	火打石沢橋	国道112号	1979	42	97.0	9.7	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅲ							○	□	□					床版補修
2756	頭光滝沢橋	国道112号	1978	43	108.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2757	中の沢橋	国道112号	1979	42	66.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ							○							
2758	下楓沢橋	国道112号	1978	43	113.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ							○							
2759	上楓沢橋	国道112号	1978	43	128.0	9.5	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
2760	道行沢橋	国道112号	1977	44	125.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ							○							
2761	田代沢橋	国道112号	1977	44	103.0	9.2	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ							○							
2762	八木ノ沢橋	国道112号	1967	54	14.2	10.8	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2763	新海味橋	国道112号	1967	54	8.5	8.0	RC		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2764	向野溝橋	国道112号	1965	56	3.8	13.6	RC		山形	寒河江	山形県	山形市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2765	石子沢橋	国道112号	1962	59	11.5	23.0	PC		山形	寒河江	山形県	中山町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2766	新滝見橋	国道112号	1965	56	8.4	10.3	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅱ							○							
2767	鳴沢川橋	国道13号	1982	39	22.8	23.5	PC		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ						○								
2768	山形大橋	国道13号	1968	53	253.9	16.5	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
2769	双月跨道橋（上）	国道13号	1968	53	15.6	8.6	PC		山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ							○	□						ひびわれ補修
2770	双月跨道橋（下）	国道13号	1974	47	15.6	8.6	PC		山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ							○	□						伸縮装置補修
2771	野呂川橋	国道13号	2011	10	29.9	18.5	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2772	楯山橋（上）	国道13号	1967	54	115.3	8.8	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ						○								
2773	楯山橋（下）	国道13号	1975	46	115.3	11.0	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○							□	□	□	床版補修
2774	天童大橋（上）	国道13号	1967	54	230.1	11.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
2775	天童大橋（下）	国道13号	1976	45	230.1	11.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2776	押切川橋（上）	国道13号	1971	50	65.2	20.0	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅲ						○		□						断面修復
2777	万代大橋（上）	国道13号	1970	51	255.9	9.9	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2778	万代大橋（下）	国道13号	1980	41	257.2	10.0	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H29	Ⅱ							○		□	□	□			床版補修
2779	神町跨道橋（上）	国道13号	1972	49	45.0	9.2	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H30	Ⅱ							○	□						ひびわれ補修
2780	かみのやま高架橋	国道13号	2000	21	312.0	13.3	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2781	神町跨道橋（下）	国道13号	1980	41	45.0	9.2	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H30	Ⅱ							○							
2782	山形南ＩＣ橋（半郷跨道橋）	国道13号	2001	20	26.9	14.9	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2783	神町跨線橋側道橋（下）	国道13号	1971	50	36.0	7.4	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H30	Ⅱ							○							
2784	長老１号橋	国道48号	2000	21	16.5	13.5	PC		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2785	長老２号橋	国道48号	2000	21	18.0	13.5	PC		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2786	柳沢橋	国道48号	2000	21	32.5	13.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅱ	○										
2787	青龍１号橋	国道48号	1999	22	45.5	13.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2788	第１赤滝橋	国道48号	1967	54	31.1	8.7	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H30	Ⅰ							○							
2789	第２赤滝橋	国道48号	1967	54	40.1	8.7	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H30	Ⅲ							○						□	伸縮装置補修
2790	胸倉沢橋	国道48号	1967	54	54.0	8.7	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H30	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2791	大洞橋	国道48号	1967	54	80.0	8.7	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H30	Ⅱ							○							
2792	西原橋	国道48号	1965	56	15.9	8.1	RC		山形	山形	山形県	東根市	H28	Ⅱ						○								
2793	本郷橋	国道48号	1980	41	73.7	11.3	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H30	Ⅱ								○						
2794	新原崎橋	国道48号	1971	50	44.6	9.0	PC		山形	山形	山形県	天童市	H30	Ⅱ								○						
2795	新貴船川橋	国道112号	1970	51	22.6	9.3	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2796	船町橋	国道112号	1970	51	205.9	9.4	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○						
2797	滝の沢１号橋	国道48号	2000	21	32.5	13.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
2798	滝の沢２号橋	国道48号	2000	21	32.0	13.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅱ	○										
2799	松山高架橋（上）	国道13号	2001	20	185.0	8.7	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2800	松山高架橋（下）	国道13号	2001	20	185.0	8.9	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2801	関山溝橋１	国道48号	1965	56	4.5	9.5	RC		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅲ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
2802	山口溝橋２	国道48号	1971	50	3.9	11.8	RC		山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅰ						○								
2803	元木橋	国道112号	1997	24	45.2	15.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
2804	一貫清水橋	国道112号	1960	61	8.0	15.0	RC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2805	思川橋	国道13号	1991	30	22.1	11.0	PC		山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ						○								
2806	藤吾跨道橋	国道13号	1991	30	27.8	11.0	PC		山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ						○								
2807	関根跨道橋	国道13号	1991	30	24.0	11.9	PC		山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ						○								
2808	須川橋	国道13号	1987	34	97.0	9.3	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ						○				□	□			断面修復
2809	蔵王大橋（上）	国道13号	1978	43	160.4	11.3	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅱ							○							
2810	蔵王大橋（下）	国道13号	1998	23	166.6	11.3	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					床版補修
2811	青龍２号橋	国道48号	1999	22	33.7	13.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										断面修復
2812	松尾川橋（上）	国道13号	1973	48	11.4	11.4	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2813	松尾川橋（下）	国道13号	1982	39	11.4	11.4	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2814	飯田高架橋（上）	国道13号	1991	30	300.0	8.8	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
2815	飯田高架橋（下）	国道13号	1991	30	300.0	8.8	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
2816	竜山川橋（上）	国道13号	1966	55	14.0	10.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2817	竜山川橋（下）	国道13号	1968	53	14.0	10.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2818	楯山跨線橋（上）	国道13号	1968	53	13.5	8.8	RC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2819	楯山跨線橋（下）	国道13号	1976	45	13.5	19.2	RC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅲ	伸縮装置補修	R1	Ⅰ	○										
2820	楯山跨線側道橋	国道13号	1976	45	13.6	7.7	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2821	青柳橋（上）	国道13号	1967	54	9.7	12.6	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2822	青柳橋（下）	国道13号	1976	45	9.7	11.8	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2823	漆山跨道橋（上）	国道13号	1967	54	14.1	11.4	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○							□	□		断面修復
2824	漆山跨道橋（下）	国道13号	1976	45	14.1	11.4	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2825	倉津川橋（上）	国道13号	1971	50	12.3	15.0	PC		山形	山形	山形県	天童市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2826	倉津川橋（下）	国道13号	1980	41	12.3	9.6	PC		山形	山形	山形県	天童市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2827	古瀬川橋（上）	国道13号	1971	50	10.5	12.4	PC		山形	山形	山形県	天童市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2828	古瀬川橋（下）	国道13号	1980	41	10.5	12.4	PC		山形	山形	山形県	天童市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2829	小白川第１跨道橋（上）	国道13号	1966	55	11.5	9.5	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2830	小白川第１跨道橋（下）	国道13号	1968	53	11.5	9.5	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2831	小白川第２跨道橋（上）	国道13号	1966	55	11.9	12.6	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2832	小白川第２跨道橋（下）	国道13号	1968	53	11.9	13.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
2833	飯田橋	国道112号	1960	61	11.5	7.0	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2834	梨木溝橋	国道112号	1965	56	10.5	7.3	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										断面修復
2835	新田川側道橋（下）	国道13号	1978	43	40.0	1.6	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2836	新田川側道橋（上）	国道13号	1983	38	41.7	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2837	指首野川橋（歩道橋（上））	国道13号	1998	23	24.0	2.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2838	新泉田橋側道橋	国道13号	2000	21	156.0	3.0	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
2839	上台歩道橋	国道13号	1978	43	25.0	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅲ	床版防水					○								
2840	金山歩道橋（下）	国道13号	1984	37	77.9	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2841	金山歩道橋（上）	国道13号	1969	52	77.8	1.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2842	中田歩道橋（下）	国道13号	1974	47	29.5	1.5	混合橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2843	中田歩道橋（上）	国道13号	1980	41	45.5	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
2844	塩根歩道橋	国道13号	1974	47	45.7	1.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	真室川町	H29	Ⅱ							○							
2845	砂子沢歩道橋	国道47号	1977	44	40.5	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H28	Ⅱ						○								
2846	新関屋歩道橋	国道13号	1982	39	48.9	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅱ							○							
2847	二つ屋歩道橋（下）	国道13号	1976	45	16.0	1.1	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅲ	床版補修	R2	Ⅱ		○									
2848	清水川橋歩道橋	国道13号	1982	39	8.8	2.3	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅲ							○					□		床版補修
2849	乱川歩道橋	国道47号	2010	11	8.5	1.5	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2850	乱川橋（側歩道橋（下））	国道47号	1998	23	8.3	2.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2851	土湯歩道橋	国道47号	1979	42	17.0	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H28	Ⅰ						○								
2852	糠野目橋側歩道橋	国道13号	1969	52	197.8	1.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
2853	津久茂橋側歩道橋	国道13号	1971	50	31.5	1.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅰ							○							
2854	高畠跨線橋側歩道橋	国道13号	1986	35	43.4	2.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H29	Ⅱ							○							
2855	台山橋側歩道橋（下）	国道13号	1976	45	14.0	1.8	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2856	台山橋側歩道橋（上）	国道13号	1976	45	15.5	1.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2857	赤湯跨線橋側歩道橋	国道13号	1986	35	33.0	2.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2858	黒井橋側歩道橋	国道13号	1962	59	6.6	1.3	PC		山形	米沢	山形県	高畠町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2859	武川橋側歩道橋	国道113号	1977	44	15.2	1.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2860	田の沢橋側歩道橋	国道113号	1977	44	14.4	1.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅰ		○									
2861	小国大沢川橋側道橋	国道113号	1987	34	18.7	2.0	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ						○								
2862	漆穂橋側歩道橋	国道113号	1988	33	24.1	1.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2863	赤坂橋側歩道橋（上）	国道113号	1976	45	80.9	1.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅱ		○									
2864	赤坂橋側歩道橋（下）	国道113号	1983	38	80.9	1.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2865	手の子橋側歩道橋	国道113号	1976	45	101.3	2.0	鋼橋		山形	米沢	山形県	飯豊町	H28	Ⅲ	部材交換					○			□					床版取替
2866	芦沢跨線歩道橋	国道13号	1983	38	37.0	1.6	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅱ		R1	Ⅲ	○										支承補修
2867	名木沢歩道橋（下）	国道13号	1984	37	43.4	2.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
2868	紫山側道歩道橋	国道13号	1985	36	25.1	2.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	舟形町	H29	Ⅲ							○		□	□				床版防水
2869	寒風沢歩道橋（上）	国道47号	2002	19	14.0	1.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2870	堺田跨線歩道橋	国道47号	1981	40	40.1	1.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅰ	○										
2871	坊ヶ沢橋側歩道橋（上）	国道47号	1974	47	6.8	1.4	RC		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2872	絹出川橋側歩道橋	国道47号	1985	36	95.1	1.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅰ								○						
2873	向町跨線橋側歩道橋	国道47号	1987	34	51.0	1.4	混合橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
2874	白川橋歩道橋	国道47号	1973	48	172.2	1.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅱ						○								
2875	大堀側道橋（大堀跨線橋側道橋）	国道47号	1994	27	29.0	2.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2876	小横川橋歩道橋（上）	国道47号	1980	41	30.4	2.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
2877	戦沢橋側歩道橋	国道47号	1982	39	9.5	1.8	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2878	笈ノ沢橋歩道橋	国道47号	1973	48	20.0	1.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅱ						○								
2879	上野橋歩道橋（下）	国道112号	1979	42	20.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
2880	新熊野川歩道橋（下）	国道112号	1986	35	54.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2881	新熊野川歩道橋（上）	国道112号	1979	42	55.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅰ						○								
2882	新間沢橋側歩道橋（上）	国道112号	1981	40	64.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2883	新間沢橋側歩道橋（下）	国道112号	1992	29	59.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2884	新宝沢橋側道橋（上）	国道112号	1988	33	68.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅰ						○								
2885	新宝沢橋側道橋（下）	国道112号	1995	26	70.0	2.5	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅰ						○								
2886	新網取橋歩道橋	国道112号	1987	34	64.0	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
2887	新水沢橋歩道橋	国道112号	1986	35	97.0	1.8	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2888	八木ノ沢側道橋	国道112号	1981	40	16.0	1.4	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2889	新海味歩道橋（下）	国道112号	1985	36	8.6	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2890	新海味歩道橋（上）	国道112号	1985	36	8.5	2.0	鋼橋		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2891	新滝見橋側道橋	国道112号	1967	54	7.0	2.0	PC		山形	寒河江	山形県	西川町	H29	Ⅰ							○							
2892	楯山橋側歩道橋	国道13号	1984	37	115.6	2.0	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ						○								
2893	西原歩道橋（下）	国道48号	1972	49	19.9	1.6	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H28	Ⅱ						○								
2894	新原崎橋歩道橋	国道48号	1980	41	44.6	1.4	鋼橋		山形	山形	山形県	天童市	H30	Ⅲ								○						□	当て板補強
2895	馬見ヶ崎歩道橋	国道13号	1973	48	119.9	3.0	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅰ							○							
2896	飯田歩道橋（上）	国道112号	1973	48	11.5	1.6	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ						○								
2897	吉野川橋	国道113号	2002	19	122.6	10.4	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2898	岩渡戸橋（上）	国道113号	1974	47	21.0	5.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ						○								
2899	村山跨道橋（上）	国道13号	1973	48	6.3	11.0	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H30	Ⅱ								○						
2900	村山跨道橋（下）	国道13号	1989	32	6.3	11.5	PC		山形	尾花沢	山形県	村山市	H30	Ⅱ								○						
2901	新原の橋（上）	国道13号	1978	43	46.3	11.4	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H30	Ⅰ								○						
2902	福原跨道橋	E13	2005	16	21.2	11.9	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2903	八鍬沢川橋	E13	2002	19	160.0	10.2	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H30	Ⅰ								○						
2904	上の原跨線橋	E13	2002	19	65.8	10.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2905	名木沢大橋	E13	2001	20	230.0	10.4	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H30	Ⅰ								○						
2906	川原子跨道橋	E13	2003	18	50.0	10.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
2907	高堂不動滝橋	E13	2004	17	51.0	9.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅱ								○	□	□				ひびわれ補修
2908	中田前坂橋	E13	2004	17	45.5	12.0	鋼橋		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅱ								○	□	□				ひびわれ補修
2909	猪鼻高架橋	国道47号	1975	46	330.0	8.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村	H30	Ⅲ							○					□	□	床版補修
2910	あこや橋（上）（東原跨道橋）	国道13号	1996	25	17.2	8.3	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2911	あこや橋（下）（東原跨道橋）	国道13号	1996	25	17.2	8.3	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2912	新原の橋（下）	国道13号	1998	23	46.3	7.0	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H30	Ⅱ								○						
2913	新堀川橋（下）	国道112号	1963	58	10.5	10.3	PC		山形	寒河江	山形県	中山町	H29	Ⅰ							○							
2914	新堀川橋（上）	国道112号	1963	58	10.5	10.3	PC		山形	寒河江	山形県	中山町	H29	Ⅰ							○							
2915	太郎水橋	E13	2007	14	9.5	12.5	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅱ								○						
2916	新沼台橋	E13	2005	16	25.5	12.0	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅰ						○								
2917	八森橋	E13	2000	21	25.7	11.0	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅰ								○						
2918	丸森橋	E13	2000	21	20.0	11.0	PC		山形	新庄	山形県	金山町	H30	Ⅰ								○						
2919	水上橋	E13	2003	18	44.0	11.0	PC		山形	新庄	山形県	真室川町	H30	Ⅰ								○						
2920	及位楯山橋	E13	2002	19	21.1	12.0	PC		山形	新庄	山形県	真室川町	H30	Ⅰ								○						
2921	川口橋（上）	国道13号	2006	15	67.0	13.0	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2922	川口橋（下）	国道13号	2002	19	48.0	13.0	鋼橋		山形	山形	山形県	上山市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2923	入間向橋	国道48号	2004	17	39.3	10.2	PC		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2924	大滝橋	国道48号	2004	17	40.8	10.2	PC		山形	山形	山形県	東根市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2925	織機川橋	国道113号	2007	14	21.0	10.5	PC		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2926	西落合こ道橋	国道113号	2007	14	37.2	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅱ						○								
2927	中落合こ道橋	国道113号	2007	14	89.0	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								
2928	高梨こ道橋	国道113号	2007	14	39.0	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅱ						○								
2929	中ノ目こ線橋	国道113号	2005	16	60.0	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅱ						○								
2930	中ノ目こ道橋（上）	国道113号	2006	15	30.5	10.5	PC		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								
2931	鍋田こ道橋	国道113号	2007	14	19.9	19.8	PC		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								
2932	長崎大橋（上）	国道112号	2007	14	341.3	10.8	鋼橋		山形	寒河江	山形県	中山町	H28	Ⅰ						○								
2933	赤湯こ道橋	国道113号	2006	15	36.3	10.5	鋼橋		山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								
2934	新庄南こ道橋	E13	2008	13	85.5	17.2	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2935	松本第１こ道橋	E13	2009	12	72.0	10.5	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2936	松本第２こ道橋	E13	2009	12	21.5	11.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
2937	升形川橋	E13	2007	14	42.7	11.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2938	宮内こ道橋	E13	2007	14	41.1	11.3	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
2939	新指首野川橋	E13	2007	14	36.5	11.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
2940	飛田こ道橋	E13	2008	13	22.3	11.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
2941	十日町こ線橋	E13	2009	12	43.0	11.2	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H30	Ⅱ								○						
2942	西山こ道橋	E13	2010	11	26.4	11.3	PC		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
2943	月山沢陸橋ランプ橋（ＯＮ）	国道112号	1979	42	30.3	6.0	RC		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅲ						○					□	□		断面修復
2944	月山沢陸橋ランプ橋（ＯＦＦ）	国道112号	1979	42	60.6	6.0	RC		山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅲ						○					□	□		断面修復
2945	西原歩道橋（上）	国道48号	2010	11	23.7	2.5	鋼橋		山形	山形	山形県	東根市	H28	Ⅰ						○								
2946	野呂川橋側道橋（上）	国道13号	2012	9	29.9	8.9	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2947	野呂川橋側道橋（下）	国道13号	2012	9	29.9	8.9	PC		山形	山形	山形県	山形市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
2948	万世橋（上）	国道13号	2009	12	125.0	11.3	鋼橋		山形	米沢	山形県	米沢市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
2949	じゃんけん橋	国道113号	1969	52	10.4	8.4	PC		山形	米沢	山形県	小国町	H30	Ⅰ								○						
2950	南原跨道橋２（上）	国道13号	2013	8	11.7	12.5	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2951	ボックス０１３０４９９６０	国道13号	2008	13	3.9	10.7	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○							
2952	ボックス０１３０５００７８	国道13号	2008	13	2.9	13.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○							
2953	ボックス０１３０５６８５１	国道13号	2004	17	2.4	13.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H29	Ⅰ							○							
2954	ボックス０１３０５６９５５	国道13号	2004	17	2.4	13.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H29	Ⅱ							○							
2955	ボックス０１３０５７２１０	国道13号	2004	17	3.6	13.7	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H29	Ⅰ							○							
2956	ボックス０１３０７３９６０	国道13号	2001	20	2.9	20.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅰ							○							
2957	ボックス０１３０７７６４０	国道13号	2001	20	3.9	29.7	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2958	ボックス０１３０７７６４６	国道13号	2001	20	3.9	29.7	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2959	ボックス０１３０８０８６８	国道13号	2001	20	6.0	27.2	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2960	ボックス０１３０８１４２４	国道13号	2001	20	2.9	25.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2961	ボックス０１３０８１４８２	国道13号	2001	20	2.9	24.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2962	ボックス０１３０８２７００	国道13号	2001	20	3.9	7.6	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
2963	市道塔の前線ＢＯＸ（ボックス０１３０８３４０８）	国道13号	1973	48	7.0	28.5	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2964	松尾川農道ＢＯＸ（ボックス０１３０８３５８０）	国道13号	1973	48	7.0	24.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2965	ボックス０１３０８５６５１	国道13号	1973	48	4.9	36.7	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
2966	ボックス０１３０８８９３７	国道13号	1967	54	3.4	26.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅲ		○									
2967	ボックス０１３０９０９３９	国道13号	1967	54	3.1	52.5	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅰ							○							
2968	ボックス０１３０９３８３１	国道13号	1968	53	3.0	26.5	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
2969	十文字ずい道ＢＯＸ（ボックス０１３０９７４９６）	国道13号	1968	53	3.1	26.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
2970	ボックス０１３１０４７２８	国道13号	1971	50	3.0	27.0	－	○	山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
2971	ボックス０１３１０７７６０	国道13号	1971	50	2.9	23.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	天童市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
2972	ボックス０１３１０７８８３	国道13号	1971	50	6.4	23.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	天童市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
2973	ボックス０１３１５２４５０	国道13号	1967	54	3.5	17.5	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅱ						○							
2974	ボックス０１３１６５４８５	国道13号	1964	57	3.4	9.6	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅰ						○							
2975	ボックス０１３１６５６５８	国道13号	1964	57	2.5	9.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅰ						○							
2976	ボックス０１３１６５６８３	国道13号	1964	57	4.9	9.7	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅰ						○							
2977	ボックス０１３１６８７０８	国道13号	1965	56	3.3	25.2	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅱ						○							
2978	ボックス０１３１７６２８０	国道13号	1965	56	4.0	8.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H28	Ⅱ						○							
2979	ボックス０１３１８４２５５	国道13号	2000	21	5.4	13.9	－	○	山形	新庄	山形県	真室川町	H28	Ⅰ						○							
2980	ボックス０１３１８４５０５	国道13号	2000	21	2.9	23.5	－	○	山形	新庄	山形県	真室川町	H28	Ⅰ						○							
2981	ボックス０１３１８５２８６	国道13号	2000	21	3.4	12.4	－	○	山形	新庄	山形県	真室川町	H28	Ⅰ						○							
2982	ボックス０１３１８５４１４	国道13号	2000	21	4.4	12.5	－	○	山形	新庄	山形県	真室川町	H28	Ⅱ						○							
2983	ボックス０１３０６８８４０	国道13号	2011	10	5.4	11.1	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅰ							○						
2984	ボックス０１３１３７２６７	E13	2004	17	4.4	13.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
2985	ボックス０１３１３７４４０	E13	2004	17	6.1	14.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
2986	ボックス０１３１４９８７２	E13	1999	22	5.9	12.5	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○							
2987	ボックス１１２００７３２８	国道112号	1971	50	2.2	8.8	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ						○							
2988	ボックス１１２０１６９３４	国道112号	1979	42	4.9	22.7	－	○	山形	寒河江	山形県	中山町	H28	Ⅱ						○							
2989	ボックス１１２０１８１４５	国道112号	2000	21	5.4	34.8	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○							
2990	ボックス１１２０１８７２５	国道112号	2000	21	5.4	21.7	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○							
2991	ボックス１１２０１８９４２	国道112号	2000	21	2.9	33.1	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅱ						○							
2992	ボックス１１３１２０７１８	国道113号	2007	14	5.2	13.1	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
2993	法師柳矢ノ目線ＢＯＸ（ボックス１１３１２０９４０）	国道113号	2007	14	4.7	19.3	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
2994	片子地下横断歩道（地下道０１３０４１６５０）	国道13号	1996	25	4.4	22.4	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○					
2995	成沢地下横断歩道（地下道０１３０８４６７５）	国道13号	1973	48	2.4	26.4	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
2996	飯田南横断地下道（地下道０１３０８５９４５）	国道13号	1994	27	3.4	40.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
2997	飯田北横断地下道（地下道０１３０８６１２３）	国道13号	1994	27	2.4	37.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅰ								○					
2998	飯田西の前横断地下道（地下道０１３０８６３７５）	国道13号	1993	28	2.4	40.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅰ								○					
2999	松山横断地下道（地下道０１３０８９３２７）	国道13号	2003	18	3.7	60.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅰ								○					
3000	千歳横断地下道（地下道０１３０８９７９２）	国道13号	1967	54	4.0	35.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
3001	山家地下横断歩道（地下道０１３０９３１６７）	国道13号	1968	53	2.4	25.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
3002	大野目地下横断歩道（地下道０１３０９３９８６）	国道13号	1968	53	2.5	25.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
3003	土生田地下道（地下道０１３１２６０１２）	国道13号	2000	21	3.4	35.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	村山市	H30	Ⅱ								○					
3004	横内南地下横断歩道（地下道０１３１２７９５１）	国道13号	2001	20	3.8	34.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町	H30	Ⅱ								○					
3005	横内地下道（地下道０１３１２８６０８）	国道13号	2000	21	3.8	28.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町	H30	Ⅱ								○					
3006	鉄砲町地下横断歩道（地下道１１２００２３００）	国道112号	2004	17	7.9	15.6	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅱ								○					
3007	南小路横断地下道（地下道１１２０１５９９２）	国道112号	1979	42	2.9	30.0	－	○	山形	寒河江	山形県	中山町	H30	Ⅱ								○					
3008	館横断地下道（地下道１１２０１６１７８）	国道112号	1979	42	2.9	30.0	－	○	山形	寒河江	山形県	中山町	H30	Ⅱ								○					
3009	北小路横断地下道（地下道１１２０１６３７８）	国道112号	1979	42	3.2	30.0	－	○	山形	寒河江	山形県	中山町	H30	Ⅱ								○					
3010	本楯１号地下道（地下道１１２０２００４８）	国道112号	1985	36	3.7	27.0	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H30	Ⅰ								○					
3011	本楯２号地下道（地下道１１２０２０３７５）	国道112号	1985	36	3.7	27.0	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H30	Ⅱ								○					
3012	西根地下道（地下道１１２０２１７６２）	国道112号	1986	35	2.9	33.2	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H30	Ⅰ								○					
3013	睦合第１横断地下道（地下道１１２０３１３７５）	国道112号	1999	22	3.2	16.4	－	○	山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ								○					
3014	睦合第２横断地下道（地下道１１２０３２２６０）	国道112号	1999	22	2.9	13.4	－	○	山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ								○					
3015	海味地下横断歩道（地下道１１２０３３２０９）	国道112号	1996	25	3.5	25.0	－	○	山形	寒河江	山形県	西川町	H30	Ⅱ								○					

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3016	深沼地下横断歩道（地下道０１３０５７８０５）	国道113号	2003	18	4.7	15.0	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町	H30	Ⅱ							○							
3017	向原地下横断歩道（地下道０１３０３８７８５）	国道13号	2012	9	4.4	29.2	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅰ							○							
3018	道上前地下横断歩道（地下道０１３０３９２１０）	国道13号	2012	9	3.4	31.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅰ							○							
3019	万世町片子横断地下道（地下道０１３０４０４００）	国道13号	2012	9	3.6	6.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H30	Ⅰ							○							
3020	ボックス０１３０６８４６５	国道13号	2011	10	5.6	12.1	－	○	山形	米沢	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3021	赤坂揚橋線ＢＯＸ（ボックス０１３０７３４９０）	国道13号	1992	29	5.4	14.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅰ							○							
3022	ボックス０１３０７３７７５	国道13号	1992	29	4.4	14.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅰ							○							
3023	ボックス０１３０３６３７２	国道13号	1965	56	2.4	18.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅰ							○							
3024	ボックス０１３０４４２１４	国道13号	1970	51	4.3	19.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○							
3025	ボックス０１３０４４５１２	国道13号	1968	53	3.4	4.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○							
3026	ボックス０１３０４８３３５	国道13号	1970	51	2.8	18.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅱ							○							
3027	ボックス０１３０４９７７２	国道13号	1970	51	2.5	9.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅲ							○					□		断面修復
3028	ボックス０１３０５０２７４	国道13号	1970	51	2.9	14.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市	H29	Ⅰ							○							
3029	ボックス０１３０５３６５６	国道13号	1970	51	2.4	13.0	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅰ							○							
3030	ボックス０１３０５５９９５	国道13号	1970	51	3.3	11.0	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅰ							○							
3031	ボックス０１３０５６１９８	国道13号	1970	51	3.9	10.0	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅱ							○							
3032	ボックス０１３０５６３３６	国道13号	1970	51	3.0	13.0	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町	H29	Ⅱ							○							
3033	ボックス０１３０７４６１５	国道13号	1992	29	6.1	11.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3034	ボックス０１３０７４８８５	国道13号	1992	29	6.1	12.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3035	ボックス０１３０７５６３０	国道13号	1992	29	4.7	11.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3036	ボックス０１３０７５８４０	国道13号	1992	29	4.7	11.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3037	ボックス０１３０７６０６２	国道13号	1992	29	6.4	10.6	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3038	ボックス０１３０７６２７５	国道13号	1986	35	3.2	15.8	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3039	ボックス０１３０８２７３０	国道13号	2001	20	5.4	15.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3040	ボックス０１３０８２７７０	国道13号	2001	20	3.9	7.6	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3041	ボックス０１３０８４９７９	国道13号	1992	29	7.0	25.3	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3042	ボックス０１３０９３２４７	国道13号	1968	53	2.9	26.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3043	ボックス０１３０９４０４８	国道13号	1968	53	3.0	26.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3044	ボックス０１３０９６１４２	国道13号	1968	53	2.9	30.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅰ							○							
3045	ボックス０１３１０００６２	国道13号	1967	54	2.4	24.0	－	○	山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3046	ボックス０１３１０２０７２	国道13号	1967	54	2.6	28.3	－	○	山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3047	ボックス０１３１０５１４３	国道13号	1967	54	2.0	24.5	－	○	山形	山形	山形県	天童市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3048	ボックス０１３１１０５９１	国道13号	1973	48	3.0	24.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3049	ボックス０１３１１３０９３	国道13号	1973	48	4.6	23.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3050	ボックス０１３１１３５２０	国道13号	1973	48	3.1	27.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3051	ボックス０１３１１３６４３	国道13号	1973	48	5.6	25.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3052	ボックス０１３１１３８２３	国道13号	1973	48	3.1	24.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3053	ボックス０１３１２２８１０	国道13号	1973	48	3.1	26.7	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3054	横内函渠（ボックス０１３１２８５００）	国道13号	2001	20	9.5	8.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ						○								
3055	大海平函渠（ボックス０１３１３９８０５）	E13	2001	20	9.0	12.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3056	滝ノ沢函渠（ボックス０１３１４１４７０）	E13	2004	17	8.0	24.2	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3057	沖ノ原函渠（ボックス０１３１４６５２０）	E13	1998	23	8.5	32.7	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
3058	家ノ前函渠（ボックス０１３１４６６８５）	E13	1998	23	8.5	24.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
3059	宮内西函渠（ボックス０１３１５２８６０）	E13	2008	13	13.3	12.5	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
3060	向町函渠（ボックス０４７０９５８０５）	国道47号	1998	23	13.5	13.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期						主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3061	本宮前函渠（ボックス０４７１１９７７５）	国道47号	1998	23	8.0	31.5	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅰ						○								
3062	大作函渠（ボックス１１３１１９８９０）	国道113号	2007	14	11.0	14.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
3063	漆山第３函渠（ボックス１１３１２０４５０）	国道113号	2007	14	13.5	12.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
3064	大上函渠（ボックス１１３１２０８５５）	国道113号	2007	14	9.2	13.2	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
3065	北原函渠（ボックス１１３１２１１６０）	国道113号	2008	13	10.5	46.3	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○								
3066	上無川オフランプ函渠（ボックス１１３１２１２５０）	国道113号	2008	13	16.0	8.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H30	Ⅱ								○						
3067	上無川オンランプ函渠（ボックス１１３１２１３００）	国道113号	2008	13	16.0	8.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H30	Ⅱ								○						
3068	萩生田函渠（ボックス１１３１２２４００）	国道113号	2007	14	9.8	30.0	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○								
3069	中ノ目函渠（ボックス１１３１２４３４０）	国道113号	2007	14	24.5	8.8	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○								
3070	堀田アーチ（ボックス１１３１２５６２０）	国道113号	2003	18	9.2	12.5	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市	H28	Ⅰ						○								
3071	飯田橋（下）	国道112号	2014	7	19.0	6.4	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ						○								
3072	大野目高架橋（上）	国道13号	2013	8	110.0	8.5	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ						○								
3073	大野目高架橋（下）	国道13号	2013	8	110.0	8.5	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市	H28	Ⅱ						○								
3074	田町ご道橋	国道13号	2009	12	21.8	11.3	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3075	丹生川橋	国道13号	2010	11	243.7	10.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3076	荻袋第１ご道橋	国道13号	2009	12	19.2	12.0	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3077	荻袋第２ご道橋	国道13号	2009	12	19.1	12.0	PC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3078	野黒沢高架橋	国道13号	2013	8	598.3	10.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	大石田町	H28	Ⅱ						○								
3079	福宮ご道橋	国道47号	2014	7	57.6	11.3	鋼橋		山形	新庄	山形県	新庄市	H28	Ⅱ						○								
3080	上野橋歩道橋（上）	国道112号	2014	7	24.6	2.8	PC		山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅱ						○								
3081	尾花沢新庄第１４号函渠	E13	2008	13	10.0	26.4	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3082	尾花沢新庄第１６号函渠	E13	2008	13	12.2	18.9	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3083	尾花沢新庄第１１号函渠	E13	2002	19	5.0	13.4	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3084	尾花沢新庄第１５号函渠	E13	2004	17	8.1	13.4	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町	H28	Ⅱ						○								
3085	新庄古口第５号函渠	国道47号	2013	8	6.3	25.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅱ							○							
3086	新庄古口第８号函渠	国道47号	2013	8	5.9	39.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
3087	新庄古口第９号函渠	国道47号	2012	9	6.3	69.6	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
3088	ボックス０１３１２５３９０	国道13号	1991	30	4.4	25.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	村山市	H29	Ⅰ							○							
3089	ボックス０１３１２６２４８	国道13号	2001	20	5.2	28.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	村山市	H28	Ⅰ						○								
3090	ボックス０１３１２７０８０	国道13号	2001	20	6.0	28.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	村山市	H28	Ⅰ						○								
3091	ボックス０１３１３０６５５	国道13号	1977	44	2.4	59.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅱ							○							
3092	ボックス０１３１３２６６９	国道13号	1984	37	4.4	14.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅰ						○								
3093	ボックス０１３１３２８８４	国道13号	1984	37	5.4	14.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3094	ボックス０１３１３３０５４	国道13号	1984	37	4.4	17.6	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H28	Ⅱ						○								
3095	ボックス０１３１３５０５６	国道13号	1983	38	4.9	18.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅱ							○							
3096	ボックス０１３１４６３４４	国道13号	1961	60	3.4	10.0	－	○	山形	新庄	山形県	舟形町	H30	Ⅱ								○						
3097	ボックス０１３１５３１７６	国道13号	1977	44	2.4	15.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H30	Ⅱ								○						
3098	ボックス０４７０９０２０９	国道47号	1968	53	2.4	11.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅱ						○								
3099	ボックス０４７０９５５８１	国道47号	1969	52	3.4	11.1	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
3100	ボックス０４７０９６５６１	国道47号	1969	52	3.4	12.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅱ								○						
3101	ボックス０４７０９８４２０	国道47号	1958	63	2.5	11.2	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
3102	ボックス０４７０９８６７３	国道47号	1958	63	2.4	7.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅰ							○							
3103	ボックス０４７０９９５５５	国道47号	1958	63	2.4	12.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H30	Ⅱ								○						
3104	ボックス０４７１０４０８５	国道47号	1966	55	3.6	7.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅰ						○								
3105	ボックス０４７１０４５５２	国道47号	1966	55	4.2	8.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H28	Ⅱ						○								

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3106	ボックス０４７１０８９２８	国道47号	1969	52	2.0	7.9	－	○	山形	新庄	山形県	舟形町	H28	Ⅰ						○								
3107	ボックス０４７１０９１８１	国道47号	1988	33	2.6	7.5	－	○	山形	新庄	山形県	舟形町	H28	Ⅱ						○								
3108	ボックス０４７１４５４２５	国道47号	1966	55	3.5	8.5	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村	H28	Ⅱ						○								
3109	ボックス０４７１５２８２０	国道47号	1967	54	3.9	8.0	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村	H28	Ⅱ						○								
3110	ボックス１１３０７８１１５	国道113号	1970	51	2.4	6.5	－	○	山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3111	ボックス１１３０８７２２５	国道113号	1968	53	2.4	10.9	－	○	山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3112	ボックス１１３０９１６９９	国道113号	1959	62	3.2	8.0	－	○	山形	米沢	山形県	小国町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3113	ボックス１１３１０３８３９	国道113号	1972	49	4.0	11.0	－	○	山形	米沢	山形県	飯豊町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3114	ボックス１１３１０９０９０	国道113号	1963	58	4.0	13.1	－	○	山形	米沢	山形県	飯豊町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3115	ボックス１１３１１０４１８	国道113号	1963	58	4.4	13.5	－	○	山形	米沢	山形県	飯豊町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3116	ボックス１１３１１１６７３	国道113号	1963	58	2.2	12.7	－	○	山形	米沢	山形県	川西町	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3117	ボックス１１３１１４３４０	国道113号	1970	51	3.4	11.0	－	○	山形	米沢	山形県	長井市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3118	ボックス１１３１１６０３３	国道113号	1971	50	3.9	8.5	－	○	山形	米沢	山形県	川西町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3119	ボックス０１３０８００５８	国道13号	1978	43	10.4	40.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
3120	ボックス１１２０１３３０３	国道112号	1965	56	5.4	8.9	－	○	山形	山形	山形県	中山町	H28	Ⅱ						○								
3121	ボックス１１２０１６５５１	国道112号	1962	59	5.6	22.6	－	○	山形	寒河江	山形県	中山町	H28	Ⅰ						○								
3122	ボックス１１２０１７３１８	国道112号	1971	50	4.9	25.8	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3123	ボックス１１２０１７５２９	国道112号	1971	50	5.4	20.6	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3124	ボックス１１２０１９９５６	国道112号	1985	36	2.9	28.6	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3125	ボックス１１２０２１０５０	国道112号	1985	36	3.9	27.3	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3126	ボックス１１２０２１７４９	国道112号	1985	36	2.9	49.5	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H29	Ⅰ						○								
3127	ボックス１１２０２２２７０	国道112号	1985	36	3.4	35.1	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3128	ボックス１１２０２６７９０	国道112号	1985	36	3.0	41.6	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H29	Ⅰ						○								
3129	ボックス１１２０２６９４０	国道112号	1985	36	4.8	38.0	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H29	Ⅰ						○								
3130	ボックス１１２０２８３８２	国道112号	1985	36	5.4	18.1	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H28	Ⅰ						○								
3131	ボックス１１２０３１２２０	国道112号	1968	53	2.0	17.0	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H29	Ⅰ						○								
3132	ボックス１１２０４３８０５	国道112号	1969	52	3.4	8.6	－	○	山形	寒河江	山形県	西川町	H28	Ⅱ						○								
3133	昭和橋跨線橋（下）	国道112号	2016	5	18.0	15.9	RC		山形	山形	山形県	山形市	H30	Ⅰ								○						
3134	ボックス０４７０９３１８０	国道47号	1970	51	3.5	11.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町	H29	Ⅱ							○							
3135	ボックス０１３０８３２４０	国道13号	1973	48	7.0	27.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
3136	ボックス０１３１７８６２０	E13	2002	19	5.0	13.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3137	ボックス０１３１７８１１０	E13	2002	19	4.5	13.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3138	ボックス０１３１８２１２０	E13	2003	18	3.5	13.0	－	○	山形	新庄	山形県	真室川町	H29	Ⅱ							○							
3139	ボックス０１３１７５１６０	E13	2004	17	5.6	13.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3140	ボックス０１３１７４７５０	E13	2004	17	5.0	13.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3141	ボックス０１３０６９９２０	国道13号	2005	16	7.7	18.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市	H29	Ⅰ							○							
3142	ボックス０１３１４５７５０	E13	1998	23	7.0	25.0	－	○	山形	新庄	山形県	舟形町	H29	Ⅱ							○							
3143	ボックス０１３１７６８５０	E13	2004	17	5.0	22.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3144	ボックス０１３１７６２２０	E13	2004	17	5.0	22.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町	H29	Ⅰ							○							
3145	ボックス０１３１７６３６０	E13	2004	17	8.0	22.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
3146	ボックス０１３１４７４８０	E13	1998	23	4.0	23.5	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
3147	ボックス０１３０８２９８０	国道13号	1973	48	7.0	30.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅱ							○							
3148	ボックス０１３０９１８８０	国道13号	1968	53	4.0	18.1	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅰ							○							
3149	ボックス０１３０９６６１０	国道13号	1968	53	3.0	25.5	－	○	山形	山形	山形県	山形市	H29	Ⅲ							○			□	□			断面修復
3150	ボックス０１３１３６９６０	E13	2003	18	5.7	11.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3151	ボックス０１３１３８５６０	E13	1997	24	6.5	63.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅱ							○							
3152	ボックス０１３１３９７３０	E13	2001	20	5.8	16.6	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅰ							○							
3153	ボックス０１３１４１２７０	E13	2004	17	5.1	23.5	－	○	山形	尾花沢	山形県	尾花沢市	H29	Ⅱ							○							
3154	ボックス０４７１２０５２０	国道47号	2001	20	6.0	12.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市	H29	Ⅰ							○							
3155	ボックス１１２０２７６６０	国道112号	1999	22	2.5	21.0	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市	H29	Ⅰ						○								
3156	五十沢川橋	E13	2012	9	25.3	11.3	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	大石田町				R1	Ⅰ	○										
3157	朧気川橋	E13	2009	12	62.4	10.5	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市				R1	Ⅱ	○										
3158	家の下跨道橋	E13	2014	7	30.8	12.8	PC		山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3159	村山野川橋	E13	2018	3	63.7	12.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅱ		○									
3160	新小見川橋	E13	2010	11	64.2	12.0	鋼橋		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3161	新羽入跨道橋（上）	E13	2009	12	23.5	13.0	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3162	新羽入跨道橋（下）	E13	2009	12	23.5	10.8	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3163	東根ICBランプ橋	E13	2009	12	21.5	7.1	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3164	荷口川橋（上）	E13	2009	12	21.0	10.8	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3165	荷口川橋（下）	E13	2009	12	21.0	13.9	PC		山形	尾花沢	山形県	東根市				R2	Ⅰ		○									
3166	最上川大橋	国道47号	2018	3	570.2	10.2	鋼橋		山形	新庄	山形県	戸沢村				R2	Ⅱ		○									
3167	昭和橋跨線橋（上）	国道112号	2018	3	18.0	15.9	鋼橋		山形	山形	山形県	山形市								○								
3168	第28号函渠	国道47号	2010	11	11.4	47.5	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村				R2	Ⅰ		○									
3169	第32号水路函渠	国道47号	2016	5	3.5	31.0	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村				R2	Ⅰ		○									
3170	第29号函渠	国道47号	2013	8	5.2	16.6	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村				R2	Ⅰ		○									
3171	第31号函渠	国道47号	2012	9	4.6	24.0	－	○	山形	新庄	山形県	戸沢村				R2	Ⅰ		○									
3172	土生田39号函渠	E13	2017	4	3.3	40.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3173	大石田1号函渠	E13	2017	4	7.5	27.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3174	土生田38号函渠	E13	2017	4	9.8	63.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3175	尾花沢6号函渠	E13	2017	4	5.2	14.4	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3176	尾花沢8号函渠	E13	2017	4	2.6	18.6	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3177	尾花沢9号函渠	E13	2017	4	5.4	15.3	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3178	尾花沢11号函渠	E13	2017	4	6.4	27.2	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3179	尾花沢13号函渠	E13	2017	4	6.4	46.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	大石田町				R2	Ⅰ		○									
3180	大富1号函渠	E13	2018	3	15.9	29.3	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3181	大富3号函渠	E13	2018	3	14.2	30.6	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3182	大富15号函渠	E13	2012	9	11.0	24.8	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3183	小田島16号函渠	E13	2018	3	6.2	17.7	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3184	小田島30号函渠	E13	2013	8	13.4	42.1	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3185	小田島23号函渠	E13	2010	11	18.2	13.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3186	小田島20号函渠	E13	2018	3	6.2	17.2	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3187	小田島29号函渠	E13	2009	12	14.2	28.2	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市								○								
3188	ボックス112028200	国道112号	1999	22	5.0	25.5	－	○	山形	寒河江	山形県	寒河江市				R1	Ⅰ	○										
3189	ボックス112040770	国道112号	1969	52	2.0	40.0	－	○	山形	寒河江	山形県	西川町				R1	Ⅱ	○										
3190	ボックス113097090	国道113号	1973	48	3.0	12.0	－	○	山形	米沢	山形県	小国町				R1	Ⅱ	○										
3191	ボックス113121090	国道113号	2008	13	6.1	40.0	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅰ	○										
3192	ボックス113121800	国道113号	2008	13	6.4	25.0	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅰ	○										
3193	ボックス113122615	国道113号	2008	13	4.3	49.2	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅱ	○										
3194	やまがた16浜崎アンダー	国道13号	2013	8	6.0	39.3	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅰ	○										
3195	ボックス013043240	国道13号	1970	51	2.0	17.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3196	ボックス013045610	国道13号	1969	52	2.7	20.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市				R1	Ⅲ	○									□	断面修復
3197	ボックス013045650	国道13号	1969	52	3.0	28.0	－	○	山形	米沢	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3198	ボックス013058020	国道13号	1988	33	5.0	12.5	－	○	山形	米沢	山形県	高畠町				R1	Ⅱ	○										
3199	ボックス013058885	国道113号	2002	19	5.0	26.7	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅰ	○										
3200	ボックス013059930	国道13号	1988	33	2.0	43.0	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅱ	○										
3201	ボックス013061390	国道13号	1988	33	5.0	15.0	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅱ	○										
3202	ボックス013067315	国道13号	2010	11	3.0	26.1	－	○	山形	米沢	山形県	南陽市				R1	Ⅱ	○										
3203	ボックス013076190	国道13号	1992	29	4.0	10.5	－	○	山形	山形	山形県	上山市				R1	Ⅱ	○										
3204	ボックス013078445	国道13号	1987	34	2.0	37.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市				R1	Ⅱ	○										
3205	ボックス013078560	国道13号	1987	34	6.0	29.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市				R1	Ⅱ	○										
3206	ボックス013079110	国道13号	1987	34	6.0	28.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市				R1	Ⅱ	○										
3207	ボックス013079440	国道13号	1987	34	5.5	29.0	－	○	山形	山形	山形県	上山市				R1	Ⅰ	○										
3208	ボックス013084520	国道13号	1973	48	3.0	24.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅰ	○										
3209	ボックス013087500	国道13号	1966	55	2.0	25.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅰ	○										
3210	ボックス013092190	国道13号	1968	53	3.0	42.5	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅱ	○										
3211	ボックス013095540	国道13号	1968	53	2.0	25.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅰ	○										
3212	ボックス013097090	国道13号	1968	53	3.0	40.0	－	○	山形	山形	山形県	山形市				R1	Ⅱ	○										
3213	ボックス013108040	国道13号	1972	49	4.0	25.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	東根市				R1	Ⅱ	○										
3214	ボックス013125370	国道13号	1973	48	2.5	24.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	村山市				R1	Ⅱ	○										
3215	ボックス013154120	国道13号	1963	58	2.0	15.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市				R1	Ⅰ	○										
3216	ボックス013154950	国道13号	1963	58	2.5	11.7	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市				R1	Ⅱ	○										
3217	ボックス013155160	E13	2010	11	2.0	15.0	－	○	山形	新庄	山形県	新庄市				R1	Ⅰ	○										
3218	ボックス013177260	E13	2005	16	4.8	25.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町				R1	Ⅰ	○										
3219	ボックス013178170	E13	2002	19	3.5	21.0	－	○	山形	新庄	山形県	金山町				R1	Ⅰ	○										
3220	ボックス047093910	国道47号	1969	52	2.0	8.0	－	○	山形	尾花沢	山形県	最上町				R1	Ⅱ	○										
3221	尾花沢7号函渠	国道13号	2017	4	2.1	31.0	RC		山形	尾花沢	山形県	尾花沢市				R2	Ⅰ		○									
3222	堀田アーチ（ボックス013058750）	国道113号	2003	18	9.2	34.5	PC		山形	米沢	山形県	南陽市				R2	Ⅰ		○									
3223	女鹿高架橋	国道7号	1999	22	106.2	11.9	PC		酒田	酒田	山形県	遊佐町	H30	Ⅱ	床版防水							○						
3224	新広田橋	国道7号	1976	45	104.7	24.7	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3225	新両羽橋（上）	国道7号	1974	47	723.2	10.1	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3226	新両羽橋（下）	国道7号	1991	30	723.2	10.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H27	Ⅱ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○				□					塗替塗装
3227	両羽二号溝橋（上）	国道7号	1971	50	14.9	12.5	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅱ								○						
3228	両羽二号溝橋（下）	国道7号	1971	50	14.9	12.0	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅱ	断面修復							○						
3229	酒田跨線橋（上）	国道7号	1989	32	26.5	17.5	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅰ								○						
3230	酒田跨線橋（下）	国道7号	1972	49	26.5	11.4	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅰ								○						
3231	新井田川橋（上）	国道7号	1991	30	57.5	12.5	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H27	Ⅱ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○				□					塗替塗装
3232	新井田川橋（下）	国道7号	1972	49	47.5	11.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					伸縮装置取替
3233	酒田高架橋（下）	国道7号	1971	50	304.5	9.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					伸縮装置取替
3234	宮海橋	国道7号	1965	56	223.2	7.8	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ						○				□				伸縮装置取替
3235	宮海高架橋（上）	国道7号	1998	23	190.5	8.8	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ							○							
3236	宮海高架橋（下）	国道7号	1996	25	189.0	8.9	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ							○		□				□	断面修復
3237	東雲橋	国道47号	1969	52	266.0	8.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	庄内町	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○									
3238	狩川西ご線橋	国道47号	1981	40	34.2	15.8	鋼橋		酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ								○						
3239	広田１号溝橋	国道7号	1976	45	22.8	30.8	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3240	おばこ大橋	国道7号	1994	27	400.4	11.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	三川町	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性H26-30		年度	健全性R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3241	鳥海大橋	国道7号	1996	25	303.0	11.9	鋼橋		酒田	酒田	山形県	遊佐町	H30	Ⅲ							○	□					床版補修
3242	両羽１号橋	国道7号	1971	50	9.1	25.2	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3243	大町３号溝橋	国道7号	1971	50	6.3	35.9	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ							○						□	防護柵補修
3244	鼠ヶ関川橋	国道7号	1970	51	91.4	8.3	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○					□					洗掘対策
3245	早田陸橋	国道7号	2004	17	103.0	11.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3246	小岩川陸橋	国道7号	2004	17	237.6	11.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	床版防水					○			□	□				伸縮装置取替
3247	岩川大橋	国道7号	2000	21	106.7	11.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3248	港橋	国道7号	2004	17	120.0	11.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ	床版防水						○		□				□	伸縮装置取替
3249	温海川橋	国道7号	2005	16	70.0	16.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ								○						
3250	温福陸橋	国道7号	2005	16	159.0	11.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ								○						
3251	暮坪橋	国道7号	1997	24	35.0	13.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ							○							
3252	湯尻川橋	国道7号	1992	29	54.6	13.0	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3253	小波渡陸橋	国道7号	2004	17	88.0	12.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3254	三瀬陸橋	国道7号	2000	21	71.1	10.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
3255	三瀬橋	国道7号	1999	22	44.8	11.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3256	羽越橋	国道7号	1963	58	250.4	8.0	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅲ								○					□	塗替塗装
3257	新橋	国道7号	1990	31	24.6	13.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3258	鈴跨線橋	国道7号	1968	53	21.8	9.2	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□	□				塗替塗装
3259	古川橋	国道112号	1978	43	41.2	12.8	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	床版防水	R2	Ⅱ		○									
3260	外内島橋	国道112号	1973	48	31.2	19.8	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3261	早田橋	国道7号	1962	59	11.4	9.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ								○						
3262	（酒田）（鶴岡市）１号溝橋	国道112号	1978	43	15.7	12.8	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3263	（酒田）（鶴岡市）２号溝橋	国道112号	1970	51	13.5	12.8	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3264	内川橋（上）	国道112号	2000	21	64.0	11.3	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3265	内川橋（下）	国道112号	1979	42	64.0	11.5	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○				□					伸縮装置補修
3266	砥浦橋	国道7号	1964	57	6.3	8.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3267	巌沢橋（巌川橋）	国道7号	2004	17	10.3	12.2	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3268	矢流橋	国道7号	1965	56	8.4	8.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	床版防水	R2	Ⅱ		○									
3269	戸田沢橋	国道7号	2002	19	5.4	8.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ								○						
3270	平畑橋	国道7号	1965	56	5.3	8.2	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3271	矢引川橋	国道7号	2000	21	19.0	10.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3272	大戸川橋	国道7号	1963	58	13.5	8.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3273	大滝沢橋	国道7号	1965	56	9.4	7.6	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ								○						
3274	新五十川橋	国道7号	1981	40	46.0	13.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3275	鶴岡高架橋（上）	国道7号	1987	34	380.0	11.0	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3276	神田淵橋	国道7号	1965	56	12.5	8.2	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3277	上清水橋	国道7号	1962	59	4.4	15.6	RC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○							
3278	米山橋	国道112号	1973	48	70.0	8.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	ひびわれ補修	R2	Ⅱ		○									
3279	岩石橋	国道112号	1971	50	76.5	8.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3280	境橋	国道112号	1973	48	130.0	8.3	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○								□	□	塗替塗装
3281	大網川橋（上）	国道112号	1973	48	114.5	7.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅲ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
3282	新大網川橋（下）	国道112号	1988	33	136.0	6.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3283	大網橋	国道112号	1972	49	90.8	8.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3284	中の橋	国道112号	1969	52	86.0	9.0	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○					□	□	□			支承取替
3285	長瀞橋	国道112号	1968	53	97.1	8.5	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3286	早田川橋	国道112号	1970	51	62.0	8.1	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○						□	伸縮装置取替
3287	新名川橋	国道112号	1972	49	94.3	8.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H27	Ⅱ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○				□					
3288	水無川橋	国道112号	2006	15	17.7	17.0	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3289	善人沢橋	国道112号	1972	49	11.5	10.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○	□					伸縮装置取替
3290	湯殿山橋	国道112号	1975	46	40.0	10.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3291	八紘沢橋	国道112号	1978	43	90.0	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅲ						○						□		支承取替
3292	梵字川橋	国道112号	1975	46	50.2	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅲ	床版取替					○				□				部材交換
3293	鍋倉沢橋	国道112号	1975	46	160.0	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ						○								
3294	独鈷橋	国道112号	1978	43	18.6	10.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○								
3295	とりや沢橋	国道112号	1977	44	84.7	9.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅲ	塗替塗装					○						□		床版取替
3296	七ツ滝橋	国道112号	1975	46	65.7	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅲ		○							□	□	伸縮装置補修
3297	護身仏橋	国道112号	1975	46	30.0	10.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○								
3298	一本松橋	国道112号	1978	43	40.0	10.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	断面修復					○								
3299	十座沢橋	国道112号	1978	43	128.6	9.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3300	中台橋	国道112号	1975	46	30.0	10.5	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3301	岩菅沢橋	国道112号	1978	43	169.0	9.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○			□					塗替塗装
3302	田麦川橋	国道112号	1978	43	234.4	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅲ	支承取替					○				□				部材交換
3303	牡丹餅沢橋	国道112号	1974	47	108.0	9.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○					□					塗替塗装
3304	鶴の里橋	国道112号	1977	44	40.0	10.2	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅲ	塗替塗装					○				□				断面修復
3305	鷹匠橋	国道112号	1975	46	112.0	9.7	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ	塗替塗装					○			□	□				断面修復
3306	大清水橋	国道112号	1975	46	63.0	9.5	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3307	角田川橋	国道112号	1984	37	14.6	16.8	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3308	青龍寺川橋	国道112号	1983	38	27.0	20.0	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3309	黒沢橋	国道112号	2003	18	67.0	20.8	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3310	朝日１号溝橋	国道112号	1970	51	11.5	8.5	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○							
3311	朝日２号溝橋	国道112号	1970	51	6.3	8.5	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○					□	□	床版防水
3312	朝日３号溝橋	国道112号	1970	51	12.5	8.7	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3313	両羽２号溝橋側道橋	国道7号	1985	36	14.9	2.4	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅱ								○						
3314	宮海橋側道橋（上）	国道7号	1982	39	224.2	1.8	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ	伸縮装置補修					○			□	□				塗替塗装
3315	東雲橋側道橋	国道47号	1994	27	267.0	1.4	鋼橋		酒田	酒田	山形県	庄内町	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○					□				塗替塗装
3316	鼠ヶ関側道橋	国道7号	1985	36	81.0	2.0	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3317	羽越側道橋	国道7号	1975	46	250.4	1.4	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅲ								○				□	□	床版補修
3318	鈴跨線橋側道橋	国道7号	1977	44	42.8	1.9	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3319	早田側道橋	国道7号	1986	35	12.2	1.4	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ						○								
3320	砥浦側道橋	国道7号	1969	52	10.5	2.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅱ							○							
3321	戸田沢橋側道橋	国道7号	2002	19	7.9	1.6	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3322	大戸川側道橋	国道7号	1976	45	13.6	2.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3323	大滝沢側道橋	国道7号	1966	55	10.4	1.5	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3324	朝日１号溝橋歩道橋	国道112号	1997	24	15.5	2.5	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3325	朝日２号溝橋歩道橋	国道112号	1997	24	13.5	2.5	PC		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ							○							
3326	なびら雪吊り橋	国道112号	1997	24	79.0	2.8	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3327	広田側道橋	国道7号	1995	26	133.4	2.0	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ							○			□				伸縮装置取替
3328	宮海橋側道橋（下）	国道7号	1991	30	224.2	1.8	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅲ						○			□	□				伸縮装置取替
3329	酒田高架橋（上）	国道7号	2006	15	307.0	12.2	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3330	鶴岡高架橋（下）	国道7号	2008	13	380.1	11.2	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3331	堅苔沢橋	国道7号	2008	13	97.0	12.2	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3332	名川橋	国道112号	1931	90	66.1	2.0	鋼橋		酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3333	庄内小国川橋	E7	2003	18	80.4	10.3	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○					□	支承補修
3334	あつみ温泉橋	E7	2004	17	218.0	10.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○					□	支承補修
3335	いらがわ橋	E7	2010	11	43.9	11.3	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3336	川内袋橋（本線・ランプ）	E7	2009	12	26.3	22.8	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3337	西川橋	E7	2006	15	76.5	10.2	RC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3338	三瀬橋（ランプ）	E7	2008	13	69.7	5.9	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3339	三瀬川橋	E7	2006	15	28.0	11.2	RC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3340	降矢川大橋	E7	2009	12	211.5	10.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3341	矢引峠橋（上）	E7	2008	13	32.8	10.7	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3342	矢引峠橋（下）	E7	2008	13	33.1	10.7	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○					□	断面修復
3343	大谷川橋（上）	E7	2008	13	32.3	10.7	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3344	八沢川橋	E7	2008	13	30.7	11.2	RC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3345	中清水橋	E7	2009	12	177.0	10.3	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3346	湯尻川橋（下）	国道7号	2011	10	54.1	12.0	鋼橋		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3347	新橋側道橋	国道7号	2011	10	24.6	2.3	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3348	矢流側道橋	国道7号	2012	9	17.0	1.4	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3349	徒歩（かち）橋	国道112号	2011	10	44.6	29.0	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3350	大谷川橋（下）	E7	2008	13	32.3	10.7	PC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ								○						
3351	広田１号溝橋側道橋	国道7号	1976	45	41.2	1.9	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅲ						○				□				伸縮装置取替
3352	広田２号溝橋（上）	国道7号	1975	46	21.3	9.0	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅱ								○			□			断面修復
3353	広田２号溝橋（下）	国道7号	1975	46	23.8	9.0	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅲ								○				□		断面修復
3354	広田２号溝橋（ランプ）	国道7号	1975	46	18.4	11.3	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H30	Ⅱ								○			□			断面修復
3355	中清水－１３９．９８５ｋｐボックス	国道7号	2010	11	6.0	24.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3356	鶴岡西ＩＣ地下横断歩道	国道7号	2010	11	3.8	23.4	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3357	矢馳－１４２．６５２ｋｐボックス	国道7号	1990	31	7.0	33.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3358	白山－１４２．９７８ｋｐボックス	国道7号	1990	31	4.0	36.9	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3359	布目－１４４．４１６ｋｐボックス	国道7号	1990	31	2.1	46.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3360	播磨－１４８．９８４ｋｐボックス	国道7号	2002	19	11.2	22.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3361	中京田－１５０．１２１ｋｐボックス	国道7号	2003	18	13.5	22.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3362	中京田－１５０．４６０ｋｐボックス	国道7号	2002	19	5.4	22.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3363	青山－１５１．５３０ｋｐボックス	国道7号	2002	19	12.0	28.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3364	青山－１５１．８２０ｋｐボックス	国道7号	2002	19	2.2	8.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3365	青山－１５２．４４８ｋｐボックス	国道7号	2002	19	13.2	26.9	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3366	東沼－１５２．５９３ｋｐ（下）ボックス	国道7号	2002	19	2.2	8.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3367	東沼－１５２．５９３ｋｐ（上）ボックス	国道7号	2002	19	2.2	8.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3368	神花－１５３．２７２ｋｐボックス	国道7号	2002	19	13.2	22.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3369	猪子－１５３．６６０ｋｐボックス	国道7号	2002	19	5.9	22.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3370	猪子－１５３．７６０ｋｐ（下）ボックス	国道7号	2002	19	2.4	9.2	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3371	猪子－１５３．７６０ｋｐ（上）ボックス	国道7号	2002	19	2.4	8.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3372	猪子－１５４．０４８ｋｐボックス	国道7号	2002	19	5.9	12.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3373	猪子－１５４．１４７ｋｐ（上）ボックス	国道7号	2002	19	2.2	8.3	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3374	猪子－１５４．１４７ｋｐ（下）ボックス	国道7号	2002	19	2.2	8.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3375	成田新田地下道	国道7号	1994	27	5.9	30.1	－	○	酒田	鶴岡	山形県	三川町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3376	広野－１５６．３３２ｋｐボックス	国道7号	1994	27	9.4	30.9	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○				□					断面修復
3377	東両羽－１６６．７３８ｋｐボックス	国道7号	1971	50	2.2	34.7	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3378	新橋－１６９．４５９ｋｐボックス	国道7号	1971	50	2.7	47.0	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3379	北新橋－１６９．７６７ｋｐボックス	国道7号	1971	50	2.8	29.0	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3380	みどり地下道	国道7号	1972	49	3.5	27.0	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3381	下安地下道	国道7号	1992	29	2.7	23.2	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○				□					断面修復
3382	吉田新田－１７１．１７５ｋｐボックス	国道7号	2004	17	4.7	23.1	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3383	豊里－１７３．３０９ｋｐボックス	国道7号	1998	23	2.2	22.1	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3384	豊里－１７３．３８７ｋｐボックス	国道7号	1998	23	3.2	49.5	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3385	吹浦－１８９．１５０ｋｐボックス	国道7号	1998	23	3.2	15.0	－	○	酒田	酒田	山形県	遊佐町	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3386	狩川－１５９．０６５ｋｐボックス	国道47号	1980	41	3.7	17.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅰ		○				□					断面修復
3387	狩川－１５９．１６０ｋｐボックス	国道47号	1980	41	2.4	49.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3388	狩川－１６０．９８３ｋｐボックス	国道47号	1980	41	6.2	19.5	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3389	狩川－１６１．７３３ｋｐボックス	国道47号	1980	41	5.2	20.5	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3390	南野－１６５．２８７ｋｐボックス	国道47号	1988	33	2.0	20.5	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅰ							○							
3391	南野－１６５．３００ｋｐボックス	国道47号	1988	33	3.5	29.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3392	田麦俣－６９．７９６ｋｐボックス	国道112号	1990	31	2.7	21.0	－	○	酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ	断面修復							○						
3393	丸岡－８９．９３３ｋｐボックス	国道112号	1983	38	2.2	17.0	－	○	酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3394	丸岡－９０．０８５ｋｐボックス	国道112号	1983	38	2.2	27.0	－	○	酒田	月山	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3395	外内島－９２．３４０ｋｐボックス	国道112号	1978	43	4.4	33.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ	断面修復							○	□					断面修復
3396	八ツ興屋－９３．６８１ｋｐボックス	国道112号	1978	43	2.6	17.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3397	日出－９５．００２ｋｐボックス	国道112号	2000	21	2.4	24.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3398	切添－９６．１９５ｋｐボックス	国道112号	2000	21	13.2	22.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅱ						○								
3399	大宝寺－９６．７０８ｋｐボックス	国道112号	2000	21	3.2	30.4	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3400	道形－９７．１４２ｋｐボックス	国道112号	2000	21	5.4	25.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ	断面修復							○						
3401	日東道－三瀬－１１６．７９４ｋｐボックス	E7	2010	11	8.7	22.2	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H29	Ⅰ						○								
3402	日東道－大広－１２２．６９３ｋｐボックス	E7	2008	13	12.3	47.3	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3403	日東道－水沢－１２３．１９８ｋｐボックス	E7	2008	13	16.4	27.2	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3404	日東道－水沢－１２３．６５０ｋｐボックス	E7	2008	13	18.0	37.3	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3405	日東道－上清水－１２４．６３０ｋｐボックス	E7	2008	13	6.0	27.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3406	日東道－中清水－１２５．３０５ｋｐボックス	E7	2011	10	10.4	45.2	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3407	日東道－中清水－１２５．５１９ｋｐボックス	E7	2010	11	8.2	32.6	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3408	日東道－中清水－１２５．６４３ｋｐボックス	E7	2010	11	8.8	46.3	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3409	日東道－下清水－１２５．９６１ｋｐボックス	E7	2009	12	15.7	13.9	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3410	日東道－下清水－１２６．１６０ｋｐボックス	E7	2008	13	6.0	15.6	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3411	日東道－清水新田－１２６．５４８ｋｐボックス	E7	2009	12	15.3	13.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3412	日東道－清水新田－１２７．１００ｋｐボックス	E7	2011	10	17.2	20.5	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3413	日東道－矢馳－１２７．７６８ｋｐボックス	E7	2008	13	17.5	14.4	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3414	界橋	国道7号	1961	60	3.6	2.0	RC		酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H28	Ⅰ						○								
3415	両羽１号溝橋	国道7号	1971	50	6.4	24.3	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3416	庄内中央大橋	国道47号	2011	10	685.0	10.3	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ	床版防水					○								
3417	大町ご道橋	国道47号	2014	7	38.6	11.0	鋼橋		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ						○								
3418	大野Ｂランプ橋	国道47号	2014	7	26.1	7.9	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ						○			□					断面修復
3419	大野Ｃランプ橋	国道47号	2014	7	25.7	7.9	PC		酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅱ						○			□					断面修復
3420	余目酒田－新堀－１７３．７１７ｋｐボックス	国道47号	2013	8	2.3	27.7	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3421	余目酒田－新堀－１７４．６１７ｋｐボックス	国道47号	2012	9	6.7	21.4	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3422	余目酒田－新堀－１７４．８７８ｋｐボックス	国道47号	2010	11	6.0	11.0	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3423	余目酒田－砂越－１７５．５９２ｋｐボックス	国道47号	2008	13	6.0	10.2	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3424	余目酒田－砂越－１７６．３３１ｋｐボックス	国道47号	2013	8	9.8	29.9	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3425	余目酒田－小牧－１７６．４３２ｋｐボックス	国道47号	2009	12	15.0	32.5	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3426	余目酒田－小牧－１７６．９４３ｋｐボックス	国道47号	2010	11	6.0	40.8	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3427	余目酒田－大町－１７７．４８２ｋｐボックス	国道47号	2014	7	6.0	46.9	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3428	余目酒田－大町－１７８．４１５ｋｐボックス	国道47号	2014	7	12.0	31.2	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3429	余目酒田－酒田中央３ボックス	国道47号	2014	7	6.0	18.6	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H28	Ⅰ						○								
3430	奥井いなほ地下道-163.540kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	1997	24	7.0	47.3	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3431	宮海-173.495kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	不明	－	3.1	44.5	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ							○							
3432	京田地下道-164.780kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	1976	45	2.2	32.2	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3433	両羽1号橋-165.900kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	1991	30	6.5	28.4	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3434	両羽ランプ(左)-166.000kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	不明	－	2.0	27.5	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3435	管理用道路ﾎﾞｯｸｽ	国道47号	不明	－	6.3	14.2	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ							○							
3436	荒鍋地下道-160.000kpﾎﾞｯｸｽ	国道47号	1981	40	2.5	28.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅰ							○							
3437	南野地下道-164.870kpﾎﾞｯｸｽ	国道47号	1987	34	3.0	39.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅰ							○							
3438	南野-165.290kpﾎﾞｯｸｽ	国道47号	1988	33	2.0	44.5	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3439	北楯大堰-161.980kpﾎﾞｯｸｽ	国道47号	1980	41	5.8	63.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3440	下安町-170.34kpﾎﾞｯｸｽ	国道7号	1972	49	4.1	28.1	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市	H29	Ⅰ							○							
3441	70.089kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	1993	28	3.0	19.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ	断面修復							○						
3442	76.380kpﾎﾞｯｸｽ(越中山地下道)	国道112号	1992	29	3.5	34.4	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅱ	断面修復							○						
3443	94.919kpﾎﾞｯｸｽ(地下道)	国道112号	1979	42	2.5	22.6	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3444	97.173kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	1979	42	2.4	32.0	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3445	97.816kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	2012	9	2.4	32.3	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3446	98.482kpﾎﾞｯｸｽ(地下道)	国道112号	2012	9	3.1	38.2	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3447	98.939kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	2012	9	2.0	37.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3448	98.939kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	2012	9	2.0	19.1	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3449	99.100kpﾎﾞｯｸｽ	国道112号	2012	9	6.0	30.8	－	○	酒田	鶴岡	山形県	鶴岡市	H30	Ⅰ								○						
3450	農道-NO.110+18.00BOX	国道47号	2011	10	6.5	20.0	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ							○							
3451	県道-NO.129+5.20BOX	国道47号	2013	8	12.3	25.4	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ							○							
3452	農道-NO.149+6.40BOX	国道47号	2013	8	8.5	25.5	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ							○							
3453	余目-ICランプNO.223+3.763BOX	国道47号	2015	6	15.6	25.1	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ							○							
3454	県道-浜中余目線（NO.246+2.500BOX）	国道47号	2017	4	15.2	24.9	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅰ							○							
3455	農道-NO.290+19.00BOX	国道47号	2010	11	6.5	21.9	－	○	酒田	酒田	山形県	庄内町	H30	Ⅱ							○							
3456	庄内ご線橋	国道47号	2017	4	69.8	13.5	PC		酒田	酒田	山形県	庄内町				R1	Ⅱ	○										
3457	払田ご道橋	国道47号	2017	4	18.3	13.5	PC		酒田	酒田	山形県	庄内町				R1	Ⅱ	○										
3458	余目ご道橋	国道47号	2017	4	17.2	13.5	PC		酒田	酒田	山形県	庄内町				R1	Ⅱ	○										
3459	新堀ご道橋	国道47号	2017	4	34.1	13.5	PC		酒田	酒田	山形県	庄内町				R1	Ⅰ	○										
3460	広田地下道-178.120kpﾎﾞｯｸｽ	国道47号	1998	23	3.0	29.0	－	○	酒田	酒田	山形県	酒田市									○							
3461	戸崎跨道橋（上）	国道4号	2003	18	16.9	14.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H28	Ⅰ						○								
3462	戸崎跨道橋（下）	国道4号	2001	20	16.9	12.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H28	Ⅰ						○								
3463	三春橋（下）	国道4号	1974	47	9.9	11.4	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H30	Ⅱ								○						
3464	三春橋（上）	国道4号	1974	47	9.9	11.3	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H30	Ⅱ								○						
3465	安達太良橋（上）	国道4号	2003	18	39.1	12.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3466	安達太良橋（下）	国道4号	2002	19	39.1	12.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3467	長命橋（下）	国道4号	1998	23	65.5	11.8	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3468	長命橋（上）	国道4号	2001	20	65.5	14.4	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3469	北杉田跨道橋（下）	国道4号	1974	47	23.2	11.3	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3470	北杉田跨道橋（上）	国道4号	1974	47	23.2	11.3	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□					伸縮装置補修
3471	北杉田跨線橋（下）	国道4号	1974	47	35.7	11.1	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3472	北杉田跨線橋（上）	国道4号	1971	50	35.7	11.1	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅰ	○										
3473	羽石川橋（下）	国道4号	1974	47	27.5	11.3	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3474	羽石川橋（上）	国道4号	1971	50	27.5	11.3	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H27	Ⅲ	床版防水	R2	Ⅱ		○									
3475	冠木跨道橋（下）	国道4号	1974	47	16.6	11.1	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3476	冠木跨道橋（上）	国道4号	1971	50	16.6	11.1	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○					□					床版補修
3477	二本松高架橋（下）	国道4号	1974	47	209.5	10.0	混合橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅲ	伸縮装置補修	R1	Ⅲ	○					□	□	□	□	□	床版取替
3478	二本松高架橋（上）	国道4号	1971	50	224.6	10.0	混合橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○								□	□	床版補修
3479	油井高架橋（上）	国道4号	1981	40	801.4	10.4	混合橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○							□			支承補修
3480	油井高架橋（下）	国道4号	1995	26	801.4	10.8	混合橋		福島	福島	福島県	二本松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3481	米沢跨道橋（下）	国道4号	1987	34	19.0	11.8	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3482	米沢跨道橋（上）	国道4号	1980	41	19.0	11.8	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3483	瀬戸川橋（下）	国道4号	1990	31	17.5	11.8	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3484	瀬戸川橋（上）	国道4号	1990	31	17.5	11.8	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3485	蛭川橋（上）	国道4号	1995	26	17.8	11.9	PC		福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3486	蛭川橋（下）	国道4号	1995	26	17.8	11.9	PC		福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3487	払川橋（下）	国道4号	1989	32	35.1	11.8	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅰ						○								
3488	払川橋（上）	国道4号	1980	41	35.1	11.8	鋼橋		福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅰ						○								
3489	松陵橋（下）	国道4号	1982	39	52.4	11.8	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3490	松陵橋（上）	国道4号	1987	34	52.4	11.8	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3491	明内ご道橋（下）	国道4号	1985	36	21.5	11.8	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅲ							○		□					当て板補強
3492	明内ご道橋（上）	国道4号	1982	39	21.5	11.8	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅲ						○			□					当て板補強
3493	浅川橋（下）	国道4号	1984	37	40.3	16.1	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3494	浅川橋（上）	国道4号	1980	41	40.3	19.1	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3495	大古内ご道橋（下）	国道4号	1984	37	28.1	11.8	PC		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3496	大古内ご道橋（上）	国道4号	1982	39	28.1	11.8	PC		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3497	清水ご道橋（下）	国道4号	1984	37	12.6	12.9	RC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3498	清水ご道橋（上）	国道4号	1984	37	12.6	16.5	RC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3499	杉妻橋（下）	国道4号	1972	49	10.5	7.4	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3500	杉妻橋（上）	国道4号	1972	49	10.5	7.4	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3501	弁天橋（下）	国道4号	1972	49	235.0	10.5	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3502	弁天橋（上）	国道4号	1974	47	235.0	10.5	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3503	渡利橋（下）	国道4号	1972	49	11.4	7.4	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3504	渡利橋（上）	国道4号	1972	49	11.4	7.4	PC		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3505	大仏橋（下）	国道4号	1972	49	218.3	10.3	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3506	大仏橋（上）	国道4号	1973	48	218.3	10.3	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3507	松川橋（下）	国道4号	1976	45	169.6	7.8	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅱ	○					□	□				塗替塗装
3508	松川橋（上）	国道4号	1973	48	169.6	10.0	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅲ	床版補修	R1	Ⅲ	○					□	□	□	□		支承取替
3509	鎌田橋（下）	国道4号	1978	43	27.4	11.9	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3510	鎌田橋（上）	国道4号	1978	43	27.4	11.9	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅲ	○									□	当て板補強

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3511	瀬上橋（下）	国道4号	1978	43	144.8	10.8	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3512	瀬上橋（上）	国道4号	1958	63	144.0	9.0	PC		福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○				□	□				洗掘対策
3513	産ヶ沢橋（下）	国道4号	1989	32	27.7	11.9	PC		福島	福島	福島県	伊達市	H29	Ⅱ							○							
3514	産ヶ沢橋（上）	国道4号	1988	33	27.7	11.8	PC		福島	福島	福島県	伊達市	H29	Ⅱ							○							
3515	佐久間川橋（下）	国道4号	1998	23	22.1	12.1	PC		福島	福島	福島県	桑折町	H30	Ⅰ								○						
3516	滝川橋	国道4号	1960	61	20.7	8.6	鋼橋		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3517	六角溝橋	国道4号	1959	62	9.4	17.1	PC		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3518	姥上川溝橋	国道4号	2003	18	12.0	8.9	PC		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3519	吾妻高架橋（上）	国道13号	1994	27	371.3	8.5	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○						□				ひびわれ補修
3520	吾妻高架橋（下）	国道13号	2001	20	371.3	8.5	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3521	清水大橋（上）	国道13号	1997	24	266.0	11.5	混合橋		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3522	泉高架橋（上）	国道13号	1997	24	340.0	11.4	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3523	葭沢橋	国道13号	1991	30	49.4	11.2	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3524	馬川橋（上）	国道13号	1994	27	7.0	11.0	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3525	馬川橋（下）	国道13号	1994	27	7.0	11.0	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3526	西大橋（上）	国道13号	1990	31	414.5	11.5	RC		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3527	西大橋（下）	国道13号	1999	22	414.5	11.5	RC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3528	払川溝橋	国道13号	1965	56	5.3	23.8	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3529	信夫大橋（下）	国道13号	1967	54	194.0	11.3	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○		□	□				洗掘対策
3530	信夫大橋（上）	国道13号	1975	46	194.0	11.3	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○		□	□				洗掘対策
3531	福島ご線橋（下）	国道13号	1972	49	17.6	9.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅰ	○										
3532	福島ご線橋（上）	国道13号	1974	47	17.6	9.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅲ	伸縮装置補修	R1	Ⅰ	○										
3533	耳取川橋	国道13号	1997	24	14.8	28.0	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3534	八反田川橋（下）	国道13号	1968	53	20.5	10.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
3535	八反田川橋（上）	国道13号	1974	47	20.5	10.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅲ	塗替塗装	R1	Ⅱ	○										
3536	新小川橋	国道13号	1966	55	112.6	8.2	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅲ								○		□				断面修復
3537	篭岩橋（籠岩橋）	国道13号	2016	5	37.5	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅰ	○										
3538	杉ノ沢橋	国道13号	1963	58	34.7	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3539	山神橋	国道13号	1963	58	106.6	8.2	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅲ	○							□			支承補修
3540	大鍋橋	国道13号	1964	57	25.7	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3541	長老沢橋	国道13号	1964	57	40.8	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3542	大滝橋	国道13号	1992	29	165.0	9.5	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3543	西川橋	国道13号	1964	57	98.8	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅲ						○				□				塗替塗装
3544	猪ノ沢橋	国道13号	1965	56	43.2	8.3	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3545	大路橋	国道13号	1966	55	41.2	8.7	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅲ						○			□					当て板補強
3546	板谷大橋	国道13号	1965	56	115.4	8.5	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅲ							○		□					支承補修
3547	大仏側道橋	国道4号	1992	29	218.3	3.3	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3548	杉妻橋側歩道橋（下）	国道4号	1972	49	11.0	1.4	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○					□					部材交換
3549	杉妻橋側歩道橋（上）	国道4号	1972	49	11.0	1.9	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅲ		R1	Ⅰ	○					□					部材交換
3550	渡利橋側歩道橋（下）	国道4号	1972	49	11.4	2.4	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□					部材交換
3551	渡利橋側歩道橋（上）	国道4号	1972	49	11.4	2.4	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□					部材交換
3552	松川橋側歩道橋（下）	国道4号	1969	52	169.6	1.6	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○								□		支承取替
3553	滝川橋側歩道橋（下）	国道4号	1973	48	26.0	1.1	鋼橋		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅲ	床版防水	R1	Ⅲ	○										架替
3554	滝川橋側歩道橋（上）	国道4号	1973	48	29.9	1.8	鋼橋		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3555	無名側歩道橋（上）	国道4号	1959	62	12.0	2.6	鋼橋		福島	福島	福島県	国見町	H28	Ⅰ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3556	六角溝橋側歩道橋（上）	国道4号	1959	62	19.0	1.4	鋼橋		福島	福島	福島県	国見町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○									
3557	溝橋歩道橋（下）	国道4号	1959	62	2.8	3.0	RC		福島	福島	福島県	国見町	H28	Ⅰ						○								
3558	溝橋歩道橋（上）	国道4号	1959	62	4.3	1.4	RC		福島	福島	福島県	国見町	H28	Ⅰ						○								
3559	新小川橋側道橋（下）	国道13号	1978	43	112.6	1.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3560	新小川橋側道橋（上）	国道13号	1985	36	100.0	1.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3561	百日橋（下）	国道4号	2004	17	22.0	12.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3562	百日橋（上）	国道4号	2004	17	22.0	12.3	PC		福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3563	清水大橋（下）	国道13号	1997	24	266.0	11.5	混合橋		福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3564	福島ご線橋側道橋（下）	国道13号	1972	49	17.6	1.4	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○									
3565	泉高架橋（下）	国道13号	2002	19	340.0	11.4	PC		福島	栗子	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3566	宮の上ご道橋	国道4号	1974	47	35.4	3.5	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
3567	長老壇ご道橋	国道4号	1972	49	36.4	3.5	鋼橋		福島	福島	福島県	福島市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○									
3568	白土ご道橋	国道13号	1982	39	28.5	3.8	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○									
3569	吉倉ご道橋（下）	国道13号	2009	12	48.5	8.5	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3570	大森川橋Ａランプ橋（上）	国道13号	2009	12	23.9	10.4	RC		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3571	大森川橋Ｄランプ橋（下）	国道13号	2009	12	24.8	12.5	RC		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3572	油王田ご道橋	国道4号	1981	40	67.1	6.2	PC		福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3573	佐久間川橋（上）	国道4号	2008	13	22.1	12.1	PC		福島	福島	福島県	桑折町	H30	Ⅰ								○						
3574	吉倉ご道橋（上）	国道13号	2009	12	48.5	8.5	鋼橋		福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3575	荒井ボックス	国道4号	1981	40	4.2	25.8	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅱ							○							
3576	久保田ボックス	国道4号	1981	40	4.0	13.0	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅲ							○					□		ひびわれ補修
3577	上沢ボックス	国道4号	1981	40	3.0	25.7	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅱ							○							
3578	茂庭第１ボックス	国道4号	1990	31	3.0	26.9	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3579	茂庭第２ボックス	国道4号	1990	31	3.0	26.9	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3580	茂庭第３ボックス	国道4号	1990	31	7.0	26.0	－	○	福島	福島	福島県	本宮市	H29	Ⅰ							○							
3581	住吉ボックス	国道4号	1975	46	8.3	28.2	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅱ							○							
3582	杉田第１ボックス	国道4号	1999	22	5.0	25.5	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3583	杉田第２ボックス	国道4号	1983	38	9.8	26.7	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3584	羽石第１ボックス	国道4号	1975	46	6.8	44.4	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅲ							○					□		ひびわれ補修
3585	羽石第２ボックス	国道4号	1976	45	2.5	41.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅱ							○							
3586	作田ボックス	国道4号	1976	45	6.0	39.5	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅱ							○							
3587	榎戸ボックス	国道4号	1976	45	2.3	32.1	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅱ							○							
3588	北向ボックス	国道4号	1981	40	2.6	38.2	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3589	油井ボックス	国道4号	1982	39	3.5	23.3	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3590	松葉第１ボックス	国道4号	1981	40	5.0	31.6	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3591	松葉第２ボックス	国道4号	1981	40	2.5	36.3	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3592	渋川第１ボックス	国道4号	1981	40	10.6	30.6	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅰ							○							
3593	渋川第２ボックス	国道4号	1981	40	4.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3594	岩仏第１ボックス	国道4号	1981	40	4.4	31.6	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H29	Ⅱ							○							
3595	岩仏第２ボックス	国道4号	1981	40	4.0	25.1	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3596	光閑坊ボックス	国道4号	1981	40	4.0	29.5	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3597	硫黄田ボックス	国道4号	1981	40	7.0	24.5	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3598	舟山第１ボックス	国道4号	1981	40	5.0	32.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3599	舟山第２ボックス	国道4号	1981	40	4.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3600	舟山第３ボックス	国道4号	1981	40	4.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3601	赤木内ボックス	国道4号	1980	41	3.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3602	川下ボックス	国道4号	1980	41	3.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3603	掘込ボックス	国道4号	1979	42	8.0	29.0	－	○	福島	福島	福島県	二本松市	H28	Ⅱ						○								
3604	下川崎第１ボックス	国道4号	1979	42	4.0	38.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3605	下川崎第２ボックス	国道4号	1979	42	5.0	29.4	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3606	下川崎第３ボックス	国道4号	1979	42	7.5	30.1	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3607	下川崎第４ボックス	国道4号	1979	42	5.0	31.3	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3608	下川崎第５ボックス	国道4号	1979	42	7.5	29.2	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3609	下川崎第６ボックス	国道4号	1979	42	2.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3610	下川崎第７ボックス	国道4号	1979	42	3.4	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3611	下川崎第８ボックス	国道4号	1979	42	3.4	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3612	沼袋第１ボックス	国道4号	1979	42	4.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3613	沼袋第２ボックス	国道4号	1979	42	3.0	9.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3614	沼袋第３ボックス	国道4号	1979	42	3.0	9.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3615	金沢第１ボックス	国道4号	1979	42	3.4	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3616	金沢第２ボックス	国道4号	1979	42	3.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3617	金沢第３ボックス	国道4号	1979	42	6.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3618	金沢第４ボックス	国道4号	1979	42	3.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3619	金沢第５ボックス	国道4号	1979	42	2.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3620	金沢第６ボックス	国道4号	1979	42	6.5	30.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3621	金沢第７ボックス	国道4号	1979	42	2.5	37.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3622	金沢第８ボックス	国道4号	1979	42	4.2	28.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3623	金沢第９ボックス	国道4号	1980	41	3.4	30.2	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3624	浅川第１ボックス	国道4号	1979	42	6.5	31.1	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3625	浅川第２ボックス	国道4号	1979	42	3.5	43.3	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3626	浅川第３ボックス	国道4号	1979	42	3.5	43.3	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3627	浅川第４ボックス	国道4号	1980	41	3.5	32.9	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3628	浅川第５ボックス	国道4号	1980	41	4.9	37.5	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3629	浅川第６ボックス	国道4号	1976	45	6.5	37.6	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3630	浅川第７ボックス	国道4号	1976	45	4.0	61.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3631	一本松ボックス	国道4号	1976	45	2.5	29.4	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3632	平石第１ボックス	国道4号	1976	45	2.5	22.5	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3633	平石第２ボックス	国道4号	1976	45	3.0	22.5	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3634	平石第３ボックス	国道4号	1976	45	8.3	22.5	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3635	伏拝ボックス	国道4号	1976	45	4.0	21.9	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3636	黒岩第１ボックス	国道4号	1976	45	3.3	21.6	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3637	黒岩第２ボックス	国道4号	1976	45	2.5	21.6	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3638	瀬上ボックス	国道4号	1979	42	2.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3639	鍛冶屋川ボックス	国道4号	1979	42	2.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	伊達市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3640	原島ボックス	国道4号	1981	40	2.0	25.0	－	○	福島	福島	福島県	伊達市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3641	一本木ボックス	国道4号	1981	40	2.0	26.5	－	○	福島	福島	福島県	伊達市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3642	岡沼ボックス	国道4号	1981	40	3.5	25.0	－	○	福島	福島	福島県	伊達市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3643	杉ノ前ボックス	国道4号	1992	29	2.0	27.2	－	○	福島	福島	福島県	桑折町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3644	石母田ボックス	国道4号	1978	43	5.0	10.7	－	○	福島	福島	福島県	国見町	H28	Ⅱ						○								
3645	御山ボックス	国道13号	1975	46	2.5	30.0	－	○	福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期				修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3646	平野ボックス	国道13号	1975	46	4.6	30.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3647	高取前第１ボックス	国道13号	1984	37	4.0	10.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3648	高取前第２ボックス	国道13号	1987	34	3.0	11.5	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3649	沼ノ原ボックス	国道13号	1988	33	2.5	15.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3650	栃窪ボックス	国道13号	1988	33	3.0	16.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3651	中野ボックス	国道13号	1988	33	5.0	31.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅱ						○								
3652	円部ボックス	国道13号	1988	33	2.5	15.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H28	Ⅰ						○								
3653	仁井田第１ボックス	国道13号	1988	33	5.5	45.6	–	○	福島	福島	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3654	仁井田第２ボックス	国道13号	1990	31	2.0	40.0	–	○	福島	福島	福島県	福島市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3655	南中央ボックス	国道13号	1992	29	6.0	45.0	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3656	泉ボックス	国道13号	1999	22	5.0	49.5	–	○	福島	栗子	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3657	新八反田川橋	E13	2009	12	70.0	10.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H29	Ⅰ							○							
3658	野寺内橋	E13	2015	6	52.1	21.8	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H29	Ⅱ							○							
3659	月崎ご道橋	E13	2013	8	33.0	11.7	PC		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3660	北八反田川橋	E13	2012	9	26.0	11.7	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3661	小川大橋	E13	2009	12	243.0	11.2	PC		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3662	新杉ノ沢橋	E13	2009	12	57.0	11.2	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3663	中野大橋	E13	2011	10	754.0	11.2	PC		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3664	朴沢大橋	E13	2010	11	315.0	11.2	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3665	新長老沢橋	E13	2014	7	76.0	11.2	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3666	新大鍋橋	E13	2015	6	168.0	11.2	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3667	大滝大橋	E13	2013	8	201.0	11.2	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3668	堤下橋	E13	2015	6	33.5	19.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ								○						
3669	彦平橋	E13	2017	4	43.7	14.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3670	石田川橋（ONランプ）	E13	2016	5	19.2	6.4	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3671	石田川橋（OFFランプ）	E13	2016	5	25.0	7.4	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3672	川向橋	E13	2013	8	38.0	14.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3673	新熊屋敷橋	E13	2014	7	67.0	12.8	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3674	広前橋	E13	2016	5	81.0	12.8	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅱ								○						
3675	犬飼大橋	E13	2016	5	173.0	12.8	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3676	布川大橋	E13	2016	5	203.0	12.8	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3677	当保志橋	E13	2014	7	80.0	12.8	RC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3678	月舘高架橋	E13	2016	5	462.0	12.8	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅱ								○						
3679	御代田ご道橋	E13	2014	7	39.7	14.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ								○						
3680	笹谷ボックス	E13	2007	14	11.3	36.5	–	○	福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3681	大笹生ボックス	E13	2014	7	18.3	34.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅱ								○						
3682	飯坂中野ボックス	E13	2016	5	6.0	14.5	–	○	福島	東北中央道	福島県	福島市	H30	Ⅰ								○						
3683	万世第１ボックス	E13	2008	13	5.2	36.8	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3684	万世第２ボックス	E13	2008	13	9.7	26.1	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3685	桑山第１ボックス	E13	2008	13	7.0	36.5	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3686	金谷ボックス	E13	不明	–	7.2	17.6	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3687	川井第１ボックス	E13	2011	10	9.8	31.0	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3688	川井第２ボックス	E13	2013	8	8.5	32.3	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3689	川井第３ボックス	E13	2013	8	6.8	47.3	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						
3690	川井第４ボックス	E13	2012	9	7.2	32.8	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3691	川井第５ボックス	E13	2010	11	7.4	27.8	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ							○						
3692	中田第１ボックス	E13	2008	13	18.6	18.2	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ							○						
3693	中田第２ボックス	E13	2009	12	16.1	36.0	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅱ							○						
3694	桑山第２ボックス	E13	不明	–	4.7	20.8	–	○	福島	東北中央道	山形県	米沢市	H30	Ⅰ							○						
3695	玉野第２ボックス	E13	2014	7	10.8	20.4	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3696	玉野第１ボックス	E13	2013	8	5.5	33.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3697	玉野第３ボックス	E13	2014	7	4.2	34.5	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅰ							○						
3698	御代田第１ボックス	E13	2012	9	5.9	19.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅱ							○						
3699	御代田第２ボックス	E13	2015	6	3.3	19.4	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅱ							○						
3700	御代田第３ボックス	E13	2014	7	6.5	17.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅱ							○						
3701	下小国第１ボックス	E13	2015	6	3.0	17.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ							○						
3702	下小国第２ボックス	E13	2015	6	3.4	39.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市	H30	Ⅰ							○						
3703	堤下ボックス	E13	2014	7	3.2	20.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅰ							○						
3704	玉野第４ボックス	E13	2013	8	3.5	34.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3705	山上第一カルバート	E13	2016	5	2.0	38.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3706	山上第二カルバート	E13	2016	5	2.5	21.3	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3707	山上第三カルバート	E13	2016	5	3.0	17.9	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3708	胴切大橋	E13	2012	9	120.0	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅱ						○							
3709	物倉第一カルバート	E13	2016	5	4.5	19.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3710	物倉第二カルバート	E13	2016	5	4.5	15.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3711	物倉第三カルバート	E13	2016	5	4.5	19.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3712	物倉大橋	E13	2013	8	134.0	10.5	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅱ						○							
3713	東楢這橋	E13	2013	8	61.0	10.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅰ						○							
3714	中楢這橋	E13	2016	5	68.0	10.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅰ						○							
3715	西楢這橋	E13	2015	6	98.0	10.5	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅰ						○							
3716	新荻平橋	E13	2010	11	14.0	11.4	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅰ						○							
3717	荻平カルバート	E13	2016	5	4.3	23.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3718	松ヶ房橋	E13	2010	11	24.4	10.5	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅱ						○							
3719	松ヶ房第一カルバート	E13	2016	5	3.2	36.6	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3720	松ヶ房第二カルバート	E13	2016	5	4.0	12.2	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3721	玉野川橋	E13	2012	9	22.5	11.4	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市	H29	Ⅰ						○							
3722	玉野第二カルバート	E13	2016	5	5.5	36.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市	H30	Ⅱ							○						
3723	新大滝橋	E13	2015	6	113.0	10.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市				R1	Ⅰ	○										
3724	栗子ご道橋	E13	2013	8	28.6	10.0	PC		福島	東北中央道	福島県	福島市				R1	Ⅰ	○										
3725	新西川橋	E13	2008	13	77.0	10.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	福島市				R1	Ⅱ	○										
3726	栗子川橋	E13	2006	15	42.0	11.3	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3727	新刈安川橋	E13	2006	15	57.0	14.4	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3728	刈安高架橋	E13	2006	15	166.0	10.3	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅱ	○										
3729	万世梓山橋	E13	2008	13	30.1	11.8	PC		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3730	万世高架橋	E13	2015	6	336.3	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅱ	○										
3731	金谷橋	E13	2012	9	43.8	13.5	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3732	元立橋	E13	2012	9	37.4	13.5	PC		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅱ	○										
3733	新米沢大橋	E13	2016	5	447.5	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅱ	○										
3734	前川原橋	E13	2012	9	24.8	13.5	PC		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅱ	○										
3735	中田高架橋	E13	2014	7	69.5	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3736	中田町橋	E13	2012	9	40.0	13.5	PC		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3737	藤泉橋	E13	2016	5	20.4	13.5	PC		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3738	窪田小瀬橋	E13	2009	12	45.6	15.5	鋼橋		福島	東北中央道	山形県	米沢市				R1	Ⅰ	○										
3739	石田ボックス	E13	2014	7	13.7	11.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市				R1	Ⅰ	○										
3740	荒屋敷大橋	E13	2019	2	179.0	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅰ		○									
3741	荒屋敷大橋ランプ橋（上）	E13	2019	2	134.0	5.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅰ		○									
3742	荒屋敷大橋ランプ橋（下）	E13	2019	2	131.0	5.3	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅰ		○									
3743	今田高架橋	E13	2018	3	785.0	11.8	混合橋		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅱ		○									
3744	前原橋	E13	2019	2	15.0	13.5	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅰ		○									
3745	横川高架橋	E13	2019	2	424.0	12.0	PC		福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅱ		○									
3746	普蔵川橋（下）	国道4号	2012	9	26.6	13.5	PC		福島	福島	福島県	桑折町				R2	Ⅱ		○									
3747	普蔵川橋（上）	国道4号	2018	3	28.0	13.5	PC		福島	福島	福島県	桑折町				R2	Ⅱ		○									
3748	徳江堀函渠	国道4号	2018	3	4.1	35.1	–	○	福島	福島	福島県	桑折町				R2	Ⅰ		○									
3749	龍護院川橋	国道4号	2019	2	7.1	15.7	RC		福島	福島	福島県	国見町				R2	Ⅰ		○									
3750	今田引沼ボックス	E13	2015	6	5.8	16.6	–	○	福島	東北中央道	福島県	相馬市				R2	Ⅰ		○									
3751	小国大橋	E13	2020	1	130.0	12.0	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3752	掛田大橋	E13	2020	1	175.0	12.0	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3753	富沢大橋	E13	2020	1	236.0	12.0	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3754	大柳大橋	E13	2020	1	352.4	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3755	上保原ご線橋	E13	2020	1	84.5	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3756	上保原ご道橋	E13	2020	1	21.0	13.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3757	中曽根ご道橋	E13	2020	1	33.0	13.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3758	宮本ご道橋	E13	2020	1	32.0	13.5	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3759	伊達大橋	E13	2020	1	398.0	12.0	PC		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3760	国道4号ご道橋	E13	2020	1	41.5	13.5	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3761	桑折高架橋	E13	2019	2	1218.0	12.0	鋼橋		福島	東北中央道	福島県	桑折町									○							
3762	柱田東沢ボックス	E13	2019	2	5.5	19.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3763	富沢ボックス	E13	2017	4	4.6	19.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3764	内山入ボックス	E13	2019	2	6.8	28.6	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3765	田向ボックス	E13	2017	4	15.5	18.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3766	法千在家ボックス	E13	2018	3	11.2	42.8	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3767	中室内ボックス	E13	2018	3	7.6	25.8	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3768	伏黒土空ボックス	E13	2017	4	5.0	34.5	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3769	伏黒宮本第１ボックス	E13	2018	3	9.1	31.1	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3770	伏黒宮本第２ボックス	E13	2020	1	9.0	24.6	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3771	伏黒舘ノ内ボックス	E13	2019	2	10.8	25.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3772	日照ボックス	E13	2019	2	15.5	22.6	–	○	福島	東北中央道	福島県	伊達市									○							
3773	川原田ボックス	E13	2019	2	7.1	19.0	–	○	福島	東北中央道	福島県	桑折町									○							
3774	七斗蒔溝橋	国道4号	1959	62	7.1	8.6	PC		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3775	五斗蒔溝橋	国道4号	1959	62	5.0	8.6	PC		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3776	礼堂橋	国道4号	1958	63	12.9	9.3	PC		郡山	郡山	福島県	泉崎村	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3777	町尻溝橋	国道4号	1957	64	6.0	8.6	PC		郡山	郡山	福島県	泉崎村	H27	Ⅱ														撤去
3778	北ノ内溝橋	国道4号	1957	64	8.5	8.6	PC		郡山	郡山	福島県	泉崎村	H27	Ⅱ														撤去
3779	矢吹橋（下）	国道4号	1973	48	23.7	9.1	鋼橋		郡山	郡山	福島県	矢吹町	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3780	矢吹橋（上）	国道4号	1973	48	23.7	15.6	鋼橋		郡山	郡山	福島県	矢吹町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3781	釈迦堂川橋（下）	国道4号	1982	39	94.5	10.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H28	Ⅱ	伸縮装置補修					○								
3782	滑川橋（下）	国道4号	1976	45	67.6	10.3	PC		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H30	Ⅱ								○	□					伸縮装置取替
3783	山の井橋（上）	国道4号	1994	27	36.7	15.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3784	山の井橋（下）	国道4号	1994	27	36.7	13.1	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3785	日本橋（上）	国道4号	1998	23	158.0	12.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅲ	床版補修							○	□					床版補修
3786	日本橋（下）	国道4号	2001	20	161.6	13.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅰ								○						
3787	笹原川橋（下）	国道4号	1978	43	85.0	13.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅱ								○						
3788	笹原川橋（上）	国道4号	2002	19	85.0	12.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅰ								○						
3789	荒井大橋（下）	国道4号	1987	34	126.0	9.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅱ								○						
3790	荒井大橋（上）	国道4号	2000	21	126.0	8.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅱ								○						
3791	十貫内高架橋	国道4号	2002	19	216.0	11.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H30	Ⅱ								○						
3792	亀田大橋（下）	国道4号	1987	34	280.0	8.8	混合橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3793	亀田大橋（上）	国道4号	1997	24	280.0	8.8	混合橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3794	若戸橋（下）	国道4号	1988	33	47.0	12.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								□	防護柵補修
3795	若戸橋（上）	国道4号	2000	21	47.3	12.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								□	断面修復
3796	須賀川南大橋（上）	国道4号	1992	29	73.6	8.8	PC		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H29	Ⅱ	剥落防止						○							
3797	須賀川南大橋（下）	国道4号	1992	29	73.6	8.8	PC		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H29	Ⅱ	剥落防止						○							
3798	熱海跨道橋	国道49号	1991	30	23.8	18.2	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	伸縮装置補修						○							
3799	新屋敷橋	国道49号	1967	54	17.2	8.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3800	銅冶橋	国道49号	1967	54	15.0	8.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3801	境橋	国道49号	1967	54	20.5	8.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										□	塗替塗装
3802	牛骨橋	国道49号	1968	53	20.5	8.6	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								□	床版補修
3803	池尻橋	国道49号	1968	53	16.0	8.6	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3804	糠塚大橋	国道49号	1967	54	16.5	8.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								
3805	反田橋	国道49号	1967	54	17.5	8.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3806	大花橋	国道49号	1967	54	14.7	8.8	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3807	樋ノ口橋	国道49号	1967	54	15.5	8.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								
3808	川内橋	国道49号	1967	54	17.4	8.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								
3809	眼鏡橋	国道49号	1966	55	33.2	8.1	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ	床版補修					○			□					床版補修
3810	金山橋	国道49号	1958	63	191.7	7.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	塗替塗装						○			□	□	□		当て板補強
3811	安積大橋	国道49号	1966	55	89.3	15.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	支承取替						○			□				支承補修
3812	前河原橋（下）	国道49号	1975	46	60.6	10.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3813	前河原橋（上）	国道49号	1962	59	58.5	8.0	RC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ							○			□				断面修復
3814	東権現橋（下）	国道49号	1972	49	32.0	15.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ						○					□	□		支承補修
3815	西権現橋（下）	国道49号	1972	49	48.5	10.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ						○					□	□		支承補修
3816	喜久田橋（下）	国道49号	1977	44	34.2	10.2	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅲ		○					□				塗替塗装
3817	喜久田橋（上）	国道49号	1961	60	33.0	7.9	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅱ		○									
3818	二渡橋	国道49号	1965	56	22.2	10.2	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅱ		○									
3819	中山橋	国道49号	1966	55	57.0	8.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	ひびわれ補修						○							
3820	南川橋（下）	国道4号	1983	38	20.0	11.7	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3821	南川橋（上）	国道4号	1997	24	20.0	12.9	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3822	弘法壇橋	国道4号	1985	36	13.6	21.4	PC		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H30	Ⅱ								○						
3823	磐梯熱海大橋	国道49号	1997	24	322.0	14.3	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3824	阿曽沢橋	国道49号	1996	25	37.9	17.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3825	うねめ高架橋（上）	国道4号	1997	24	268.0	9.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ						○					□	□		支承取替

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3826	うねめ高架橋（下）	国道4号	2001	20	268.0	9.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○							□	断面修復
3827	亀田一号橋	国道4号	1987	34	21.5	9.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3828	亀田二号橋	国道4号	1988	33	30.0	9.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3829	日吉橋（上）	国道4号	1996	25	34.4	9.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	床版補修						○							
3830	日吉橋（下）	国道4号	1988	33	34.4	9.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	床版補修						○							
3831	富田跨線橋（下）	国道4号	1988	33	16.7	12.4	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3832	富田跨線橋（上）	国道4号	1997	24	16.7	12.4	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3833	原跨道橋（上）	国道4号	1994	27	34.0	9.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	支承補修						○					□		部材交換
3834	原跨道橋（下）	国道4号	1994	27	34.0	9.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ							○					□		部材交換
3835	大隅橋	国道49号	1961	60	11.7	7.7	RC		郡山	郡山	福島県	平田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3836	横森橋	国道49号	1961	60	10.8	7.7	RC		郡山	郡山	福島県	平田村	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3837	妙見橋	国道49号	1967	54	11.4	9.2	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ						○								
3838	中之橋	国道49号	1967	54	13.6	8.7	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3839	小原田跨線橋	国道49号	1966	55	12.5	14.3	RC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3840	亀田川橋（上）	国道49号	1978	43	17.7	13.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ							○					□		床版防水
3841	亀田川橋（下）	国道49号	1978	43	17.7	14.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	伸縮装置補修						○					□		床版防水
3842	堀ノ内橋（上）	国道49号	1962	59	8.7	8.1	RC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○				□					伸縮装置取替
3843	堀ノ内橋（下）	国道49号	1977	44	8.7	10.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3844	五百川橋	国道49号	1966	55	10.4	8.8	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	断面修復						○							
3845	固後利橋	国道49号	1966	55	6.3	9.1	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3846	玉川跨道橋	国道49号	1994	27	27.1	21.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ	支承取替						○		□					支承取替
3847	坂本橋	国道49号	1997	24	130.0	13.9	PC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H26	Ⅲ	伸縮装置取替	R1	Ⅱ	○									□	断面修復
3848	上戸跨線橋	国道49号	1967	54	27.0	9.5	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ							○							
3849	菱沼橋	国道49号	1959	62	21.2	7.6	RC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H27	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅱ		○									
3850	竹の橋	国道49号	1961	60	21.0	7.8	RC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										断面修復
3851	金の橋	国道49号	1959	62	40.2	7.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H30	Ⅰ	床版補修							○						
3852	銀の橋	国道49号	1959	62	40.2	7.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H30	Ⅰ	床版補修							○						
3853	八田橋	国道49号	1966	55	32.0	7.8	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○					□	□				ひびわれ補修
3854	大工川橋	国道49号	1966	55	23.6	9.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○								□		当て板補強
3855	駒板橋	国道49号	1966	55	33.8	7.8	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅲ	支承取替	R2	Ⅲ		○									□	床版補修
3856	不動川橋（下）	国道49号	1992	29	20.4	10.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ	伸縮装置補修						○							
3857	扇町跨線橋（下）	国道49号	1994	27	32.3	10.8	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3858	湯川橋（上）	国道49号	1996	25	38.1	10.9	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ							○							
3859	湯川橋（下）	国道49号	1996	25	38.1	10.9	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ							○							
3860	宮古橋	国道49号	1990	31	326.7	14.5	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	湯川村	H29	Ⅰ							○							
3861	鶴沼橋	国道49号	1974	47	53.0	12.9	PC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										□	断面修復
3862	下藤片桟橋	国道49号	1969	52	79.3	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	柳津町	H27	Ⅲ	床版補修	R2	Ⅱ		○									
3863	柳津橋	国道49号	1969	52	100.1	8.3	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	柳津町	H30	Ⅰ								○						
3864	上藤片桟橋	国道49号	1969	52	19.5	3.9	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	柳津町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										□	塗替塗装
3865	新藤橋	国道49号	1969	52	105.0	8.3	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	柳津町	H30	Ⅱ	床版補修							○						
3866	別荘屋橋	国道49号	1970	51	55.0	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅲ								○	□					当て板補強
3867	唐目貫橋	国道49号	1970	51	28.6	10.4	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ								○						
3868	不動片桟橋	国道49号	1970	51	91.0	3.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3869	綱沢橋	国道49号	1970	51	14.9	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅱ		○									
3870	新長谷川橋	国道49号	1970	51	54.1	8.3	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3871	安座川橋	国道49号	1970	51	97.6	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ							○							
3872	芹沼橋	国道49号	1970	51	85.0	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅲ		○								□	当て板補強
3873	白川橋	国道49号	1970	51	60.6	9.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅱ						○							□	塗替塗装
3874	新鬼光頭川橋	国道49号	1969	52	53.0	8.3	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅱ						○							□	断面修復
3875	新宝川橋	国道49号	1968	53	82.9	8.3	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ							○							
3876	鳥井大橋	国道49号	1968	53	115.0	8.7	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ							○							
3877	上條橋	国道49号	1978	43	60.0	15.8	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅱ						○							□	塗替塗装
3878	藤大橋	国道49号	1985	36	219.0	12.0	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H30	Ⅲ							○			□	□			塗替塗装
3879	第２沼川橋（上）	国道49号	1996	25	17.0	10.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ	伸縮装置補修						○							
3880	第２沼川橋（下）	国道49号	1996	25	17.0	10.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ	伸縮装置補修						○							
3881	志田浜橋	国道49号	1967	54	7.3	11.3	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3882	南浜溝橋	国道49号	1965	56	6.3	11.6	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ							○							
3883	松の橋	国道49号	1962	59	9.5	8.6	RC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3884	浜田溝橋	国道49号	1964	57	5.3	9.7	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ							○							
3885	高橋川橋	国道49号	1965	56	12.8	9.6	RC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅲ	防護柵補修						○							
3886	八百山溝橋	国道49号	1966	55	12.5	15.2	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅱ							○							
3887	日橋北橋	国道49号	1966	55	5.4	9.4	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅱ							○							
3888	吹屋川橋	国道49号	1988	33	10.4	9.5	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅲ							○		□					防護柵補修
3889	観音前溝橋	国道49号	1972	49	6.4	21.1	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ						○								
3890	榎下橋	国道49号	1963	58	3.5	6.5	RC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ						○								
3891	堂前橋	国道49号	1963	58	3.0	9.3	RC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3892	長泥橋	国道49号	1965	56	5.0	11.2	PC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅲ	洗掘対策					○								
3893	川前橋	国道49号	1997	24	3.1	11.0	RC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅰ						○								
3894	蛭川橋	国道49号	1987	34	15.0	17.0	PC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H29	Ⅰ							○							
3895	下川原跨道橋	国道49号	1978	43	12.6	11.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅱ						○								
3896	新田跨線橋	国道49号	1969	52	11.7	8.2	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3897	岩ヶ沢橋	国道49号	1970	51	5.9	8.4	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3898	名子打田橋	国道49号	1970	51	7.3	8.3	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3899	新村ご線橋	国道49号	1969	52	13.5	9.4	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3900	宝坂跨道橋	国道49号	1970	51	8.5	8.6	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅱ						○								
3901	七斗蒔溝橋側道橋	国道4号	1996	25	7.8	3.4	PC		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3902	五斗蒔溝橋側歩道橋（上）	国道4号	1986	35	7.1	2.1	鋼橋		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3903	五斗蒔溝橋側歩道橋（下）	国道4号	1986	35	8.1	1.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□	□			当て板補強
3904	銅治橋側道橋	国道49号	1981	40	20.0	1.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3905	境橋側道橋	国道49号	1981	40	25.0	1.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3906	牛骨橋側道橋	国道49号	1983	38	24.7	1.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3907	池尻橋側道橋	国道49号	1985	36	16.5	1.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3908	糠塚大橋側道橋	国道49号	1985	36	16.6	1.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3909	眼鏡橋側道橋（上）	国道49号	1973	48	33.2	1.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3910	眼鏡橋側道橋（下）	国道49号	1981	40	33.2	1.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3911	金山橋側道橋（上）	国道49号	1970	51	191.8	2.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	支承補修						○			□				床版防水
3912	金山橋側道橋（下）	国道49号	1975	46	191.8	2.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅲ	支承補修						○			□				床版防水
3913	前川原橋側道橋	国道49号	1974	47	58.4	2.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3914	喜久田橋側道橋	国道49号	1979	42	33.0	1.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3915	守山跨道橋側道橋上	国道49号	1980	41	19.0	2.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3916	守山跨道橋側道橋下	国道49号	1980	41	19.0	2.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3917	大隅橋側道橋	国道49号	1963	58	12.3	1.2	鋼橋		郡山	郡山	福島県	平田村	H26	Ⅱ	架替	R1	Ⅰ	○										
3918	横森橋側道橋	国道49号	1963	58	13.0	1.2	鋼橋		郡山	郡山	福島県	平田村	H26	Ⅲ		R1	Ⅲ	○					□	□				当て板補強
3919	中之橋側道橋	国道49号	1983	38	16.4	1.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3920	堀ノ内橋側道橋	国道49号	1970	51	8.7	1.8	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○									□	塗替塗装
3921	上戸跨線橋側道橋	国道49号	1984	37	39.0	2.0	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ							○							
3922	菱沼橋側道橋	国道49号	1983	38	21.2	1.8	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3923	竹の橋側道橋	国道49号	1978	43	21.0	1.9	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H27	Ⅲ	塗替塗装	R2	Ⅰ		○									
3924	梅の橋側道橋	国道49号	1980	41	21.0	2.0	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3925	八田橋側道橋	国道49号	1985	36	47.2	1.8	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									塗替塗装
3926	大工川橋側道橋	国道49号	1987	34	25.2	1.4	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									塗替塗装
3927	駒板橋側道橋	国道49号	1988	33	82.0	1.8	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○				□					塗替塗装
3928	志田浜橋側道橋（上）	国道49号	1983	38	7.3	1.6	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3929	志田浜橋側道橋（下）	国道49号	1983	38	7.3	1.6	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3930	南浜溝橋側道橋	国道49号	1983	38	6.3	1.6	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3931	前浜溝側道橋	国道49号	1984	37	6.0	2.0	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ							○							
3932	浜田溝橋側道橋	国道49号	1972	49	6.0	1.5	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ							○							
3933	高橋川橋側道橋	国道49号	1965	56	16.0	1.5	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅲ							○							架替
3934	八百山溝橋側道橋	国道49号	1986	35	12.5	1.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ							○							
3935	日橋北橋側道橋	国道49号	1986	35	11.0	2.0	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅰ							○							
3936	吹屋川側道橋	国道49号	1986	35	16.0	2.2	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅱ							○							
3937	新田側道橋	国道49号	1997	24	12.4	2.3	PC		郡山	会津若松	福島県	西会津町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3938	釈迦堂川橋（上）	国道4号	1982	39	94.5	11.0	鋼橋		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H28	Ⅱ						○								□	断面修復
3939	滑川橋（上）	国道4号	1975	46	67.6	10.3	PC		郡山	郡山	福島県	須賀川市	H30	Ⅰ								○						
3940	東権現橋（上）	国道49号	1972	49	32.0	10.4	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ						○					□	□		支承補修
3941	西権現橋（上）	国道49号	1972	49	48.5	14.3	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅲ						○					□	□		支承補修
3942	中山第一片桟橋	国道49号	1984	37	36.0	2.2	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3943	中山第二片桟橋	国道49号	1984	37	57.0	3.4	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅰ							○							
3944	中山第三片桟橋	国道49号	1984	37	54.0	2.0	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3945	中山第四片桟橋	国道49号	1984	37	21.0	4.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H29	Ⅱ							○							
3946	龍ヶ馬場溝橋	国道49号	1967	54	6.3	10.5	PC		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ						○								
3947	不動川橋（上）	国道49号	1992	29	20.4	13.3	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H29	Ⅱ	伸縮装置補修						○							
3948	扇町ご線橋（上）	国道49号	1994	27	32.3	12.7	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3949	滑田橋	国道49号	1956	65	2.1	9.1	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H30	Ⅱ								○						
3950	上神橋	国道49号	1963	58	6.0	9.2	PC		郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3951	熊ノ目橋	国道49号	1951	70	4.7	13.2	RC		郡山	会津若松	福島県	湯川村	H28	Ⅱ						○								
3952	針生高架橋（上）	国道4号	2006	15	886.0	7.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H30	Ⅱ	伸縮装置補修							○	□	□				伸縮装置取替
3953	針生高架橋（下）	国道4号	2009	12	886.0	8.7	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ	断面修復						○		□	□				伸縮装置取替
3954	白河橋（下）	国道4号	2010	11	148.0	10.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	白河市	H29	Ⅰ							○							
3955	中山前ボックス	国道4号	1999	22	4.0	8.6	–	○	郡山	郡山	福島県	西郷村	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3956	立出ボックス	国道4号	1999	22	3.0	18.5	–	○	郡山	郡山	福島県	西郷村	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3957	夏針ボックス	国道4号	1995	26	5.0	14.2	–	○	郡山	郡山	福島県	泉崎村	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3958	白清水ボックス	国道4号	2002	19	4.5	18.5	–	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3959	下西田ボックス	国道4号	2002	19	5.0	20.0	–	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3960	音路ボックス	国道4号	1991	30	5.0	19.2	–	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
3961	杉下ボックス	国道4号	1998	23	5.5	19.1	－	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3962	谷地ボックス	国道49号	1967	54	4.8	9.0	－	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3963	上川原ボックス	国道49号	1967	54	4.0	7.3	－	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
3964	菖蒲池ボックス	国道49号	1999	22	3.3	17.5	－	○	郡山	郡山	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3965	久保田ボックス	国道49号	1999	22	6.0	11.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3966	熱海六丁目ボックス	国道49号	1970	51	5.5	15.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	郡山市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3967	熱海五丁目ボックス	国道49号	1970	51	6.5	11.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	郡山市	H28	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
3968	安子ヶ島ボックス	国道49号	1970	51	3.3	14.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	郡山市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
3969	山潟ボックス	国道49号	2004	17	5.5	8.7	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅱ		R2	Ⅲ		○						□	□		断面修復
3970	堅田ボックス	国道49号	1995	26	4.0	22.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3971	相名目ボックス	国道49号	1995	26	5.0	22.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3972	村前ボックス	国道49号	1995	26	3.0	8.6	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3973	浜田ボックス	国道49号	1995	26	3.0	8.4	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3974	大堰ボックス	国道49号	1995	26	3.0	8.2	－	○	郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3975	八百山ボックス	国道49号	1994	27	3.0	14.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3976	鈴木ボックス	国道49号	1994	27	6.5	17.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3977	村北ボックス	国道49号	1994	27	5.1	17.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
3978	宮下ボックス	国道49号	1994	27	4.0	18.7	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3979	達摩ボックス	国道49号	1996	25	3.5	19.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3980	中川原ボックス	国道49号	1999	22	3.5	7.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3981	高久１号ボックス	国道49号	1999	22	4.3	7.6	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3982	高久３号ボックス	国道49号	1999	22	4.0	9.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3983	北條ボックス	国道49号	1999	22	4.5	7.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3984	上川原ボックス	国道49号	1999	22	6.5	9.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3985	柳田ボックス	国道49号	1996	25	3.5	11.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H30	Ⅱ								○						
3986	下河原ボックス	国道49号	1996	25	3.5	8.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3987	径塚ボックス	国道49号	1996	25	3.5	8.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
3988	上ノ山ボックス	国道49号	1996	25	3.5	8.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H30	Ⅱ								○						
3989	堤ノ上ボックス	国道49号	2003	18	3.0	8.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H30	Ⅱ								○						
3990	向ノ原ボックス	国道49号	2003	18	4.0	8.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H30	Ⅱ								○						
3991	宮前ボックス	国道49号	1994	27	5.0	15.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津坂下町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3992	藤沢ボックス	国道49号	1994	27	5.0	11.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	柳津町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3993	本町１号ボックス	国道49号	1994	27	5.0	10.5	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
3994	本町２号ボックス	国道49号	1994	27	6.0	10.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3995	本町３号ボックス	国道49号	1994	27	6.0	14.8	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H28	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
3996	原町ボックス	国道49号	1994	27	4.0	19.3	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H29	Ⅰ								○						
3997	小屋田１号ボックス	国道49号	1994	27	4.0	20.6	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H29	Ⅰ								○						
3998	小屋田２号ボックス	国道49号	1994	27	4.6	33.2	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H29	Ⅰ								○						
3999	御見ボックス	国道49号	1994	27	3.2	9.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ								○						
4000	須刈平ボックス	国道49号	1994	27	3.0	9.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H30	Ⅱ								○						
4001	白河橋（上）	国道4号	2013	8	148.0	11.5	鋼橋		郡山	郡山	福島県	白河市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4002	月輪大橋	国道49号	2005	16	193.5	13.0	鋼橋		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅱ	断面修復							○						
4003	梅の橋（新橋）	国道49号	2016	5	34.7	14.5	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町	H29	Ⅰ								○						
4004	久保田１号ボックス	国道49号	不明	－	2.5	17.0	－	○	郡山	会津若松	福島県	郡山市	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4005	金田ボックス	国道49号	不明	－	3.5	9.6	－	○	郡山	会津若松	福島県	会津若松市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4006	縄沢ボックス	国道49号	不明	–	4.0	9.4	–	○	郡山	会津若松	福島県	西会津町	H29	Ⅰ							○							
4007	松の橋側道橋	国道49号	2019	2	11.5	3.3	PC		郡山	会津若松	福島県	猪苗代町				R2	Ⅰ		○									
4008	銅治橋側道橋	国道49号	1981	40	20.0	2.4	鋼橋		郡山	郡山	福島県	郡山市				R2	Ⅰ		○									
4009	勿来橋	国道6号	1951	70	4.2	16.0	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4010	堀切橋	国道6号	1951	70	2.1	11.4	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅲ								○				□		床版取替
4011	川原跨道橋	国道6号	1971	50	8.5	26.9	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4012	第二宝珠院川橋（上）	国道6号	1976	45	20.9	14.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□	□				支承取替
4013	第一宝珠院川橋（下）	国道6号	1976	45	21.4	11.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
4014	下川跨道橋（上）	国道6号	1973	48	11.5	12.6	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4015	谷地川溝第１上ランプ	国道6号	1971	50	10.1	8.3	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4016	谷地川溝第２下ランプ	国道6号	1971	50	10.1	8.3	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4017	大原避溢橋（上）	国道6号	1974	47	10.8	12.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ								○						
4018	住吉避溢橋（下）	国道6号	2000	21	10.5	16.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4019	住吉避溢橋（上）	国道6号	2000	21	10.5	16.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4020	蛭田川第一橋（下）	国道6号	1972	49	62.0	6.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4021	蛭田川第二橋（上）	国道6号	1972	49	60.2	6.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○		□	□				支承取替
4022	鮫川大橋	国道6号	1973	48	471.0	10.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4023	佐糠橋（下）	国道6号	1971	50	55.9	8.2	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□	□				当て板補強
4024	上荒川跨道橋（上）	国道6号	1984	37	20.0	8.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4025	赤沼橋	国道6号	1976	45	28.6	17.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4026	原高野橋	国道6号	1976	45	29.3	17.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○			□	□				支承取替
4027	松葉橋	国道6号	1976	45	46.0	17.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅲ		○				□					防護柵補修
4028	石淵溝橋	国道6号	1995	26	6.1	20.2	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4029	植田跨道橋	国道6号	1971	50	18.8	9.4	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4030	下神谷橋	国道6号	1974	47	23.3	20.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○			□	□				断面修復
4031	末続橋	国道6号	1962	59	20.8	8.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4032	佐糠跨道橋（下）	国道6号	1977	44	22.7	9.2	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4033	東田跨道橋（上）	国道6号	1976	45	42.6	11.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○			□	□				当て板補強
4034	南富岡橋（上）	国道6号	1974	47	97.5	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ								○						
4035	中ノ作橋（上）	国道6号	1973	48	16.4	11.3	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4036	宮ノ下高架橋（上）	国道6号	1988	33	310.0	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4037	新泉橋（上）	国道6号	1973	48	64.0	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4038	泉跨道橋（上）	国道6号	1978	43	20.4	9.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ	断面修復					○								
4039	泉跨道橋（下）	国道6号	2001	20	20.3	9.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4040	泉跨線橋（上）	国道6号	1979	42	57.0	12.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4041	泉跨線橋（ランプ）	国道6号	1979	42	63.5	8.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4042	泉跨線橋（下）	国道6号	2001	20	57.0	9.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4043	金成川橋（下）	国道6号	1981	40	34.5	11.7	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4044	金成川橋（上）	国道6号	2000	21	34.3	11.7	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4045	内郷高架橋（上）	国道49号	1988	33	568.8	10.5	混合橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ		R2	Ⅲ		○					□		□		部材交換
4046	御台境橋（上）	国道49号	1987	34	115.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○					□		部材交換
4047	新町田橋	国道49号	1988	33	48.0	26.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4048	熊谷橋	国道49号	1988	33	21.7	26.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4049	不動橋（上）	国道6号	1989	32	47.0	8.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○			□				伸縮装置取替
4050	不動橋ＯＮランプ（上）	国道6号	1989	32	47.0	8.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○			□				伸縮装置取替

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性H26-30		年度	健全性R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4051	不動橋ＯＦＦランプ（下）	国道6号	1989	32	47.1	8.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○			□				伸縮装置取替
4052	中山こ道橋（上）	国道6号	1990	31	23.4	8.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4053	菅波大橋（上）	国道6号	1999	22	110.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4054	夏井甲塚こ道橋（上）	国道6号	1999	22	23.7	9.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4055	天神ひばり橋Ｂランプ	国道6号	1999	22	27.2	6.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4056	神谷さざ波橋Ａランプ	国道6号	1999	22	31.7	8.9	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4057	住吉高架橋（上）	国道6号	2001	20	155.0	8.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4058	好間橋	国道49号	1961	60	75.0	9.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○			□	□				支承取替
4059	遅川橋	国道49号	1992	29	13.5	8.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4060	根古屋橋	国道49号	1966	55	55.3	8.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4061	堀の内橋	国道49号	1966	55	17.1	9.7	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4062	三和大橋	国道49号	1968	53	182.8	7.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅲ								○				□	□	床版補修
4063	地蔵橋	国道49号	1968	53	99.1	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4064	上三坂橋	国道49号	1967	54	52.0	8.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○			□	□				床版防水
4065	三沢大橋（上）	国道6号	1981	40	241.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4066	松久須根大橋（上）	国道6号	1982	39	298.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4067	戸ノ作橋（上）	国道6号	1983	38	100.0	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4068	獺沢橋（上）	国道6号	1985	36	130.1	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4069	新栄一橋	国道49号	1984	37	107.0	8.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4070	六枚内高架橋（上）	国道6号	1991	30	325.0	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○				□	□		断面修復
4071	連郷大橋	国道6号	1998	23	276.5	12.2	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4072	新大久川橋	国道6号	1998	23	102.0	12.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4073	権現堂溝橋	国道49号	1990	31	5.3	10.5	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4074	井田木溝橋	国道49号	1990	31	6.3	11.9	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4075	小川崎溝橋	国道49号	1977	44	9.5	9.6	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4076	宿中橋	国道49号	1988	33	11.1	8.3	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4077	矢来橋	国道49号	1986	35	6.6	8.2	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ								○						
4078	大平溝橋	国道49号	1981	40	10.5	9.3	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4079	みまや徳姫こ道橋（上）	国道49号	2000	21	34.4	8.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4080	草木橋（上）	国道49号	1995	26	155.0	10.4	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4081	林作こ道橋（上）	国道49号	1994	27	31.6	12.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4082	上荒川橋（上）	国道49号	1994	27	130.5	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4083	五郎内橋（上）	国道49号	1992	29	139.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○		□	□				当て板補強
4084	夏井川橋	国道6号	1995	26	328.4	21.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4085	神谷こ道橋	国道6号	1994	27	73.1	10.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4086	仲田溝橋	国道6号	1985	36	6.8	18.1	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ								○						
4087	新折木橋	国道6号	1962	59	20.7	8.5	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H26	Ⅲ	当て板補強	R1	Ⅱ	○						□				当て板補強
4088	浅見川橋	国道6号	1958	63	62.6	7.0	RC		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅱ							○							
4089	広野橋	国道6号	1960	61	20.8	8.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅱ							○							
4090	北迫橋	国道6号	1961	60	22.9	8.8	PC		磐城	原町	福島県	広野町	H28	Ⅱ						○								
4091	木戸川橋	国道6号	1963	58	110.8	8.2	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4092	井出川橋	国道6号	1963	58	64.5	8.1	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4093	新楓橋	国道6号	1963	58	29.2	9.5	鋼橋		磐城	原町	福島県	富岡町	H29	Ⅱ							○							
4094	富岡橋	国道6号	1960	61	90.0	7.6	鋼橋		磐城	原町	福島県	富岡町	H27	Ⅲ	断面修復	R2	Ⅲ		○									
4095	熊川橋	国道6号	1959	62	72.8	8.2	RC		磐城	原町	福島県	大熊町	H26	Ⅰ		R1	Ⅲ	○										支承補修

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4096	前田川橋	国道6号	1963	58	51.3	9.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅲ		R1	Ⅱ	○					□					当て板補強
4097	戎川橋	国道6号	1963	58	19.5	9.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
4098	中田川橋	国道6号	1964	57	24.5	9.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4099	高瀬川橋	国道6号	1964	57	131.3	8.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4100	幾世橋	国道6号	1964	57	15.6	10.3	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H30	Ⅱ								○						
4101	請戸川橋	国道6号	1965	56	122.3	8.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅱ	○										
4102	宮田川橋	国道6号	1966	55	20.7	9.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅱ								○						
4103	小高川橋	国道6号	1965	56	101.4	8.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅲ	支承取替	R1	Ⅰ	○										
4104	太田川橋	国道6号	1966	55	67.0	9.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅲ	当て板補強	R2	Ⅲ		○									
4105	牛川橋	国道6号	1965	56	22.1	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅱ								○						
4106	北原橋	国道6号	1965	56	21.2	9.8	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H29	Ⅰ							○							
4107	新桜井橋	国道6号	1965	56	126.7	8.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4108	川子第一跨道橋（川子こ道橋）	国道6号	1963	58	15.6	9.5	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4109	川子避溢橋	国道6号	1963	58	16.8	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4110	真野川橋	国道6号	1963	58	210.0	8.7	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4111	萩崎橋	国道6号	1962	59	16.8	9.4	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H29	Ⅱ							○							
4112	夕筋跨道橋	国道6号	1962	59	10.4	8.8	PC		磐城	原町	福島県	広野町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4113	大木下橋	国道6号	1962	59	12.6	9.7	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4114	一ツ屋橋	国道6号	1962	59	7.4	9.4	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4115	清水橋	国道6号	1962	59	12.6	9.3	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4116	大森橋	国道6号	2000	21	14.7	12.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H30	Ⅱ								○						
4117	鷲塚橋	国道6号	2000	21	20.7	12.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H29	Ⅰ							○							
4118	北田橋	国道6号	1963	58	7.2	9.3	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4119	井出跨道橋	国道6号	1962	59	10.3	9.7	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4120	上繁岡第一溝橋	国道6号	1963	58	5.3	9.5	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅱ								○						
4121	上繁岡第２溝橋	国道6号	1963	58	5.3	11.7	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅱ								○						
4122	牛踏橋	国道6号	1963	58	6.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4123	三宮橋	国道6号	1964	57	6.3	9.3	PC		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4124	中野橋	国道6号	1964	57	6.6	9.3	PC		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4125	荒井橋	国道6号	1964	57	5.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4126	長田橋	国道6号	1964	57	6.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4127	西台橋	国道6号	1964	57	10.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4128	原田橋	国道6号	1964	57	6.3	9.8	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4129	行津橋	国道6号	1964	57	10.4	9.0	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4130	第１沼田橋	国道6号	1964	57	13.6	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4131	第２沼田橋	国道6号	1964	57	12.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4132	第３沼田橋	国道6号	1964	57	11.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4133	岡田橋	国道6号	1964	57	10.5	9.0	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4134	大井橋	国道6号	1964	57	11.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4135	宮前橋	国道6号	1964	57	8.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4136	堤谷橋	国道6号	1964	57	11.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4137	川田橋	国道6号	1964	57	11.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4138	米米沢橋	国道6号	1965	56	5.3	9.5	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅱ								○						
4139	日の出町溝橋	国道6号	1983	38	3.0	7.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4140	第一中川原橋	国道6号	1963	58	12.6	10.1	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4141	第二中川原橋	国道6号	1963	58	5.3	10.1	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4142	高平橋	国道6号	1963	58	5.0	10.1	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4143	広畑橋	国道6号	1963	58	4.5	9.3	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4144	根渡橋	国道6号	1963	58	6.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4145	原町泉橋	国道6号	1963	58	7.3	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4146	金沢橋	国道6号	1963	58	7.3	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅱ						○								
4147	堤下橋	国道6号	1963	58	2.8	9.3	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4148	金沢跨道橋	国道6号	1963	58	7.3	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4149	川子橋	国道6号	1963	58	13.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4150	江垂避溢橋	国道6号	1963	58	11.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4151	蟹田溝橋	国道6号	1984	37	3.4	13.8	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4152	第２榎橋	国道6号	1960	61	3.9	8.1	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4153	第１横手橋	国道6号	1960	61	3.6	8.5	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4154	第２横手橋	国道6号	1960	61	5.4	9.0	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅱ						○								
4155	鬼越橋	国道6号	1962	59	13.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅰ						○								
4156	町東橋	国道6号	1963	58	12.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4157	町場溝橋	国道6号	1983	38	2.7	11.2	RC		磐城	原町	福島県	相馬市	H30	Ⅱ								○						
4158	立谷橋	国道6号	1963	58	12.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅰ						○								
4159	富倉橋	国道6号	1962	59	9.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4160	長谷橋	国道6号	1962	59	3.8	9.3	RC		磐城	原町	福島県	新地町	H30	Ⅰ								○						
4161	中島橋	国道6号	1962	59	4.3	10.5	RC		磐城	原町	福島県	新地町	H30	Ⅱ								○						
4162	谷地橋	国道6号	1962	59	3.8	9.4	RC		磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅲ						○			□	□	□			ひびわれ補修
4163	下真引橋	国道6号	1962	59	11.4	14.6	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H26	Ⅱ	ひびわれ補修	R1	Ⅰ	○										
4164	福田橋	国道6号	1962	59	3.0	9.3	RC		磐城	原町	福島県	新地町	H30	Ⅱ								○						
4165	木崎橋	国道6号	1962	59	9.4	9.3	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅱ						○								
4166	小浜橋	国道6号	1963	58	12.5	9.3	PC		磐城	原町	福島県	大熊町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4167	勿来橋側歩道橋	国道6号	1965	56	11.2	1.0	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4168	末続橋側道橋	国道6号	1978	43	36.5	2.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○					□		部材交換
4169	内郷高架歩道橋	国道49号	1987	34	73.0	2.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅲ							○					□		支承取替
4170	好間橋歩道橋（上）	国道49号	1984	37	86.9	1.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4171	堀の内橋歩道橋（上）	国道49号	1989	32	17.1	1.4	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4172	宿中橋歩道橋（上）	国道49号	1991	30	11.1	1.0	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4173	宿中橋歩道橋（下）	国道49号	1991	30	11.1	1.0	RC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4174	折木側道橋	国道6号	1994	27	20.8	2.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4175	浅見川橋側道橋	国道6号	1974	47	68.7	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅱ							○							
4176	広野側道橋	国道6号	1990	31	20.7	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅱ							○							
4177	北迫側道橋	国道6号	1991	30	27.6	1.5	鋼橋		磐城	原町	福島県	広野町	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					支承補修
4178	木戸川側道橋	国道6号	1984	37	110.8	1.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4179	富岡側道橋	国道6号	1974	47	96.0	1.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	富岡町				R1	Ⅰ	○										
4180	前田川側道橋	国道6号	1981	40	52.0	1.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
4181	戎川側道橋	国道6号	1982	39	23.0	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	双葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4182	高瀬側道橋	国道6号	2001	20	131.3	2.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4183	請戸川橋側道橋	国道6号	1986	35	122.7	1.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4184	宮田川橋側道橋	国道6号	1975	46	20.7	1.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4185	太田川側道橋	国道6号	1985	36	67.0	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定											
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4186	牛川橋側道橋	国道6号	1984	37	23.5	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4187	北原側道橋（上）	国道6号	1982	39	29.0	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H29	Ⅰ							○							
4188	北原橋側道橋（下）	国道6号	1965	56	21.2	3.1	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H29	Ⅱ							○							
4189	新桜井橋側道橋	国道6号	1976	45	126.7	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H29	Ⅲ							○					□		当て板補強
4190	川子避溢橋側道橋（下）	国道6号	1969	52	17.0	1.4	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4191	真野川歩道橋	国道6号	1974	47	226.1	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H29	Ⅱ							○							
4192	萩崎側道橋	国道6号	1985	36	17.1	2.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	新地町	H29	Ⅱ							○							
4193	大木下側道橋	国道6号	1987	34	16.1	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4194	一ツ屋側道橋	国道6号	1980	41	7.4	1.4	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4195	清水側道橋	国道6号	1981	40	12.6	1.6	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4196	北田側道橋	国道6号	1969	52	17.5	1.4	RC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4197	上繁岡第一側道橋	国道6号	1989	32	7.5	1.4	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅰ								○						
4198	上繁岡第２側道橋	国道6号	1989	32	7.9	1.5	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H30	Ⅱ								○						
4199	西台第１側道橋	国道6号	1988	33	22.5	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4200	西台第２側道橋	国道6号	1988	33	12.8	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H30	Ⅰ								○						
4201	原田橋側道橋	国道6号	1969	52	15.4	2.7	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4202	行津橋側道橋	国道6号	1980	41	10.4	1.7	PC		磐城	原町	福島県	浪江町	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4203	沼田第１側道橋	国道6号	1988	33	21.0	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
4204	沼田第２側道橋	国道6号	1988	33	16.8	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4205	沼田第３側道橋	国道6号	1988	33	12.9	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4206	川田側道橋	国道6号	1985	36	14.6	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅰ		R2	Ⅱ		○									
4207	米米沢橋側道橋	国道6号	1982	39	5.3	1.5	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4208	第一中川原橋側道橋	国道6号	2000	21	12.6	1.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4209	第二中川原側道橋	国道6号	2000	21	5.3	1.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4210	高平橋側道橋	国道6号	1984	37	5.0	1.5	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4211	広畑橋側道橋	国道6号	1984	37	4.5	1.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4212	根渡橋側道橋	国道6号	1987	34	7.5	1.5	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4213	原町泉橋側道橋	国道6号	1990	31	10.5	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅱ								○						
4214	金沢側道橋	国道6号	1989	32	11.5	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4215	堤下橋側道橋	国道6号	1983	38	6.0	2.1	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4216	川子橋側道橋（下）	国道6号	1983	38	13.6	1.4	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅱ								○						
4217	江垂避溢橋側道橋	国道6号	1978	43	10.8	1.4	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ								○						
4218	鬼越橋側道橋	国道6号	1986	35	14.1	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅰ						○								
4219	町東側道橋	国道6号	1987	34	12.5	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	相馬市	H30	Ⅰ								○						
4220	立谷橋側道橋	国道6号	1987	34	15.5	1.6	鋼橋		磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅱ						○								
4221	富倉側道橋	国道6号	1985	36	15.1	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅱ						○								
4222	谷地橋側道橋	国道6号	1963	58	8.0	1.1	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅲ						○								架替
4223	大原避溢橋（下）	国道6号	2001	20	10.8	11.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4224	上荒川こ道橋（下）	国道6号	2003	18	19.9	9.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4225	東田こ道橋（下）	国道6号	2002	19	42.4	11.9	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4226	住吉高架橋（下）	国道6号	2002	19	155.0	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4227	上矢田Ａランプ橋	国道6号	2003	18	65.7	5.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4228	上矢田Ｄランプ橋	国道6号	2003	18	62.9	5.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4229	獺沢橋（下）	国道6号	2002	19	130.1	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4230	四倉第１橋	国道6号	1975	46	5.3	20.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ								○						

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4231	四倉第２橋	国道6号	1959	62	5.3	19.2	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ							○							
4232	四倉第３橋	国道6号	1959	62	7.3	13.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅲ							○				□			ひびわれ補修
4233	四倉第４橋	国道6号	1959	62	5.4	17.9	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅲ							○				□			ひびわれ補修
4234	末続ご道橋	国道6号	1962	59	10.5	8.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ							○							
4235	宇多川橋	国道6号	2004	17	322.2	12.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4236	大原避溢側道橋	国道6号	1974	47	13.4	2.9	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅱ							○							
4237	四倉第３橋側歩道橋（上）	国道6号	1959	62	10.0	2.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅲ							○				□			断面修復
4238	四倉第３橋側歩道橋（下）	国道6号	1959	62	16.0	1.1	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅲ						○					□			伸縮装置取替
4239	幾世橋側道橋（上）	国道6号	2003	18	23.0	2.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	浪江町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4240	岡田橋側道橋（下）	国道6号	2002	19	13.8	2.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4241	大木下橋側道橋（下）	国道6号	2004	17	13.2	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4242	梅川橋	国道6号	2006	15	25.5	28.3	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H26	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
4243	大曲ご道橋	国道6号	2005	16	32.3	10.0	PC		磐城	原町	福島県	相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4244	新地蔵川橋	国道6号	2004	17	143.2	12.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	新地町	H26	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4245	駒ヶ嶺大橋	国道6号	2007	14	490.9	11.0	混合橋		磐城	原町	福島県	新地町	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4246	小泉川橋	国道6号	2006	15	192.0	12.0	鋼橋		磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅱ						○								
4247	三沢大橋（下）	国道6号	2006	15	241.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4248	松久須根大橋（下）	国道6号	2005	16	297.9	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4249	戸ノ作橋（下）	国道6号	2006	15	100.0	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4250	蛭田川橋	国道6号	2003	18	61.0	8.7	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ							○							
4251	雷ご道橋（下）	国道6号	2003	18	24.3	9.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4252	川子橋側道橋（上）	国道6号	2005	16	13.6	2.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ							○							
4253	久能平側道橋	国道6号	2005	16	14.8	2.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4254	堤谷側道橋（下）	国道6号	2005	16	12.8	2.3	PC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4255	南富岡橋（下）	国道6号	2002	19	97.5	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ							○							
4256	御台境橋（下）	国道49号	2007	14	115.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4257	草木橋（下）	国道49号	2010	11	155.0	10.9	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4258	川子ご道橋側道橋	国道6号	2005	16	15.6	1.4	鋼橋		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ							○							
4259	第３榎橋	国道6号	1960	61	3.5	6.2	RC		磐城	原町	福島県	南相馬市	H30	Ⅰ							○							
4260	内郷高架橋（下）	国道49号	2012	9	569.4	10.5	混合橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4261	みまや徳姫ご道橋（下）	国道49号	2011	10	34.1	8.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4262	井出川橋側道橋（下）	国道6号	2010	11	72.5	1.8	鋼橋		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅰ		R1	Ⅰ	○										
4263	井出跨道橋側道橋（下）	国道6号	2010	11	24.0	1.6	PC		磐城	原町	福島県	楢葉町	H26	Ⅲ	断面修復	R1	Ⅰ	○										
4264	跨道橋	国道6号	1962	59	23.3	1.8	PC		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅱ							○		□					ひびわれ補修
4265	富岡跨道橋	国道6号	1964	57	40.5	2.5	鋼橋		磐城	原町	福島県	富岡町	H29	Ⅱ							○							
4266	石坂ボックス	国道49号	1988	33	3.0	29.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4267	稲荷原ボックス	国道49号	1988	33	3.0	29.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4268	南町田第二ボックス	国道49号	1988	33	4.8	32.8	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4269	向町田ボックス	国道49号	1988	33	4.1	31.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4270	北町田ボックス	国道49号	1988	33	3.0	27.5	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4271	勿来地下横断歩道	国道6号	1981	40	2.5	18.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4272	関田ボックス	国道6号	1957	64	2.5	19.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4273	四沢第一ボックス	国道6号	1972	49	2.0	16.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4274	四沢第三ボックス	国道6号	1972	49	2.5	29.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4275	綾ノ町第二ボックス	国道6号	1972	49	3.5	32.0	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期						
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4276	雷第一ボックス	国道6号	1972	49	3.5	37.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4277	雷第二ボックス	国道6号	1972	49	3.0	40.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4278	成沢ボックス	国道6号	1972	49	2.0	15.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4279	割余第一ボックス	国道6号	1977	44	2.5	27.8	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4280	割余第二ボックス	国道6号	1977	44	2.5	28.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4281	滝尻ボックス	国道6号	1977	44	3.5	22.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4282	薬師前ボックス	国道6号	1977	44	3.5	28.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4283	大原第一ボックス	国道6号	2003	18	3.5	29.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4284	大原第三ボックス	国道6号	2003	18	2.5	29.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4285	八合ボックス	国道6号	2003	18	4.5	36.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4286	飯塚ボックス	国道6号	2003	18	2.0	37.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
4287	菅波ボックス	国道6号	1999	22	3.0	26.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4288	荒田目ボックス	国道6号	1996	25	3.7	50.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4289	下川原ボックス	国道6号	1957	64	4.5	40.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4290	甲塚第一ボックス	国道6号	1996	25	6.0	31.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4291	甲塚第二ボックス	国道6号	1996	25	5.0	25.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4292	天神ボックス	国道6号	2003	18	2.4	29.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4293	民野第一ボックス	国道6号	1960	61	2.0	34.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4294	民野第二ボックス	国道6号	1960	61	2.0	18.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4295	大江下ボックス	国道6号	1960	61	2.0	56.0	－	○	磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4296	浅見川地下道	国道6号	1972	49	2.5	19.8	－	○	磐城	原町	福島県	広野町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4297	下北迫地下道	国道6号	1974	47	2.5	12.0	－	○	磐城	原町	福島県	広野町	H28	Ⅰ						○								
4298	楢葉地下道	国道6号	1973	48	2.5	13.0	－	○	磐城	原町	福島県	楢葉町	H28	Ⅰ						○								
4299	小浜地下道	国道6号	1973	48	2.5	12.8	－	○	磐城	原町	福島県	富岡町	H28	Ⅰ						○								
4300	夜ノ森ボックス	国道6号	1961	60	2.0	10.0	－	○	磐城	原町	福島県	富岡町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4301	滑津ボックス	国道6号	1962	59	3.5	8.6	－	○	磐城	原町	福島県	大熊町	H27	Ⅲ		R2	Ⅱ		○				□					断面修復
4302	三角屋地下道	国道6号	1990	31	3.0	27.0	－	○	磐城	原町	福島県	大熊町	H28	Ⅰ						○								
4303	大熊地下道	国道6号	1977	44	2.5	12.0	－	○	磐城	原町	福島県	大熊町	H28	Ⅰ						○								
4304	夫沢ボックス	国道6号	2012	9	2.5	10.0	－	○	磐城	原町	福島県	大熊町	H28	Ⅰ						○								
4305	新山第一地下道	国道6号	1976	45	2.5	12.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H28	Ⅰ						○								
4306	新山第二地下道	国道6号	2007	14	2.5	16.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H28	Ⅰ		R1	Ⅱ	○										
4307	長塚地下道	国道6号	2004	17	2.0	14.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H28	Ⅰ						○								
4308	寺内前地下道	国道6号	1973	48	2.5	17.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4309	寺内前ボックス	国道6号	1969	52	2.5	10.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H27	Ⅲ		R2	Ⅲ		○				□					ひびわれ補修
4310	南芦川ボックス	国道6号	2004	17	5.1	12.0	－	○	磐城	原町	福島県	双葉町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4311	桜木第二ボックス	国道6号	1999	22	3.0	16.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4312	高瀬ボックス	国道6号	2001	20	5.4	17.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4313	桜木第一ボックス	国道6号	1999	22	2.0	20.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4314	牛渡川原ボックス	国道6号	1999	22	3.0	18.4	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4315	田中前ボックス	国道6号	2003	18	2.0	16.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H28	Ⅰ						○								
4316	浪江地下道	国道6号	1984	37	3.0	15.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4317	下平ボックス	国道6号	2003	18	4.5	14.0	－	○	磐城	原町	福島県	浪江町	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4318	宮下第一ボックス	国道6号	2000	21	2.0	22.0	－	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4319	宮下第二ボックス	国道6号	2000	21	2.0	15.0	－	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4320	宮下第三ボックス	国道6号	2000	21	2.0	14.0	－	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												主な措置内容
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4321	耳谷第一ボックス	国道6号	2000	21	2.0	12.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4322	耳谷第二ボックス	国道6号	2000	21	2.0	16.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4323	平藤ボックス	国道6号	2000	21	5.0	11.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4324	山神前ボックス	国道6号	2000	21	3.0	11.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4325	有山第一ボックス	国道6号	2000	21	2.5	12.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4326	有山第二ボックス	国道6号	2000	21	2.0	35.5	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4327	深町ボックス	国道6号	2001	20	4.0	20.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅰ	○										
4328	反町ボックス	国道6号	2001	20	4.0	26.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4329	上川原田第一ボックス	国道6号	2001	20	2.0	15.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4330	上川原田第二ボックス	国道6号	2001	20	4.0	13.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4331	花輪下ボックス	国道6号	2007	14	4.1	5.9	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4332	小谷津ボックス	国道6号	2007	14	2.0	12.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4333	下沼ボックス	国道6号	2007	14	2.0	14.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4334	大甕地下道	国道6号	1965	56	2.0	12.7	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4335	雫地下道	国道6号	1969	52	2.0	15.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4336	東原ボックス	国道6号	2007	14	2.0	15.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4337	日の出ボックス	国道6号	2007	14	2.4	20.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4338	高見地下道	国道6号	1979	42	2.5	18.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅱ		R2	Ⅱ		○									
4339	小島田第一ボックス	国道6号	2004	17	3.0	16.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4340	小島田第二ボックス	国道6号	2001	20	2.0	12.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4341	千倉地下横断歩道	国道6号	2008	13	4.0	16.0	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H28	Ⅰ						○								
4342	横手ボックス	国道6号	2004	17	2.0	16.4	–	○	磐城	原町	福島県	南相馬市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4343	豊田ボックス	国道6号	2006	15	4.7	20.8	–	○	磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4344	松ヶ江地下道	国道6号	2001	20	3.8	32.0	–	○	磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅰ						○								
4345	新沼第一ボックス	国道6号	2001	20	5.0	19.0	–	○	磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅰ						○								
4346	新沼第二ボックス	国道6号	2001	20	5.0	14.7	–	○	磐城	原町	福島県	相馬市	H28	Ⅱ						○								
4347	今神第一ボックス	国道6号	2006	15	3.0	18.0	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅰ						○								
4348	今神第二ボックス	国道6号	2006	15	4.1	17.2	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H27	Ⅱ		R2	Ⅰ		○									
4349	山中第一ボックス	国道6号	2006	15	5.0	14.4	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4350	山中第二ボックス	国道6号	2006	15	7.8	16.5	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅰ						○								
4351	新地横断地下道	国道6号	2004	17	3.0	22.1	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅰ						○								
4352	新地地下道	国道6号	1973	48	2.5	18.4	–	○	磐城	原町	福島県	新地町	H28	Ⅰ						○								
4353	宮ノ下高架橋（下）	国道6号	2015	6	310.0	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4354	六枚内高架橋（下）	国道6号	2015	6	324.9	8.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4355	新泉橋（下）	国道6号	2011	10	63.9	10.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅰ		R2	Ⅰ		○									
4356	下川跨道橋（下）	国道6号	2015	6	11.4	11.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H27	Ⅱ		R1	Ⅱ	○										
4357	鮫川大橋（上）	国道6号	2015	6	471.0	10.3	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4358	佐糠橋（上）	国道6号	2015	6	55.9	8.2	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4359	植田跨道橋（上）	国道6号	2015	6	19.0	9.2	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4360	佐糠跨道橋（上）	国道6号	2015	6	23.0	9.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅱ						○								
4361	錦成沢橋（上）	国道6号	2015	6	27.7	15.2	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4362	錦成沢橋（下）	国道6号	2015	6	27.7	12.1	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H28	Ⅰ						○								
4363	中央台橋	国道6号	1963	58	19.4	9.3	鋼橋		磐城	原町	福島県	大熊町	H26	Ⅱ		R1	Ⅲ	○									□	断面修復
4364	江之網橋	国道6号	2009	12	61.5	11.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4365	田之網ご線橋	国道6号	2012	9	148.0	11.0	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							

■東北地方整備局「橋梁点検・修繕計画」［令和２年度版］

（令和３年3月末時点）

番号	施設名	路線名	架設年度（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	溝橋	管理者		所在地		平成30年度までの実績			令和元年度以降の予定												
									事務所	出張所	県	市町村	点検結果（一巡目）		主な措置内容	点検結果（二巡目）		点検の時期					修繕の時期					主な措置内容
													年度	健全性 H26-30		年度	健全性 R1-5	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
4366	古内橋	国道6号	2013	8	173.0	11.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4367	林作跨道橋（下）	国道49号	2009	12	31.2	15.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4368	上荒川橋（下）	国道49号	2016	5	119.0	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4369	五郎内橋（下）	国道49号	2016	5	118.5	10.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4370	中ノ作橋（下）	国道6号	2003	18	16.4	12.5	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4371	本沢橋	国道6号	1962	59	6.6	31.7	RC		磐城	原町	福島県	広野町	H29	Ⅲ							○					□		ひびわれ補修
4372	馬場カルバート	国道6号	1995	26	5.9	43.9	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅰ							○							
4373	佐糠ボックス	国道6号	1972	49	5.5	24.5	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H29	Ⅱ							○							
4374	不動橋（下）	国道6号	2018	3	46.9	9.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4375	木崎橋側道橋	国道6号	2016	5	13.3	2.8	PC		磐城	原町	福島県	新地町	H30	Ⅰ								○						
4376	中山こ道橋（下）	国道6号	2018	3	23.4	9.8	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4377	菅波大橋（下）	国道6号	2018	3	110.0	11.5	鋼橋		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4378	夏井甲塚こ道橋（下）	国道6号	2017	4	23.6	9.8	PC		磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4379	荒田目カルバート	国道6号	1994	27	5.8	51.9	–	○	磐城	平	福島県	いわき市	H30	Ⅰ								○						
4380	雷こ道橋（上）	国道6号	2019	2	24.2	10.0	PC		磐城	平	福島県	いわき市				R2	Ⅰ		○									
