
さきちゃんだより

砂防希望

No.124 令和7年12月立谷沢川砂防出張所

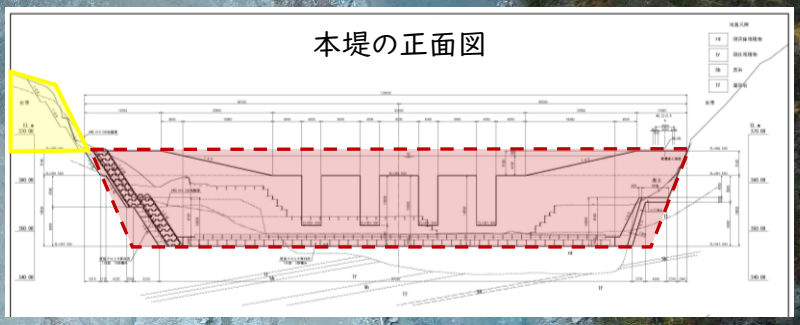

潜岩第2砂防堰堤改築予定地（本堤）

法面工完了

削った斜面が崩れないようにモルタル（白い部分）を吹き付けました。この下に堰堤本体が施工されます。

着工前





令和6年の豪雨で破損した右岸へ渡る橋を補修して再設置

潜岩第2砂防堰堤工事

立谷沢川流域の工事状況をご報告します

潜岩第２砂防堰堤工事

受注者 ：（株）柿崎工務所
工　期 ：令和７年３月３日～令和７年12月19日

着工前



施工完了



工事用道路の整備

潜岩第2砂防堰堤に向かう道路について令和6年豪雨の際に川岸が削られ崩れていました。被災の拡大と再度削られるのを防ぐためにブロックを並べました。

玉川第３砂防堰堤補修ほか工事

受注者 ：（株）オオバ
工　期 ：令和７年４月14日～令和８年３月31日

着工前



施工完了



工事用道路の整備

玉川第3砂防堰堤補修を行うため、作業重機等を堰堤まで安全に向かえるように工事用道路を整備しました。

肝煎地区渓流保全工事

受注者 ：（株）安藤建設
工　期 ：令和７年８月12日～令和８年１月30日

着工前



施工中



流路工土砂撤去

河道内に堆積した土砂の撤去、樹木の伐採を行っています。これにより、川の流れがスムーズになり、土砂・洪水氾濫を抑えます。



流路工は、川底・川岸をコンクリートなどで固める床固工・護岸工があります。流路工がないと大雨の際、流れる勢いが増した川は川底・川岸が削られます。削られた土砂が溜まることにより川底も浅くなり、土砂・洪水氾濫を起こしやすくなります。

立谷沢地区振興会事業
砂防事業現地見学会

10月17日（金）例年は座学で砂防事業に関する勉強会を行っておりましたが、今年は普段立ち入ることのできない現場へ立谷沢地区自治会長のみなさんをご案内し、間近で見学してもらいました。

濁沢の崩壊地を見学。脆く崩れやすい月山の地質が立谷沢川に大量の土砂を排出しています。





見学会のあとは北月山荘にて土砂災害安全祈願、地域住民の幸福と五穀豊穣を祈願し、龍神観音供養祭が執り行われました。

立谷沢川砂防出張所管内
安全パトロール

10月27日（木）新庄河川事務所、立谷沢川砂防出張所、管内工事・業務受注者、庄内労働基準監督署が合同で実施しました。各現場において安全管理状況の確認し、事故の発生を未然に防ぐために点検を行います。



良い点、改善すべき点など意見を出し合い全体で共有し、より安全な現場環境を整えます。

工事現場のほか、現場事務所でも危険な箇所はないか、安全のための工夫はされているか点検を行います。



さきちゃんさんぽ ～特別編～

今回はこれまで本紙に掲載しきれなかったさきちゃんさんぽの写真を集めてみました

狩川駅待合室から桜を眺めたり…



龍神の石碑巡りをしたり…（写真は北月山荘）



風車村のラベンダー畑を訪れてみたり…

すこ～し時期が遅かったのでリベンジします



フィッシュギャラリーで魚に遭遇できたり…



2025年最後のさきちゃんさんぽ





さきちゃんと紅葉と
本沢第１砂防堰堤（昭和32年完成）

今年も立谷沢川砂防出張所広報紙『さきちゃんだより』をご覧いただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。

国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所
立谷沢川砂防出張所《砂防資料館併設》

〒999-6601東田川郡庄内町狩川字堅田20-23
電話：0234-56-2050　FAX：0234-56-2081
ホームページ　https://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou





《砂防資料館》
●開館日／平日のみ
●開館時間／9～16時半
●入館料無料

SABOカード
配布中！
立谷沢川さぼう
