一般国道13号　福島西道路（Ⅱ期）

別添

○国道13号　福島西道路（Ⅱ期）（延長6.3km）は現在、道路改良工事、橋梁工事、トンネル工事など、沿線家屋に配慮しながら全面的に工事を進めているところです。

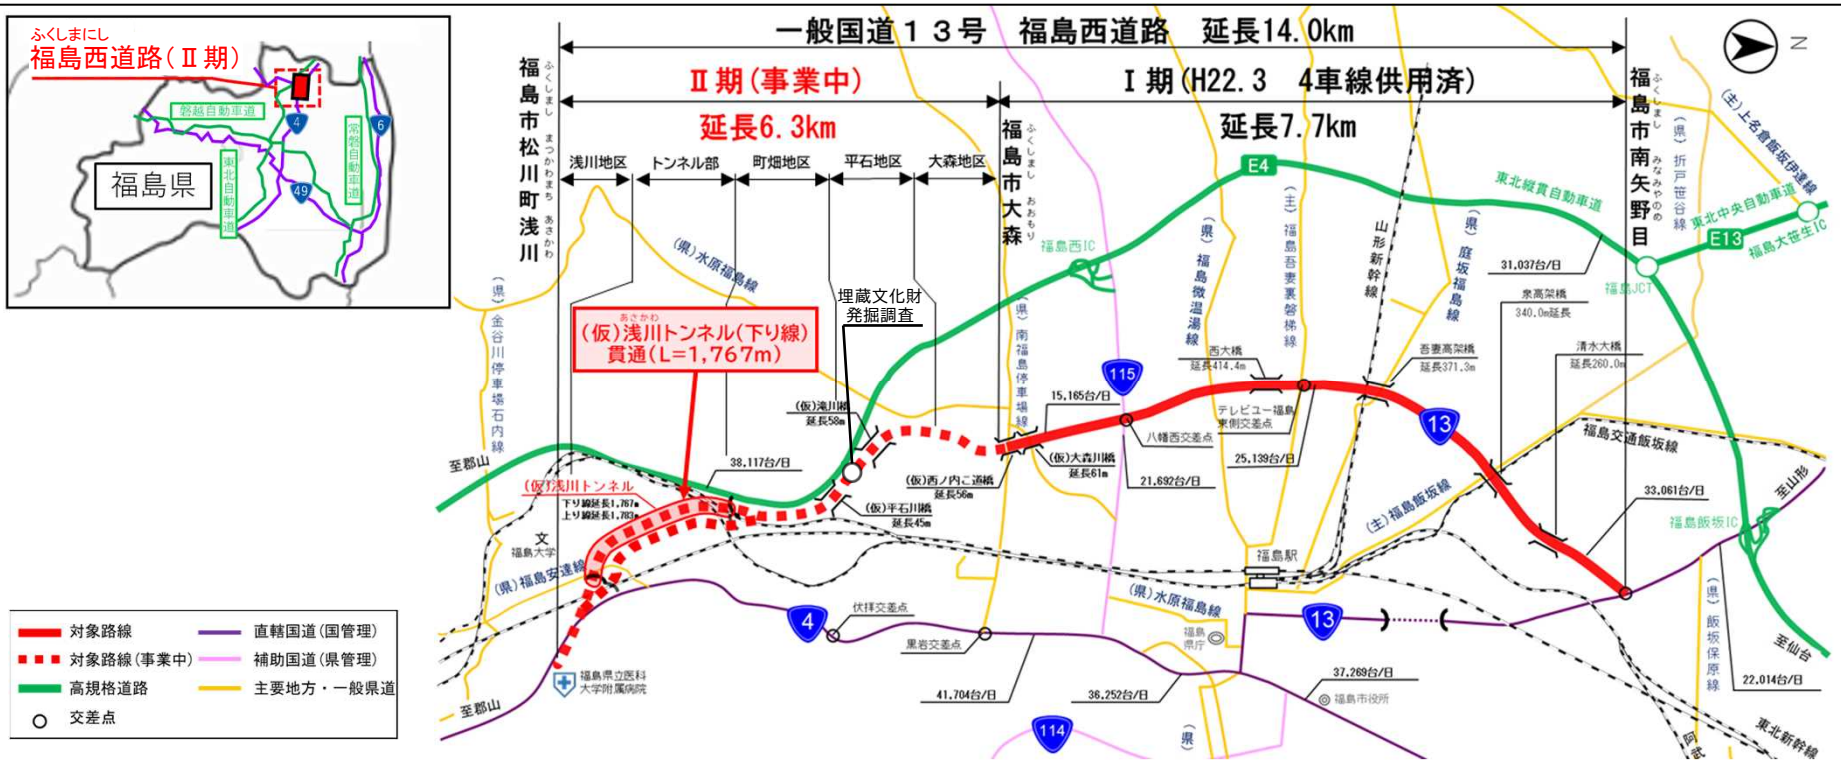

▼浅川地区の完成イメージ図

▼平石地区の完成イメージ図

▼大森地区の完成イメージ図

（仮称）浅川（あさかわ）トンネル（下り線）トンネル施工状況

別添

○事業区間の浅川トンネルでは、下り線側の完成に向け、トンネル内の覆工コンクリートや防水工、インバート工を施工しております。
○今後は排水工や坑門工等も含め、引き続き、早期完成に向けてトンネル工事を進めてまいります。

（仮）浅川トンネル側面図

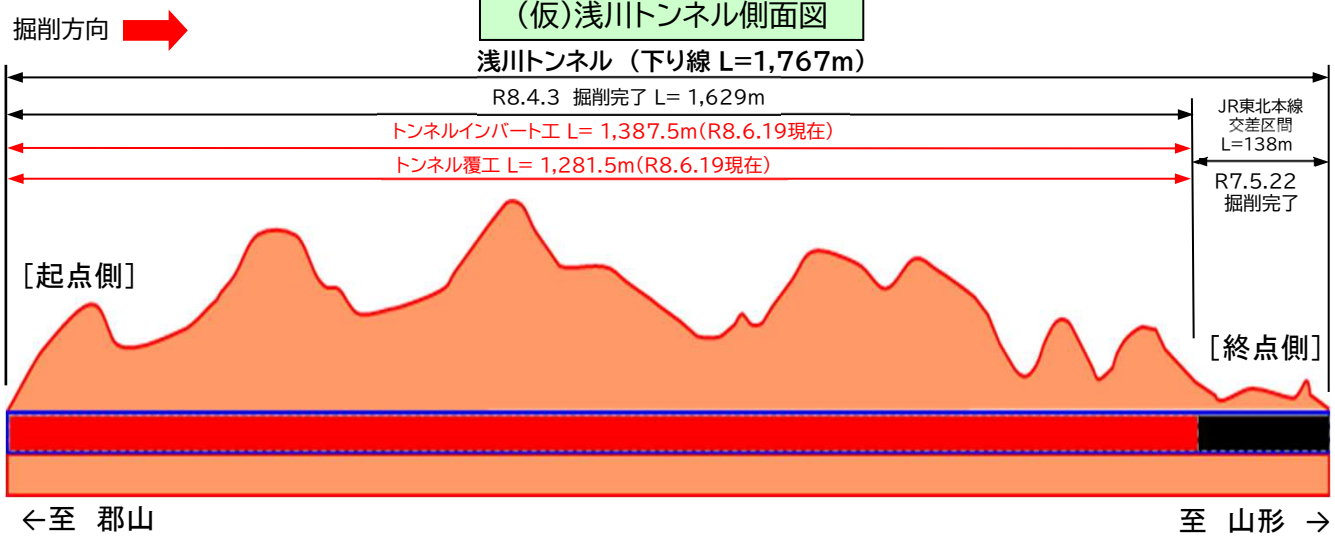

（仮）浅川トンネル標準横断図

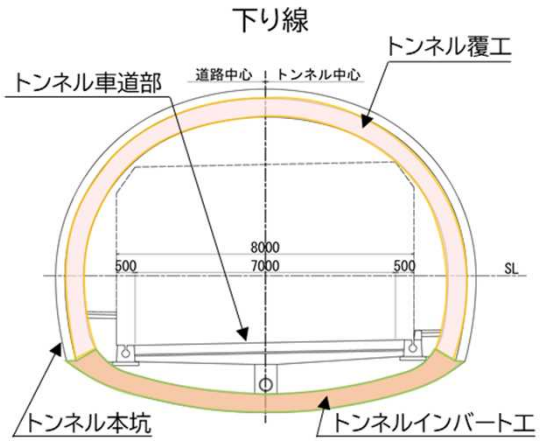

覆工　1,281.5m（進捗率 77.4%）

インバート工　1,387.5m（進捗率 93.1%）

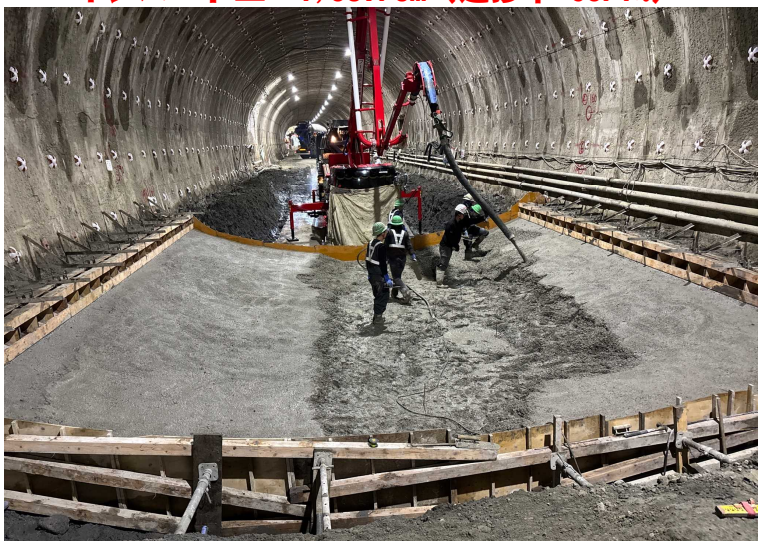

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（浅川地区）

別添

○事業区間の浅川地区では、現国道4号との接続に向け、現在は将来の4号下り線側の歩道部を施工しております。
○引き続き、国道4号の切り回しに向け、道路改良や舗装工を予定しております。

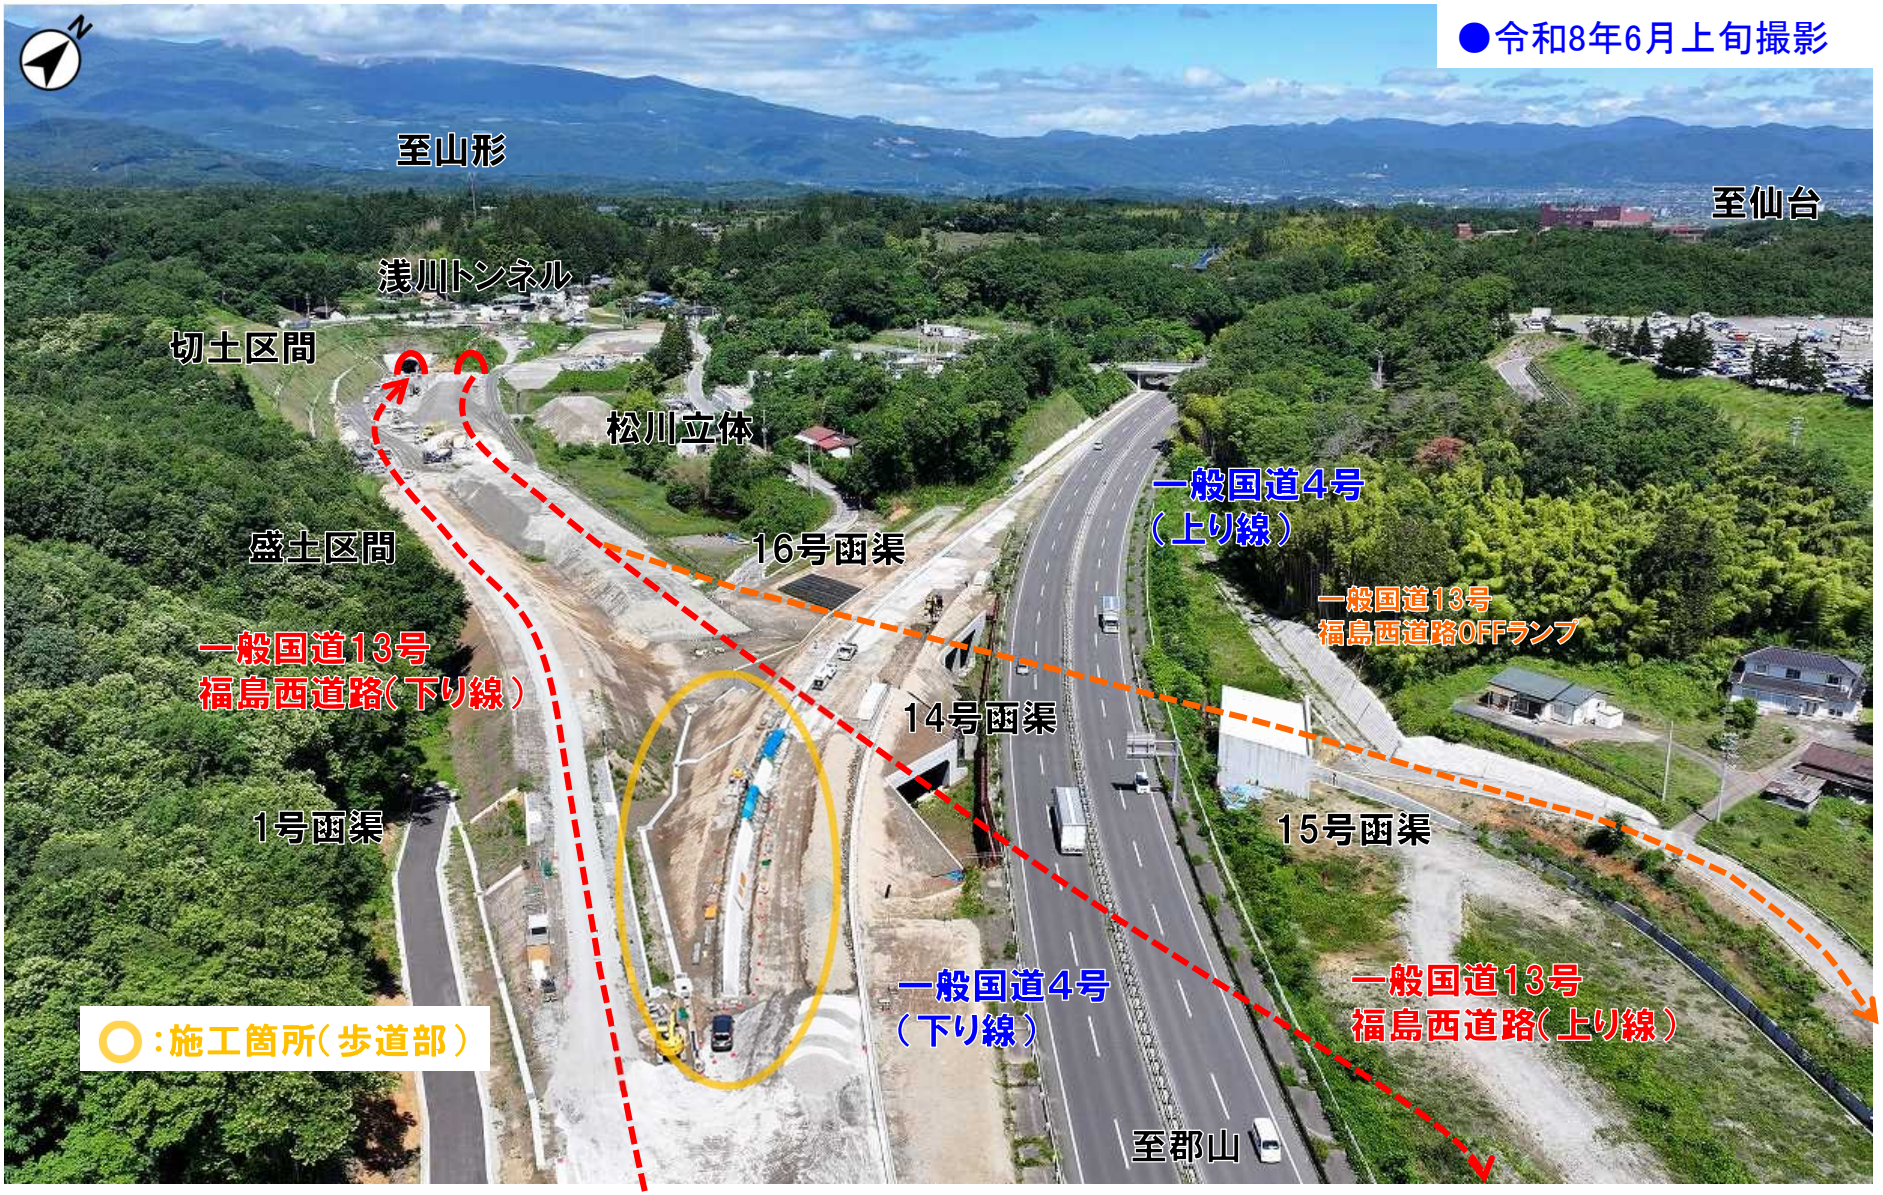

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（町畑地区）

別添

○事業区間の町畑地区では、平田川の護岸工（左岸側）や橋台背面の道路改良工事が完了しました。
○引き続き、国道13号下り線側における橋梁上部工工事の進捗を図ります。

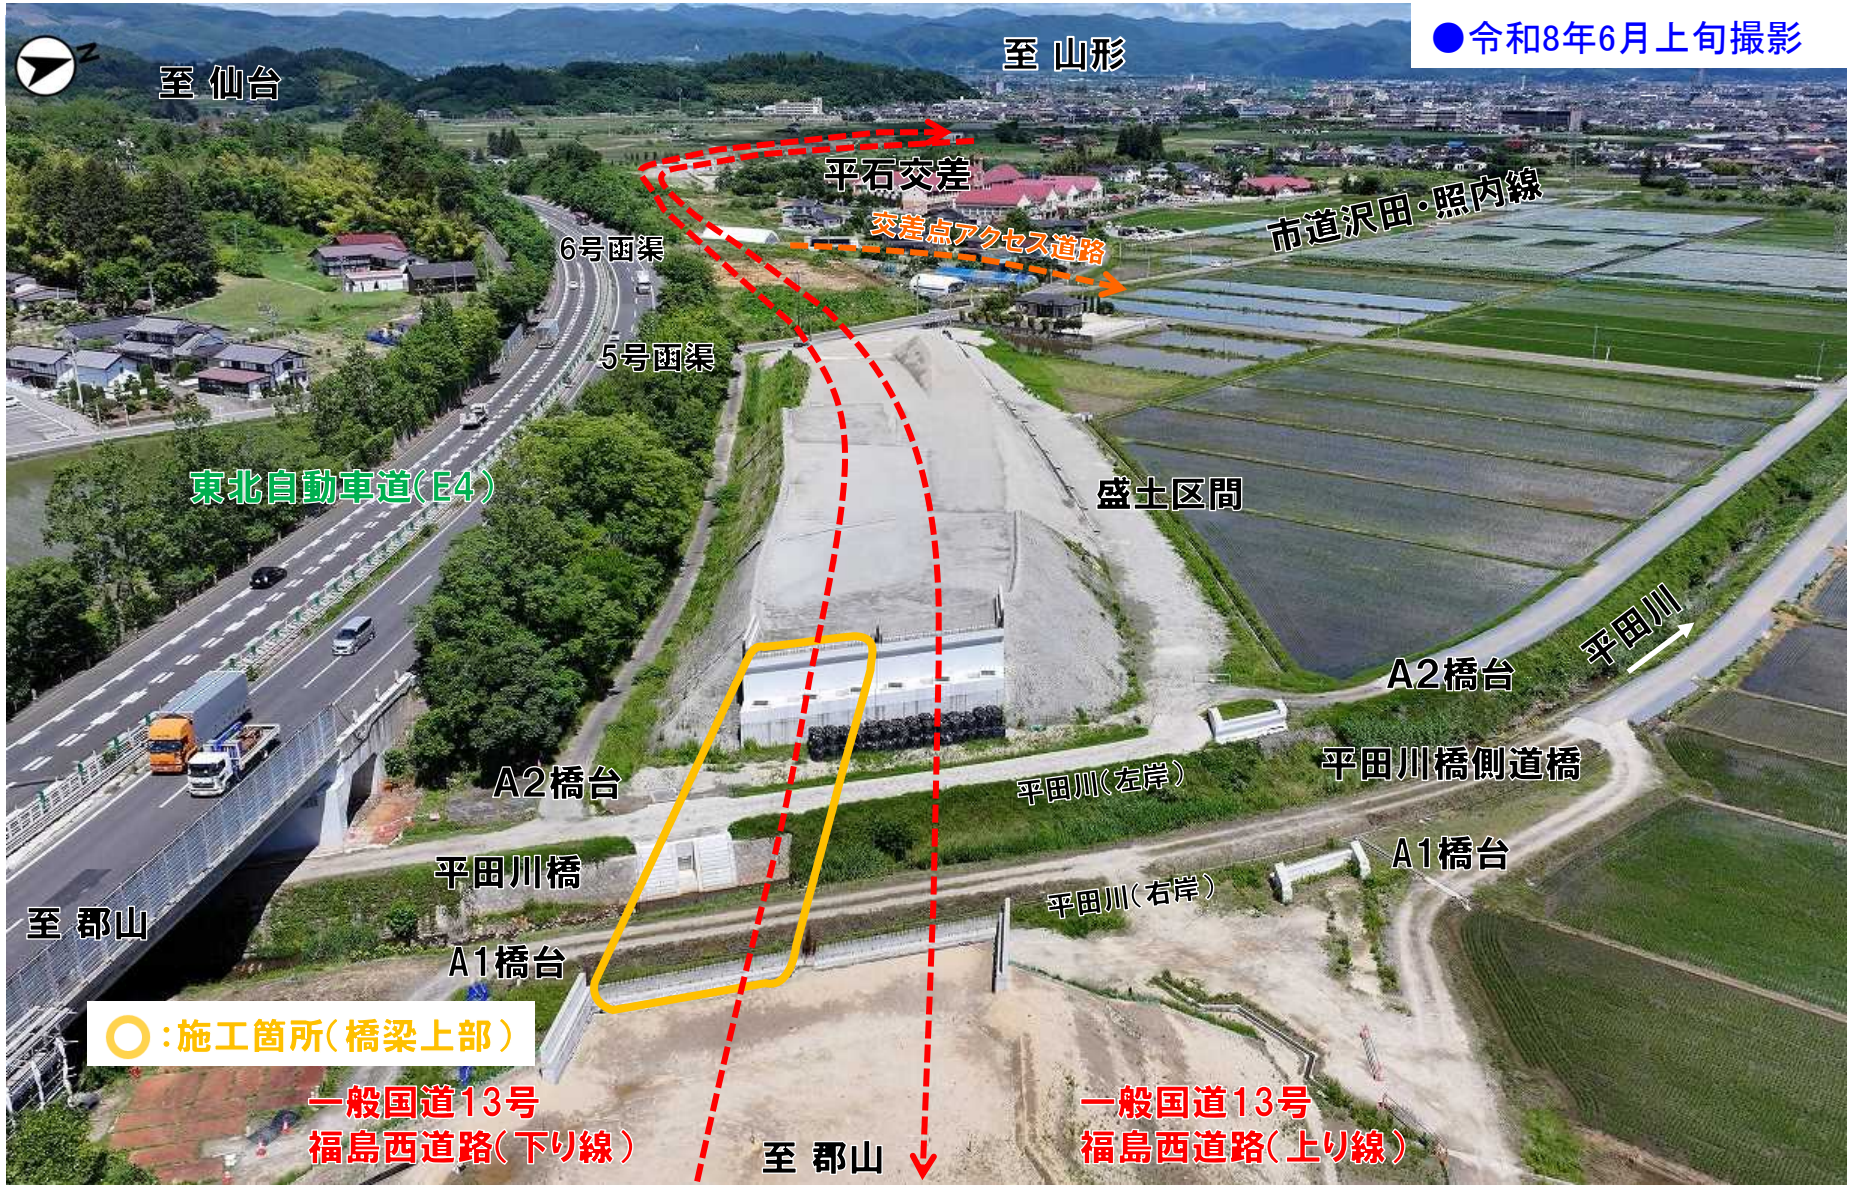

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（平石地区）

別添

○事業区間の平石地区では、5月より埋蔵文化財の発掘調査を実施中であり、濁川の護岸工（左岸）は完了しました。
○引き続き、埋蔵文化財の発掘調査及び国道13号下り線側における橋梁上下部工工事の進捗を図ります。

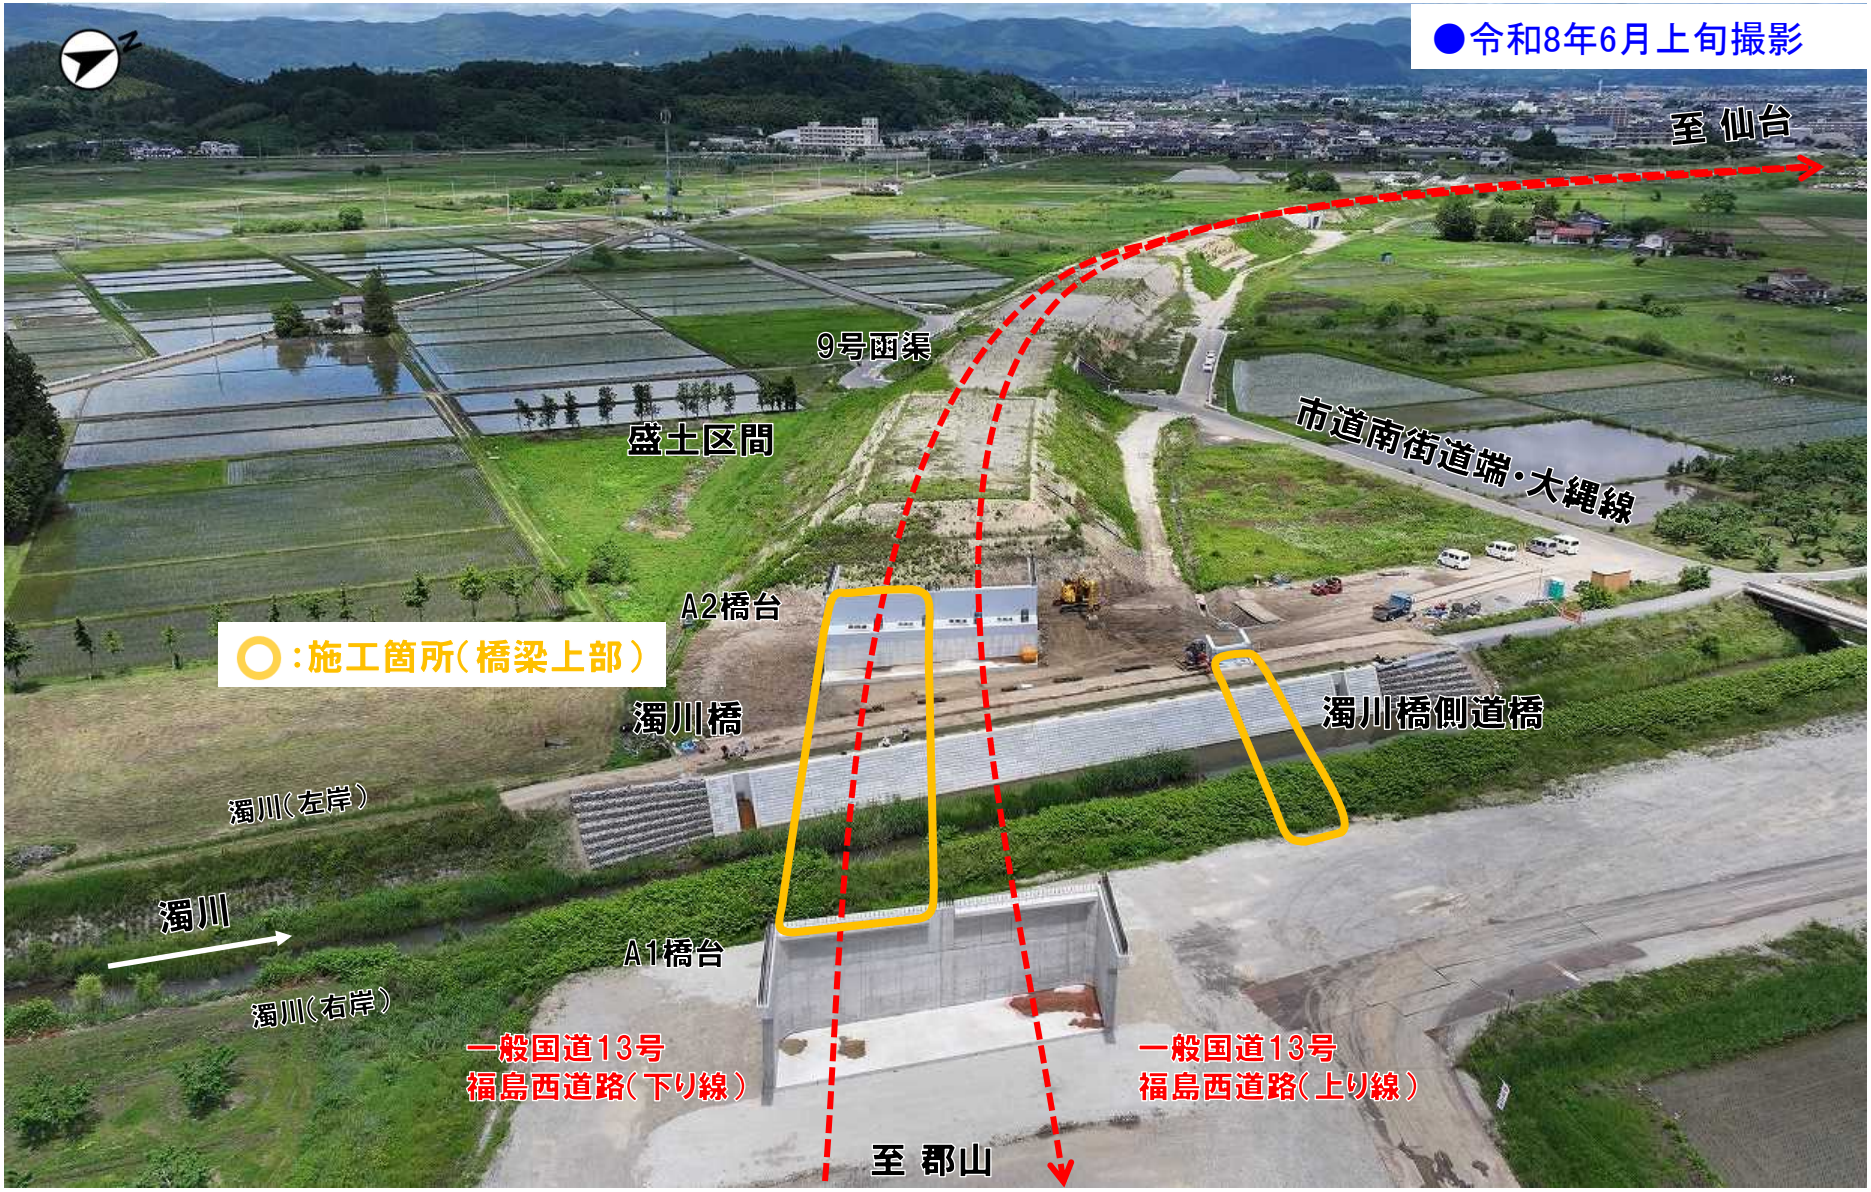

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区）

別添

○事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っております。
○引き続き、沿線家屋に配慮しながら地盤改良工、擁壁工、13号函渠工工事の進捗を図ります。

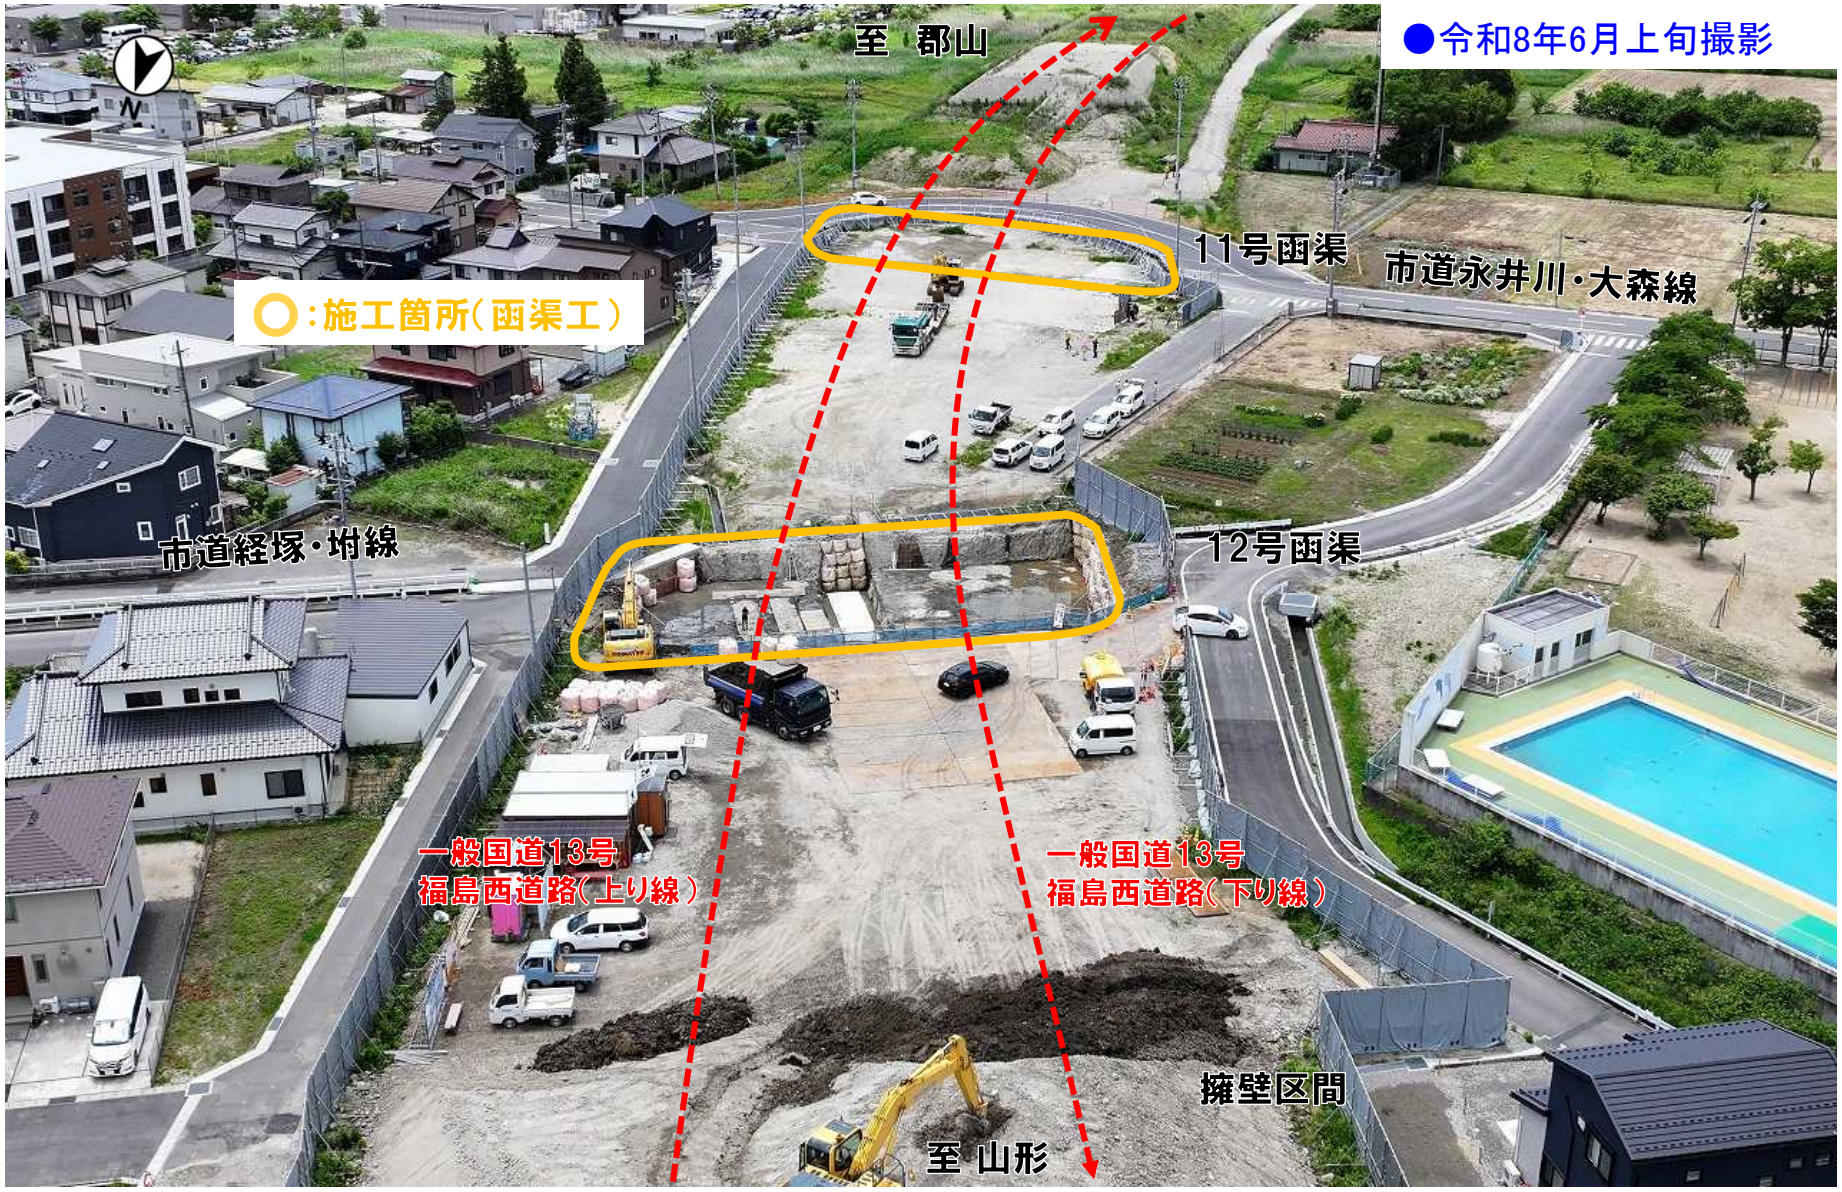

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区）

別添

○事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向けた改良工事を行っております。
○引き続き、沿線家屋に配慮しながら地盤改良工、擁壁工、13号函渠工工事の進捗を図ります。

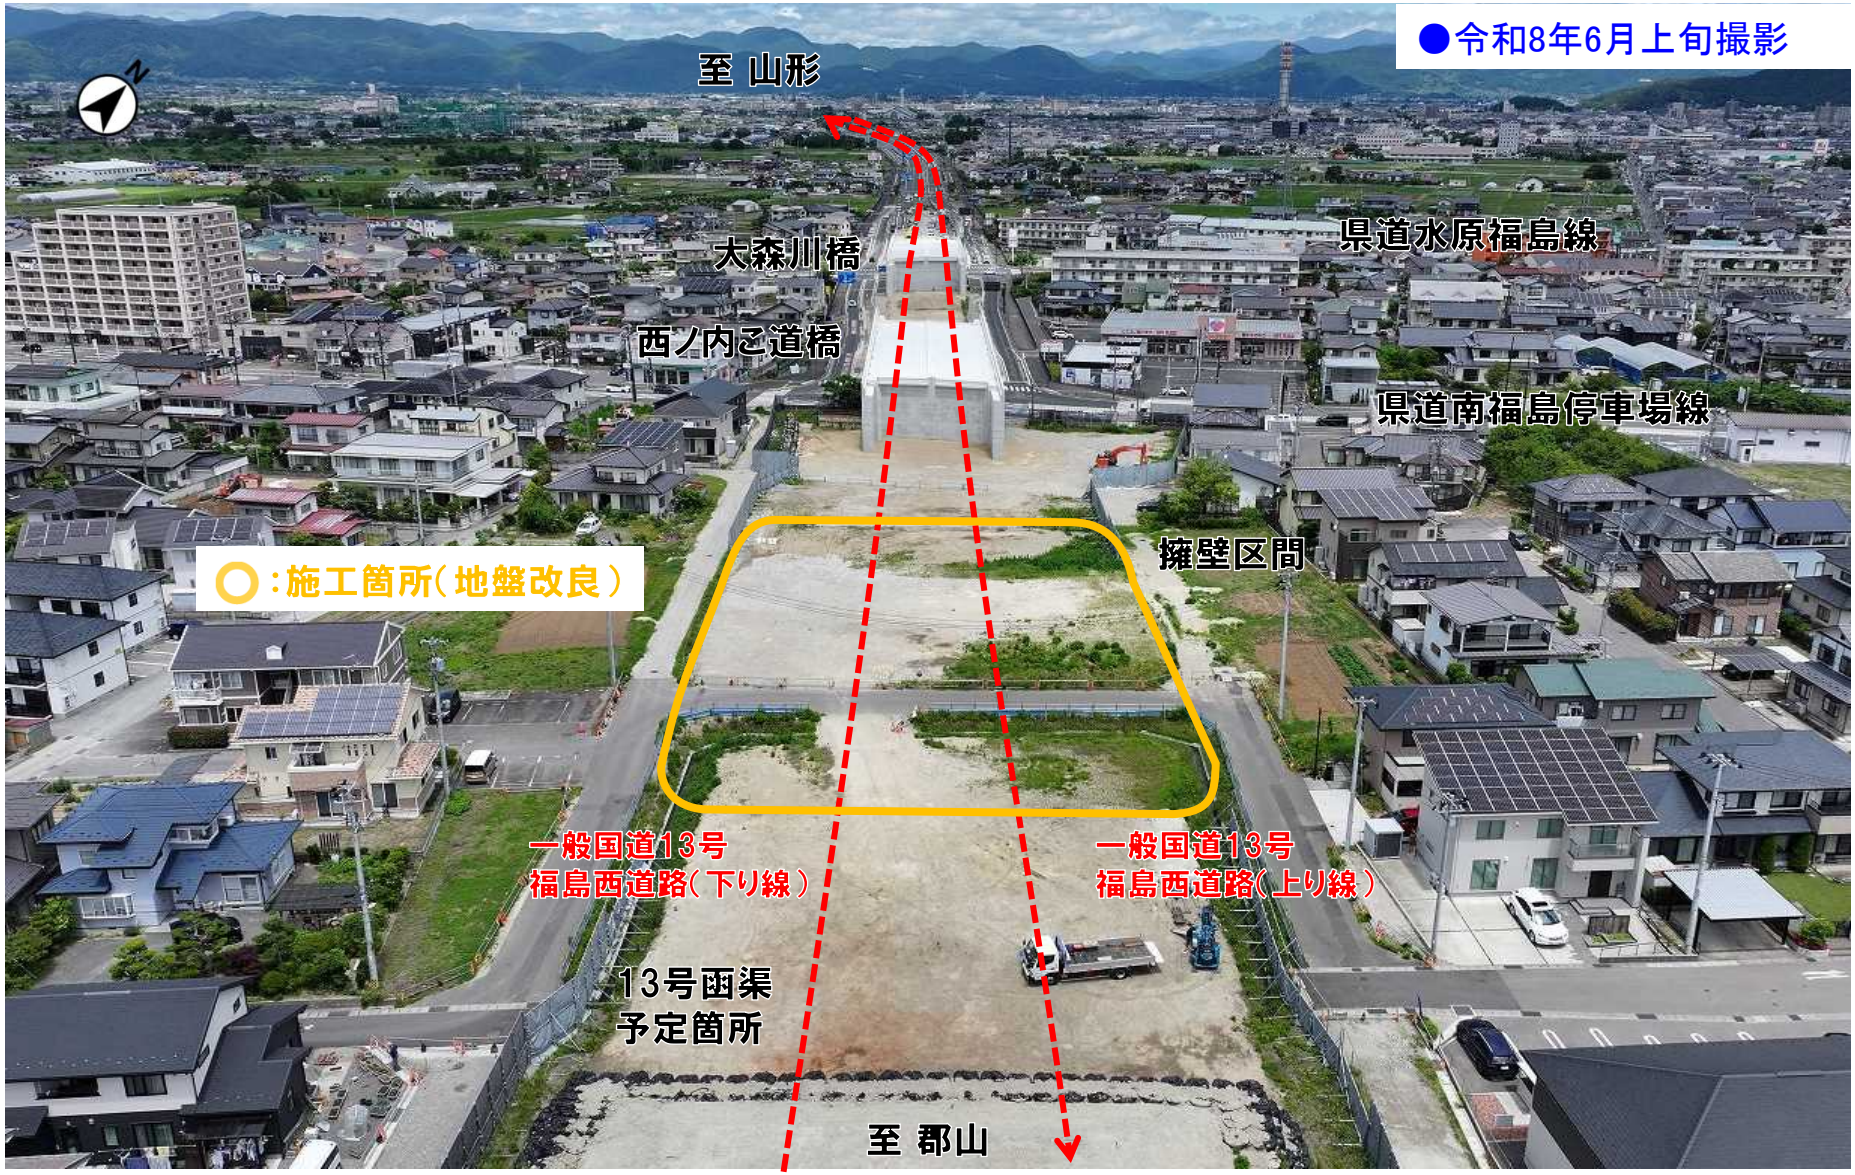

国道13号　福島西道路（Ⅱ期）の施工状況（大森地区）

別添
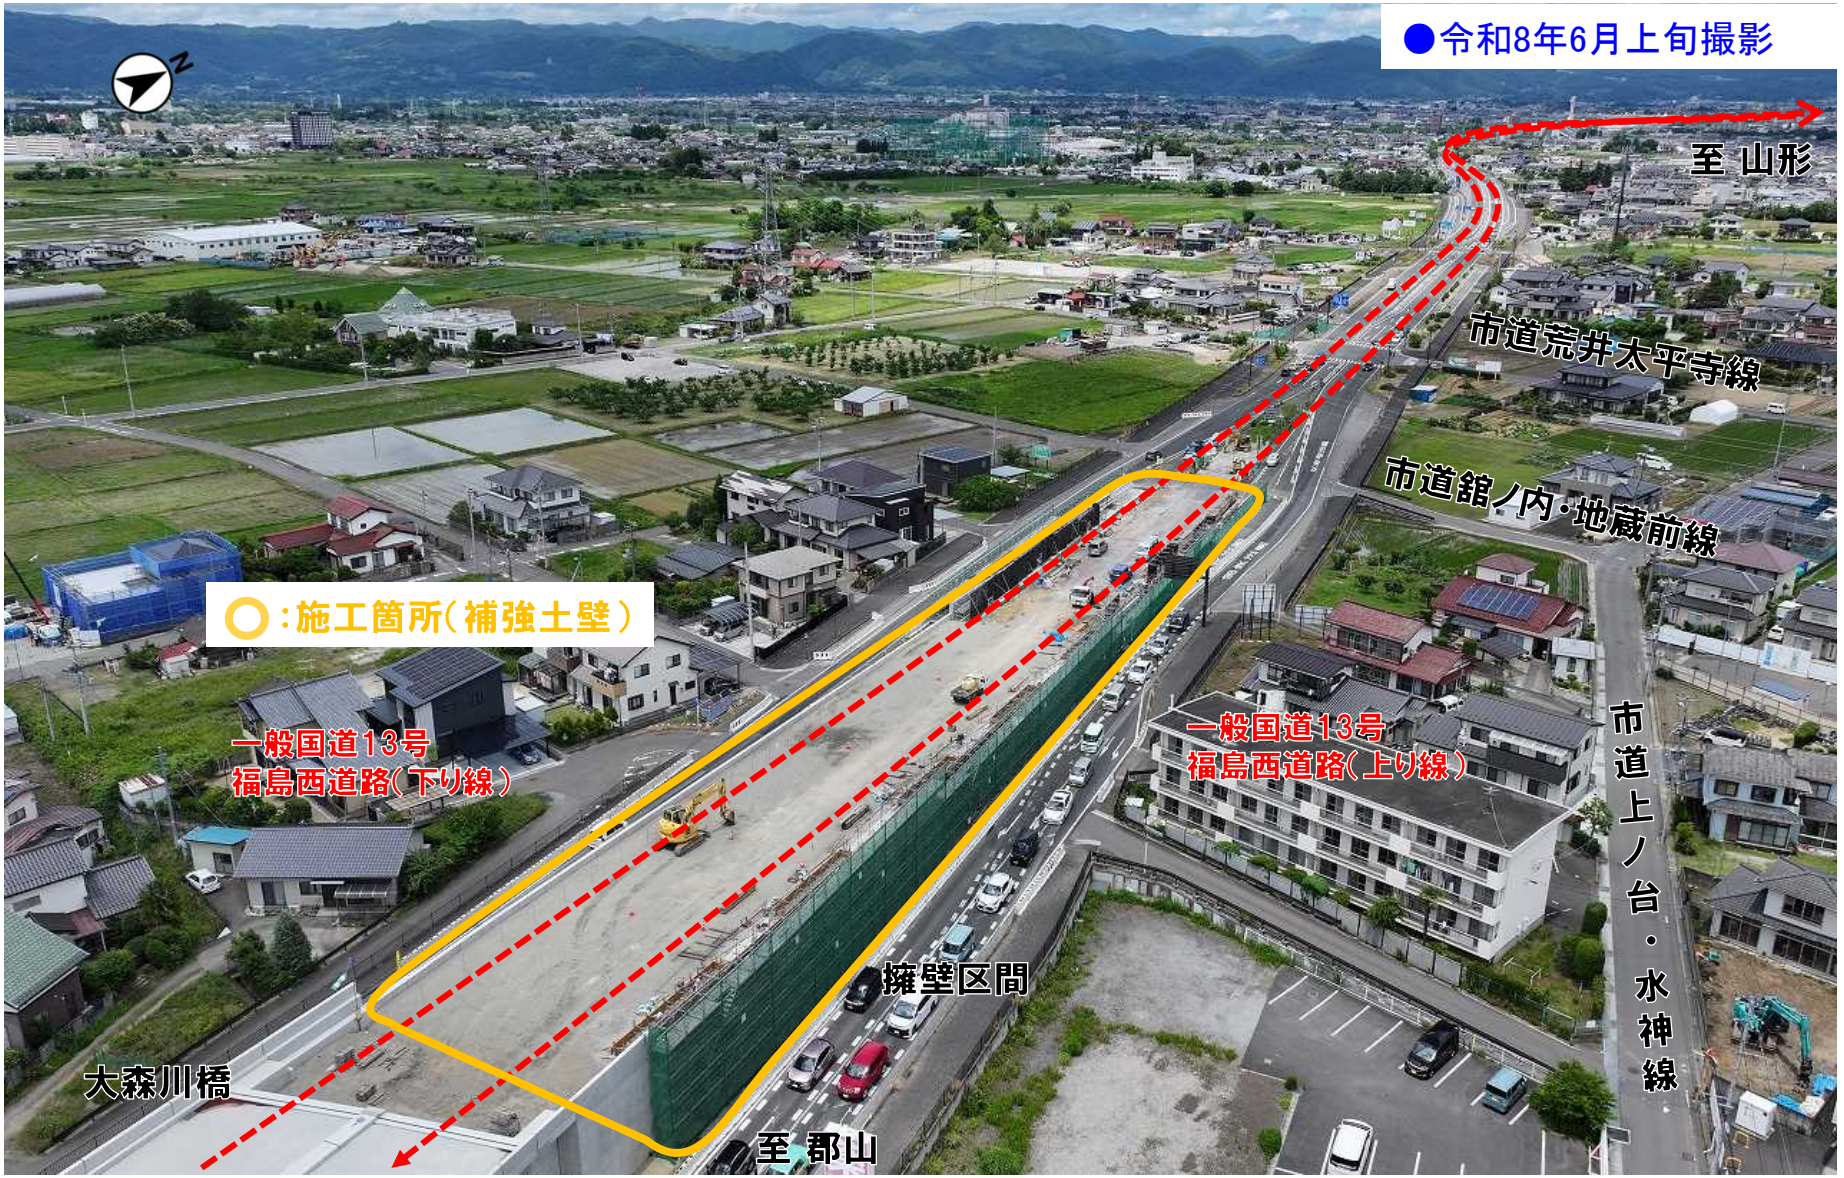
○事業区間の大森地区では、福島西道路（Ⅰ期）との接続に向け、道路改良工事（補強土壁）を行っております。
○引き続き、沿線家屋に配慮しながら擁壁工工事の進捗を図ります。
